

ĐỀ XUẤT XIN TÀI TRỢ

Bản 1.1

Quỹ Khí hậu xanh (GCF) đang tìm những đề xuất xin tài trợ có chất lượng cao.

Các tổ chức được công nhận đều có thể hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền quốc gia có liên quan xây dựng đề xuất xin tài trợ, lưu ý xem xét kỹ các yêu cầu Khung Đầu tư và Khung Quản lý Kết quả của GCF. Những Đề xuất xin tài trợ nên nêu bật cách thức các chương trình và dự án sẽ thực hiện các tiêu chí đầu tư và làm thế nào để đạt được một phần hay tất cả những kết quả có ảnh hưởng chiến lược.

Tên chương trình/dự án: Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng ven biển để bị tổn thương bởi những tác động liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Nước/vùng: Việt Nam

Tổ chức được công nhận: Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP)

Ngày nộp: 31/7/2016

Ngày nộp lại: 21/9/2015, 28/12/2015

MỤC LỤC

PHẦN A	TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN
PHẦN B	CÁC THÔNG TIN VỀ CHI PHÍ/TÀI CHÍNH
PHẦN C	MÔ TẢ CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN
PHẦN D	SỰ CẦN THIẾT CÓ SỰ THAM GIA CỦA GCF
PHẦN E	DỰ KIẾN PHẦN THỰC HIỆN THEO CÁC TIÊU CHÍ ĐẦU TƯ
PHẦN F	TÓM TẮT Ý KIẾN THẨM ĐỊNH
PHẦN G	ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO
PHẦN H	THEO DÕI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ
PHẦN I	PHỤ LỤC

Lưu ý các tổ chức được công nhận về cách sử dụng mẫu đề xuất xin tài trợ:

Phần **A, B, D, E** và **H** của đề xuất xin tài trợ yêu cầu phải có thông tin chi tiết từ tổ chức được công nhận. Đối với tất cả các phần khác, kể cả phần F về Tóm tắt thẩm định các tổ chức được công nhận có quyền tự quyết cách trình bày thông tin. Các tổ chức được công nhận có thể hoặc đưa thông tin trực tiếp vào đề xuất này, hoặc cung cấp thông tin tóm tắt trong đề xuất qua tham chiếu chéo với các tài liệu dự án khác như tài liệu thẩm định dự án. Tổng số trang của đề xuất dự án (không kể phụ lục) dự kiến không quá 50.

Đề nghị nộp bản mẫu đã điền đầy đủ dưới đây cho:

fundingproposal@gcfund.org

Vui lòng sử dụng các quy ước tên sau đây cho tên tập tin:
"[Đề xuất dự án]-[Tên viết tắt của cơ quan]-[Ngày]-[Số thứ tự]"

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN
ĐỀ XUẤT XIN TÀI TRỢ QUỸ KHÍ HẬU XANH | PAGE 1 / 67

A.1. Thông tin tóm tắt về chương trình/dự án		
A.1.1. Tên chương trình/dự án		Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương bởi những tác động liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam
A.1.2. Chương trình hay dự án		Dự án
A.1.3. Nước / vùng		Việt Nam
A.1.4. Cơ quan quốc gia có thẩm quyền		Phạm Hoàng Mai Cơ quan quốc gia có thẩm quyền (NDA) về GCF của Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT)
A.1.5. Tổ chức được công nhận		Chương trình phát triển của LHQ (UNDP)
A.1.5.a. Phương thức tiếp cận		☐ Trực tiếp ☒ Quốc tế
A.1.6. Cơ quan điều hành / hưởng lợi		Cơ quan điều hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Các tổ chức hưởng lợi khác: Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh tham gia dự án Số người hưởng lợi: 20.000 người có nhà chống chịu khí hậu, 100.000 người hưởng lợi từ tái sinh rừng ngập mặn, 30.000.000 dân vùng ven biển hưởng lợi từ việc cải thiện qui hoạch/kế hoạch lồng ghép các thông tin rủi ro khí hậu
A.1.7. Hạng theo qui mô dự án (Tổng đầu tư, triệu USD)		☐ Siêu nhỏ (≤ 10) ☐ Vừa ($50 < x \leq 250$) ☒ Nhỏ ($10 < x \leq 50$) ☐ Lớn (> 250)
A.1.8. Tập trung vào giảm thiểu / thích ứng		☐ Giảm thiểu ☐ Thích ứng ☒ Đa lĩnh vực
A.1.9. Ngày nộp Ngày nộp lại		31/07/2015 21/9/2015, 28/12/2015
A.1.10. Thông tin đầu mối liên hệ dự án	Đầu mối liên hệ, chức vụ	Keti Chachibaia, Cố vấn kỹ thuật khu vực (regional technical advisor)
	Tổ chức	UNDP
	Địa chỉ email	keti.chachibaia@undp.org
	Số điện thoại	+66 (0) 2 304 9100 ext 5091
	Địa chỉ bưu điện	United Nations Development Programme 4th Floor United Nations Service Building Rajdamnern Nok Avenue Bangkok 10200, Thailand

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN ĐỀ XUẤT XIN TÀI TRỢ QUỸ KHÍ HẬU XANH | PAGE 1 / 67

A.1.11. Lĩnh vực kết quả (đánh dấu tất cả những mục phù hợp)

Giảm phát thải từ:

- ☐ Sản xuất điện và tiếp cận đến năng lượng
(VD. Điện mặt trời, phong điện, địa nhiệt ... trên lưới, lưới siêu nhỏ hay ngoài lưới điện.)
- ☐ Giao thông có mức phát thải thấp
(VD. hệ thống xe buýt nhanh, tàu hỏa cao tốc,)
- ☐ Các toà nhà, thành phố và các ngành công nghiệp cũng như các loại thiết bị
(VD. Các toà nhà tiết kiệm năng lượng mới hay tái trang bị, các thiết bị tiết kiệm năng lượng cho công ty và quản lý chuỗi cung ứng, v.v....)
- ☒ Lâm nghiệp và sử dụng đất
(VD. Quản lý và bảo tồn rừng, nông lâm kết hợp, tưới tiêu trong nông nghiệp, quản lý và xử lý nước, v.v....)

Tăng khả năng chống chịu của:

- ☒ Cộng đồng và dân dễ bị tổn thương nhất
(VD. Giảm thiểu rủi ro hoạt động có liên quan đến BĐKH – đa dạng hoá nguồn cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng, di dời các cơ sở sản xuất và kho bãi, v.v.)
- ☐ Y tế, sức khoẻ và an ninh nước và lương thực
(VD. Cây trồng chống chịu được khí hậu, hệ thống tưới tiêu hiệu quả, v.v....)
- ☒ Môi trường xây dựng và cơ sở hạ tầng
(VD. Kè biển, hệ thống đường có khả năng chống chịu, v.v....)
- ☒ Hệ sinh thái và dịch vụ hệ sinh thái
(VD. Quản lý và bảo tồn hệ sinh thái, du lịch sinh thái, v.v....)

A.2. Tóm tắt chương trình/dự án (tối đa 300 từ)

1. Các cộng đồng nghèo sống ở các vùng ven biển của Việt Nam thường xuyên chịu ảnh hưởng tiêu cực do lụt bão gây ra. Hàng năm có khoảng 60.000 căn nhà bị phá huỷ hay hư hại do lụt bão tại các tỉnh ven biển. Tình trạng này ngày càng nặng nề hơn theo các kịch bản biến đổi khí hậu của Việt Nam. Hậu quả về kinh tế vì thế làm cho các gia đình dễ bị tổn thương càng trở nên khó thoát khỏi vòng đói nghèo hơn.

2. Dự án đề xuất xin tài trợ của GCF mong muốn mở rộng qui mô những hoạt động đã được thử nghiệm nhằm tăng sức chống chịu của các cộng đồng dễ bị tổn thương ở vùng ven biển. Xây dựng trên các chương trình bảo trợ xã hội đang thực hiện liên quan đến cung cấp chỗ ở cho người nghèo và người chịu nhiều thiệt thòi, dự án sẽ lồng ghép các tính năng thiết kế chống chịu bão lụt tại các nhà mới xây cho 20.000 người nghèo và chịu ảnh hưởng nhiều do thiên tai. Là một phần trong nỗ lực ứng phó tổng hợp quản lý nguy cơ ngập lụt, 4.000 ha rừng ngập mặn sẽ được phục hồi và/hay trồng mới không chỉ để thực hiện chức năng vùng đệm triều cường sóng biển dâng, mà còn cung cấp tài nguyên hệ sinh thái hỗ trợ sinh kế ven biển. Ngoài ra, để hỗ trợ và duy trì cả tác động của dự án này cũng như những điều chỉnh chính sách tiên quyết trong tương lai của Chính phủ là tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng ven biển và các cộng đồng khác, nguồn lực sẽ được sử dụng để hệ thống hoá việc đánh giá rủi ro kinh tế và khí hậu đối với khu vực tư nhân và cộng đồng trong cả 28 tỉnh duyên hải của Việt Nam.

3. Dự án dựa vào tài trợ không hoàn lại vì (a) những đề xuất hoạt động sẽ đem lại lợi ích cho các gia đình đã được Chính phủ xếp hạng nghèo; (b) tăng cường khả năng ứng phó tự nhiên đem lại giá trị công cho cộng đồng; và (c) không tạo ra nguồn thu để cho vay và hoàn trả lại dòng tiền cho GCF. Dự án hoàn toàn phù hợp với các chiến lược của Chính

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN
ĐỀ XUẤT XIN TÀI TRỢ QUỸ KHÍ HẬU XANH | PAGE 1 / 67

phủ Việt nam (CPVN) và được thiết kế theo kết quả thu được của rất nhiều cuộc tham vấn các bên liên quan. Cơ quan có thẩm quyền quốc gia đã có thư không phản đối dự án.

A.3. MỐC QUAN TRỌNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN

Dự kiến ngày thông qua của Hội đồng thuộc tổ chức được công nhận (nếu áp dụng)	Chưa có
Dự kiến ngày hết hạn tài chính (nếu áp dụng)	Chưa có
Dự kiến ngày bắt đầu và kết thúc thực hiện dự án	Bắt đầu: 01/4/2016 Kết thúc: 31/03/2021
Thời gian thực hiện dự án/chương trình	5 năm

B.1. Mô tả các hạng mục xin tài trợ của chương trình/dự án

4. Đề xuất GCF hoàn toàn dựa vào tài trợ không hoàn lại vì (a) (a) những đề xuất hoạt động sẽ đem lại lợi ích cho các gia đình đã được Chính phủ xếp hạng nghèo; (b) tăng cường phòng thủ tự nhiên cung cấp giá trị công; và (c) không tạo ra nguồn thu để cho vay và hoàn trả lại dòng tiền cho GCF.

Hợp phần	Tiểu hợp phần (nếu có)	Số tiền (cho toàn bộ dự án)	Đồng tiền giải ngân	Thành tiền (cho toàn bộ dự án)	Tiền bản địa	Tiền tài trợ của GCF Triệu \$
Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương bởi tác động liên quan đến BĐKH ở Việt Nam	Kết quả 1: Những tính năng thiết kế chống chịu được bảo lụt được đưa vào 4.000 nhà mới xây tại các địa điểm an toàn, với 20.000 người nghèo và chịu ảnh hưởng nhiều từ thiên tai trong 100 xã được hưởng lợi	20,152	<u>Triệu USD (\$)</u>	454,387	Triệu VNĐ	12,152
	Kết quả 2: Khôi phục 4.000 ha rừng ngập mặn làm các vùng đệm chắn triều cường và sóng biển dâng	12.937	<u>Triệu USD (\$)</u>	291,073	Triệu VNĐ	11,530
	Kết quả 3: Tăng cường khả năng của các khu vực tư nhân và cộng đồng tiếp cận tới những dữ liệu có chất lượng về mất mát, thiệt hại, khí hậu tại 28 tỉnh duyên hải của Việt Nam	7.441	<u>Triệu USD (\$)</u>	167,780	Triệu VNĐ	5.841
Tổng tài trợ của dự án		40.530	<u>Triệu USD (\$)</u>	913,870	Triệu VNĐ	29.523

* Mở rộng bảng nếu cần.

B.2. Thông tin tài trợ cho dự án

	Công cụ tài chính	Số tiền	Đồng tiền	Kỳ hạn	Định giá
(a) Tổng tiền tài trợ cho dự án	(a) = (b) + (c)	40.530	<u>Triệu USD (\$)</u>		
(b) Tổng số tiền yêu cầu từ GCF	(i) Khoản vay chính (senior loan)		<u>Tuỳ chọn</u>		() %
	(ii) Khoản vay thứ cấp (subordinated loan)		<u>Tuỳ chọn</u>	() năm	() %
	(iii) Vốn (equity)		<u>Tuỳ chọn</u>	() năm	() % IRR
	(iv) Đảm bảo		<u>Tuỳ chọn</u>		
	(v) Tài trợ hoàn lại *không có	29.523	<u>Triệu USD (\$)</u>		
	(vi) Tài trợ *				
* Đề nghị cung cấp diễn giải về mặt kinh tế và tài chính tại mục F.1 đối với những ưu đãi (concessionality) mà GCF dự tính phải cung cấp, đặc biệt trong các trường hợp nhận tài trợ không hoàn lại. Đề nghị làm rõ sự khác nhau về kỳ hạn và giá giữa tài trợ của GCF và của các tổ chức được công nhận. Lưu ý là mức độ ưu đãi phải phù hợp với mức độ thực hiện dự kiến của dự án/chương trình so với các tiêu chí đầu tư ghi trong phần E.					

	Tổng tiền yêu cầu (i+ii+iii+iv+v+vi)		29,523 ¹	Triệu USD (\$)			
(c) Đồng tài trợ của bên tiếp nhận	Công cụ tài chính	Số tiền	Đồng tiền	Tên cơ quan	Kỳ hạn	Định giá	Ưu đãi
	<u>Tài trợ không hoàn lại</u>						
	<u>Tài trợ không hoàn lại</u>	8.000 ²	Triệu USD (\$)	Bộ Xây dựng	() năm	() %	<u>Tuỳ chọn</u>
	<u>Tài trợ không hoàn lại</u>	0,517 ³	Triệu USD (\$)	Bộ NN&PTNT	() năm	() %	<u>Tuỳ chọn</u>
	<u>Tài trợ không hoàn lại</u>	1.600	Triệu USD (\$)	UNDP	() năm	() % IRR (tỉ lệ hoàn vốn nội bộ)	<u>Tuỳ chọn</u>
	Định chế tài chính chủ trì: Không áp dụng.						
	* Đề nghị nộp thư khẳng định hay thư cam kết của định chế đồng tài trợ trong phần I						
(d) Điều khoản tài chính giữa GCF và AE (nếu có)	Trong trường hợp tổ chức được công nhận (AE) triển khai các nguồn tài chính của GCF trực tiếp đến người nhận, (tức là tài GCF chuyển trực tiếp từ GCF tới người nhận thông qua các AE) hoặc nếu AE chính là người nhận, trong các công cụ tài chính được đề xuất và điều khoản như đã mô tả trong phần (b), tiểu mục này có thể được bỏ qua. Nếu có thu xếp tài chính giữa GCF và AE, mà đòi hỏi một công cụ tài chính và / hoặc các điều khoản tài chính riêng biệt khác những mô tả trong phần (b), xin vui lòng điền vào bảng dưới đây để xác định công cụ đề xuất và các điều khoản giữa GCF và AE.						
	Công cụ tài chính	Số tiền	Đồng tiền	Kỳ hạn	Định giá		
	<u>Tài trợ không hoàn lại</u>	29.523	Triệu đô la Mỹ (\$)	() năm	() %		
	Vui lòng giải thích sự khác biệt trong các công cụ tài chính và / hoặc các điều khoản giữa những gì. AE cung cấp cho người nhận và những gì GCF yêu cầu AE.						
B.3. Tổng quan thị trường tài chính (nếu có)							
5. Chính phủ Việt Nam đang yêu cầu 100% nguồn tài trợ không hoàn lại cho dự án đề xuất, do đó không cần tiến hành tổng quan về thị trường tài chính .							

¹ Theo hướng dẫn của Ban thư ký GCF, mặc dù không có trong đề xuất này, chi phí thêm 10% giá trị dự án sẽ được bổ sung để trang trải phần giám sát và đảm bảo chất lượng thực hiện bởi UNDP, tổ chức được GCF công nhận, trong tất cả các giai đoạn của chu trình dự án. Bao gồm: (i) giám sát xây dựng đề xuất; (ii) thẩm định (trước và cuối cùng) và giám sát khởi động dự án; (iii) quản lý và giám sát thực hiện dự án; và (iv) giám sát kết thúc dự án. UNDP đang chờ xác nhận từ Ban GCF về vấn đề này và hy vọng rằng các khoản phí của tổ chức được công nhận vượt trội và ngoài các chi phí dự án, sẽ được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị GCF trước khi bắt đầu thực hiện các hoạt động.

² Số liệu là ngân sách tạm tính khoảng US\$2000/nhà sẽ được Bộ Xây dựng hỗ trợ theo đề án của Bộ cho khoảng 4000 hộ dân được nhận hỗ trợ thêm trong đề xuất này. Thư xác nhận đồng tài trợ dự án của Bộ (Phụ lục IV) thể hiện tổng thể ngân sách mà chính phủ sẽ hỗ trợ cho chương trình nhà chống lũ bảo tại Việt Nam

³ Số liệu này là ước tính chi phí vận hành và bảo dưỡng (O&M) trong 10 năm cho 4000ha rừng ngập mặn được tái tạo với hỗ trợ của dự án. Thư đồng tài trợ để hỗ trợ của Bộ NN&PTNT sẽ được cung cấp khi hoàn thành thủ tục



C.1. Bối cảnh chiến lược

6. Nền kinh tế của Việt Nam đã phát triển đáng kể trong những năm gần đây. Những cải cách kinh tế và chính trị đã biến Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo khó nhất trên thế giới trở thành nước có thu nhập trung bình trong vòng một phần tư thế kỷ. Với 88,5 triệu người và 54 dân tộc khác nhau, đất nước đã chứng kiến tăng trưởng bình quân đầu người từ mức dưới 100 USD vào thập kỷ 1990 đến mức dự tính 1.596 USD vào năm 2012. Điều này đi cùng với giảm mạnh tỉ lệ đói nghèo từ 58% xuống còn 14% trong giai đoạn 1993-2008 và ước tính 11,8% vào năm 2011.

7. Trong khi Việt Nam trở thành câu chuyện thành công đáng kinh ngạc về phát triển kinh tế trong một phần tư thế kỷ qua thì các cộng đồng ven biển lại tụt hậu trong khả năng chống chịu. Những cộng đồng này có tỉ lệ đói nghèo cao gấp hai lần tỉ lệ của cả nước và càng ngày càng dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu vì sức ép phát triển lên các khu đệm tự nhiên như rừng ngập mặn.

8. Theo chỉ số tổn thương do BĐKH⁴, Việt Nam là một trong 30 “nước rủi ro nghiêm trọng” trên thế giới. Những người dân nghèo có mức độ rủi ro đặc biệt cao do sinh kế của họ phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản. Đồng bằng sông Hồng và sông Mê Công đã chịu xâm nhập mặn, đe dọa sản lượng nông nghiệp và hàng triệu người dựa vào các lưu vực sông này để có thu nhập. Dân thành thị sống tại các khu định cư không chính thức cũng chịu rủi ro; đặc biệt họ đang chịu nắng, ẩm cực đoan cũng như bão lụt.

9. Báo cáo đánh giá thứ năm (AR5) của Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) chỉ ra rằng nhiệt độ trong khu vực tiểu vùng đã tăng với tốc độ 0,14°C đến 0,20°C mỗi thập kỷ kể từ những năm 1960, và dự đoán tăng từ 0,8°C đến 3,2°C vào cuối thế kỷ này. Báo cáo nhấn mạnh hơn nữa xu hướng tích cực trong sự xuất hiện của biến cố mưa to (trên 10% lượng mưa) và nhỏ (dưới 5%), và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với một vài hiện tượng quy mô lớn ảnh hưởng đến khu vực. Mưa cực điểm tăng trong tương lai liên quan đến gió mùa rất có khả năng xảy ra trong khu vực Đông Nam Á, và sự gia tăng được dự đoán liên quan đến các cơn bão nhiệt đới, với xác suất trung bình và ảnh hưởng lớn, dẫn đến lượng mưa cực đoan gần các trung tâm của các cơn bão nhiệt đới làm sạt lở dọc theo bờ biển của Biển Đông, Vịnh Thái Lan, và biển Andaman. Thậm chí theo kịch bản bảo thủ nhất, mực nước biển dự kiến sẽ cao hơn khoảng 40cm vào cuối thế kỷ 21 so với hiện nay và điều này được dự báo sẽ tăng số dân vùng ven biển bị ngập lụt hàng năm.

10. Cùng chung nhận định như trên, dữ liệu của Bộ Tài nguyên Môi trường (TNMT) cho thấy BĐKH góp phần làm tăng nhiệt độ hơn 0,5°C và mực nước biển dâng thêm khoảng 20 cm so với 50 năm qua ở Việt Nam. Các hiện tượng cực đoan ngày càng gia tăng. Trong khoảng 1990 và 2012, đất nước này chịu trung bình hàng năm tổn thất do thiên tai là 457 người chết và 1,3% GDP. Trong cùng kỳ, hơn 96.703 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc bị cuốn trôi và 996.721 ngôi nhà bị hư hại đáng kể do tác động của thiên tai. Thông báo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam dự báo mực nước biển trung bình tăng 57-73cm dọc bờ biển Việt Nam vào năm 2100. Nếu không có hành động đáng kể thì khoảng 30.000km² tương đương 9,3% tổng diện tích đất liền của quốc gia sẽ bị ngập. Những dự báo khí hậu cũng chỉ ra mức tăng xác suất của các trận bão dữ dội, hoặc siêu bão, kèm theo triều cường, tương tự như đã tàn phá khu vực Tacloban (Bão Haiyan / Yolande) ở Philippines năm 2013.

11. Những xu hướng này đặt các vùng duyên hải và đồng bằng thuộc vùng đất thấp của Việt Nam vào mức rủi ro đặc biệt. Với 23%, tỉ lệ đói nghèo trong vùng duyên hải cao hơn hai lần tỉ lệ trung bình toàn quốc, một phần do tăng những tổn thất xảy ra hàng năm từ tác động của thiên tai liên quan đến khí hậu. Hơn 500.000 người sống trong phạm vi 200 mét kể từ bờ biển. Nhà cửa của họ hầu như thường xuyên chịu tác động trực tiếp của bão vì bị sạt lở và triều cường. Càng ngày càng có nhiều người, chủ yếu là người nghèo và dễ bị tổn thương trong vùng duyên hải sống trong các ngôi nhà không an toàn, một phần do đô thị hoá nhanh, thiếu công ăn việc làm phù hợp và do vậy họ không thể thoát khỏi cảnh đói nghèo.

12. Các nguồn tài nguyên sinh thái ven biển, như rừng ngập mặn ven biển, cung cấp khu đệm quan trọng chống lại bão, triều cường và xâm nhập mặn. Tuy nhiên, diện tích rừng ngập mặn giảm đáng kể, chủ yếu do sức ép dân số đang diễn ra và gần đây nhất là do việc phát triển mở rộng nuôi tôm và thủy hải sản không theo quy hoạch. Năm 1943, có khoảng 408.000 ha rừng ngập mặn ở Việt Nam. Tuy nhiên, điều tra rừng toàn quốc cho thấy diện tích rừng ngập mặn ở Việt Nam đã giảm còn 290.000 ha vào năm 1962, 252.000ha vào năm 1982 và 155.290 ha vào năm 2000. Theo các báo cáo của Chính phủ, tổng diện tích rừng ngập mặn tự nhiên ở Việt Nam vào cuối năm 2008 chỉ còn đứng ở mức 59.760ha⁵.

⁴ <https://maplecroft.com/about/news/ccvi.html>

⁵ Quyết định của CPVN số 1267/ QĐ-BNN-KL, 2009



13. Chiến lược phát triển bền vững của Chính phủ Việt Nam (CPVN) 2011-2020 đưa ra mục tiêu tổng thể là: tăng trưởng hiệu quả và bền vững phải đi đôi với bình đẳng và tiến bộ xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, ổn định chính trị-xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập-chủ quyền-thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Cụ thể, chiến lược này xác định ưu tiên:

- Đảm bảo ổn định, kinh tế vĩ mô, đặc biệt các chỉ số vĩ mô; duy trì vững chắc an ninh lương thực, an ninh năng lượng và tài chính. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang phát triển sâu rộng hài hoà; từng bước tiến hành tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế ít các bon; sử dụng tiết kiệm và hiệu quả mọi nguồn lực.
- Phát triển một xã hội văn minh, công bằng, hài hoà, kỷ luật và dân chủ; một nền văn hoá tiến bộ đậm đà bản sắc dân tộc; gia đình hạnh phúc, tiến bộ, ấm no; đảm bảo mọi người phát triển toàn diện mọi mặt về thể chất, tinh thần, trí tuệ, có năng lực sáng tạo, ý thức công dân, và ý thức chấp hành pháp luật. Làm cho giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ trở thành động lực chính cho phát triển. Duy trì vững chắc, ổn định chính trị-xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
- Giảm thiểu tác động tiêu cực của các hoạt động kinh tế đến môi trường. Khai thác hợp lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên không tái tạo. Phòng, chống và khắc phục ô nhiễm và suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ và phát triển rừng và đa dạng sinh học. Giảm ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai, chủ động ứng phó có hiệu quả với BĐKH, đặc biệt là nước biển dâng.

14. Một giải pháp thích hợp để giải quyết BĐKH trong các khu vực dễ bị tổn thương ven biển là phải tìm được sự cân bằng giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và tiến bộ xã hội. Hơn nữa, Hiến pháp của Việt Nam, Điều 59, mục 3 khẳng định rằng Nhà nước sẽ thực thi chính sách phát triển nhà ở và tạo điều kiện để mọi người có nhà ở. Các tỉnh ven biển của Việt Nam có một phần ba dân số sinh sống (30 triệu người), một giải pháp thích hợp phải bao gồm nhà ở chống chịu với khí hậu để đảm bảo an toàn cho các hộ gia đình tại các vùng dễ bị tổn thương.



C.2. Mục tiêu của dự án/chương trình so với Cơ sở dữ liệu hiện trạng

15. Hỗ trợ giải pháp lâu dài của Chính phủ, mục tiêu của dự án là tăng khả năng chống chịu của các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển trước các tác động liên quan đến BĐKH ở in Việt Nam, thông qua

- **Nhà ở an toàn cho các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương do bão lụt ngày càng gia tăng**
- **Tăng mạnh tỉ lệ che phủ rừng ngập mặn cung cấp khu đệm tự nhiên giữa biển và các cộng đồng ven biển**
- **Thông tin rủi ro khí hậu đáng tin cậy giúp hướng dẫn lập kế hoạch được thông tin rủi ro và chống chịu với BĐKH.**

16. Dưới đây mô tả tình hình nền.

Kịch bản nền

Nhà ở an toàn cho các cộng đồng dễ bị tổn thương

17. Các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng nhà ở của Chính phủ tại các vùng chịu ảnh hưởng lũ lụt hiện nay không phù hợp với các tiêu chuẩn tiên quyết đảm bảo an toàn cho công chúng trước tác động của bão lụt. Chính phủ (đặc biệt là chính quyền địa phương) chưa khảo sát các tiêu chuẩn phù hợp để áp dụng và đưa vào cải cách thể chế cần thiết nhằm xây dựng các tiêu chuẩn mà khu vực công và kinh doanh cần tuân thủ; tuy vậy cần công nhận rằng năng lực thực thi cũng còn yếu. Các công ty xây dựng và kỹ sư trong nước không được đào tạo để huấn luyện các công nhân và hộ gia đình ở địa phương, và các qui định về xây dựng chưa được sửa đổi tạo điều kiện lồng ghép các tính năng chống chịu lũ lụt trong thiết kế nhà.

18. Mặc dù các thiết kế thông lệ tốt nhất đã có và được thử nghiệm qua các dự án thí điểm nhỏ, việc phổ biến rộng rãi với qui mô đầy đủ công nghệ xây nhà chịu được bão lụt vẫn chưa được thực hiện. và do đó hiện vẫn còn thiếu các chính sách và cơ chế khuyến khích. Kết quả là mỗi năm khoảng 60.000 căn nhà bị phá huỷ hay hư hại nặng do bão lụt ở duyên hải Việt Nam. Các gia đình nghèo dễ bị tổn thương cao trước rủi ro của thiên tai vì có lẽ họ sống nhiều hơn trong các ngôi nhà dưới chuẩn. Thiệt hại, tổn thất và chi phí khôi phục liên quan từ các sự cố thời tiết cực đoan (ví dụ như bão) và hiểm hoạ thiên tai (ví dụ như lụt) đặt ra gánh nặng lâu dài lên nguồn tài chính eo hẹp của những người vốn đã dễ tổn thương.

19. Các nghiên cứu mới đây cho thấy tại các vùng chịu thiên tai, đầu tư nâng cấp nhà cửa thường được ưu tiên. Tuy nhiên, do kiến thức về công nghệ xây nhà an toàn nói chung còn thấp, thiếu hướng dẫn kỹ thuật và đào tạo, các gia đình có thể vô tình làm các khoản đầu tư làm kết cấu nhà mất ổn định hơn khi đối mặt với bão⁶. Với tình trạng đô thị hoá nhanh vùng ven biển Việt Nam, và rủi ro BĐKH tăng, hành động thúc đẩy xây nhà an toàn và lập kế hoạch nhạy cảm với rủi ro dựa vào cộng đồng trong các cộng đồng nhằm xác định địa điểm an toàn cho ngôi nhà là yêu cầu cấp thiết.

Hỗ trợ của Chính phủ xây nhà an toàn cho các cộng đồng dễ bị tổn thương

20. Nhận thấy có nhu cầu hỗ trợ các gia đình dễ bị tổn thương, CPVN đang thực hiện Chương trình quốc gia đưa ra các chính sách và giải pháp hỗ trợ các hộ gia đình nghèo xây nhà chống chịu bão lụt ở Trung bộ⁷. Chương trình do Bộ Xây dựng chủ trì đã xây dựng được các thông số kỹ thuật thiết kế giá rẻ về bố trí nhà, vật liệu và công nghệ xây dựng giúp tăng tính ổn định kết cấu chống chịu với lụt bão bình thường. Những ngôi nhà được xây dựng bên cạnh nhà hiện có, vì vậy không bị gián đoạn gây ảnh hưởng đến cuộc sống.

21. Chương trình này của Chính phủ giúp các gia đình xếp hạng “rất nghèo” và “nghèo” theo tiêu chí của Chính phủ, tiếp cận với tài chính để xây nhà an toàn phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế và vật liệu của Chính phủ. Cụ thể, chương trình giúp kết hợp cả tiền không hoàn lại và cho vay lãi suất thấp, với đào tạo về thiết kế nhà chống chịu bão lụt đã được phê duyệt, cụ thể như sau:

- Tiền không hoàn lại là 12 triệu đồng tương đương \$550/hộ gia đình đối với các hộ nghèo, cao nhất là đến 14 triệu đồng (US\$690) cho các hộ gia đình thuộc vùng đặc biệt khó khăn và 16 triệu đồng (US\$735) đối với các hộ thuộc các cộng đồng đặc biệt khó khăn⁸. Hỗ trợ cấp làm hai lần (70% sau khi hoàn thành móng và lần hai sau khi hoàn thành khung nhà đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế).
- Đào tạo cho thôn bản/xã và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tượng hưởng lợi.

⁶ Mái che từ một cơn bão góp nhặt: Chống chịu với bão ở Việt Nam (P. Tran, và cộng sự 2014)

⁷ QĐ 48/2014/QĐ-TT của CPVN

⁸ Theo QĐ số 1049/QĐ-TTg



22. Trong khi tài trợ không hoàn lại được cấp cho các hộ rất nghèo, số tiền không đủ để trả cho toàn bộ chi phí của ngôi nhà. Do vậy, sẽ có một khoản vay ưu đãi với lãi suất 3%/năm của Ngân hàng Chính sách xã hội, trả dần trong 10 năm, với thời gian ân hạn 5 năm. Mọi số tiền chênh lệch sẽ được cân đối thông qua các kênh khác (ví dụ: nguồn tiền riêng của mình hay đóng góp của cộng đồng).

23. Việc lựa chọn đối tượng nhận tài trợ được quyết định thông qua tham vấn các thôn bản, đánh giá tại cấp xã và thẩm định cuối cùng tại cấp tỉnh và cấp quốc gia đối với việc hỗ trợ chương trình. Tiêu chí đánh giá bao gồm: phân loại các hộ thuộc diện nghèo (Theo Quy các hộ thu09/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 01 năm 2011) và khả năng chống chịu bão lụt của căn nhà hiện đang ở so với các tiêu chuẩn tối thiểu của Chính phủ. Việc lựa chọn tiếp tục được xếp ưu tiên nhằm đảm bảo các nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương ở Việt Nam được hưởng lợi. Tiêu chí ưu tiên bao gồm:

- Hộ gia đình là dân tộc thiểu số
- Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (ví dụ chủ hộ là người già, hộ chỉ có một người và là người già, hộ có thành viên là người khuyết tật v.v.)
- Hộ gia đình ở địa phương đặc biệt khó khăn (vùng sâu, vùng xa) của các khu, thôn bản của tỉnh rất khó khăn
- Hộ gia đình ở các huyện nghèo nhất thuộc chương trình mục tiêu giảm nghèo của Chính phủ theo nghị quyết trung ương số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/7/2008 của Chính phủ
- Các nhóm xã hội dễ bị tổn thương khác.

24. Quá trình lựa chọn được thiết kế cho minh bạch và được uỷ ban xã xem xét. Các dữ liệu đánh giá tiêu chí để hỗ trợ được chính phủ thu thập một cách độc lập như một phần của chương trình dịch vụ xã hội rộng lớn hơn. Sau khi đã xác định các đối tượng, danh sách lại được một ban của các bên liên quan xem xét, và kết quả được đăng công khai. Nếu có phát sinh thắc mắc, thành viên cộng đồng có thể trực tiếp yêu cầu xã giải thích. Do đất ở tại Việt Nam là thuê lại của Chính phủ, những người nhận hỗ trợ cũng được đánh giá dựa trên tư cách pháp nhân về quyền sử dụng đất. Những người nhận hỗ trợ không được phép bán tài sản trong thời gian 10 năm vay vốn. Tiền trả nợ của những người nhận hỗ trợ sẽ được sử dụng để tiếp tục làm vốn quay vòng do Chính phủ giám sát nhằm nhân rộng cách thức này đến các gia đình khác.

25. Hơn nữa, chương trình của Chính phủ đã thành công trong việc lôi cuốn các tổ chức xã hội dân sự như Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên tham gia hỗ trợ các nhóm cần ưu tiên nói trên, cũng như các hộ gia đình phụ nữ làm chủ hộ, trong quá trình xây nhà thực tế.


Cơ hội cải tiến chương trình nhà ở của Chính phủ

26. Chương trình thí điểm hỗ trợ các hộ nghèo cải thiện điều kiện nhà ở an toàn, đối phó với lũ lụt ở các tỉnh duyên hải Bắc và Nam Trung Bộ có mục tiêu hỗ trợ 700 hộ ở 7 tỉnh. Thiết kế ban đầu bao gồm nâng cao nền nhà 1,5m và làm mái bằng. Tổng chi phí cho nhà xây theo thiết kế thí điểm đáp ứng yêu cầu tối thiểu là 1,300 US\$/nhà⁹ (đây được xem là dự toán rất thấp vì chưa phản ánh chi phí vật liệu và nhân công cao hơn ở những vùng xa xôi hẻo lánh). Tuy nhiên, thiết kế nhà này chưa xem xét đầy đủ mức độ lũ lụt dự báo và số cơn bão ngày càng tăng do biến đổi khí hậu. Hậu quả là đã có các nhà thuộc chương trình thí điểm, theo báo cáo, bị hư hại do bão. Cụ thể hơn, có những trường hợp được ghi nhận nước ngập vượt quá ngưỡng của nền nhà đã được tôn cao, và mái bằng của nhà cũng bị hư hại trong các trận bão. Điều này dẫn đến việc cần cải tiến chất lượng nhà thí điểm của Bộ Xây dựng.

27. Dựa trên những bài học từ chương trình thí điểm, Bộ Xây dựng đã đưa ra thiết kế cải tiến (Xem Hình 1). Thiết kế cải tiến xây dựng trên nền các tính năng chống chịu biến đổi khí hậu của các thiết kế cũ (ví dụ, 10m² sàn và các khung bê tông chịu lực) với một cấu trúc 2 tầng và một tầng lửng cách sàn 3m, với một mái tôn sóng vút. Chi phí ước tính của nhà thiết kế tăng cường được ước tính vào khoảng 1.500 \$ - 2.000 \$, tùy thuộc vào chi phí nguyên vật liệu và lao động tại địa phương.

⁹ Báo cáo cuối cùng – Kết quả các biện pháp thí điểm hỗ trợ hộ gia đình nghèo xây nhà ở an toàn, đối phó với lũ lụt tại các vùng duyên hải Bắc và Trung Trung Bộ theo quyết định số 716/QĐ-TTg ngày 14/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Hình 1: Thiết kế nhà chống chịu bão lụt

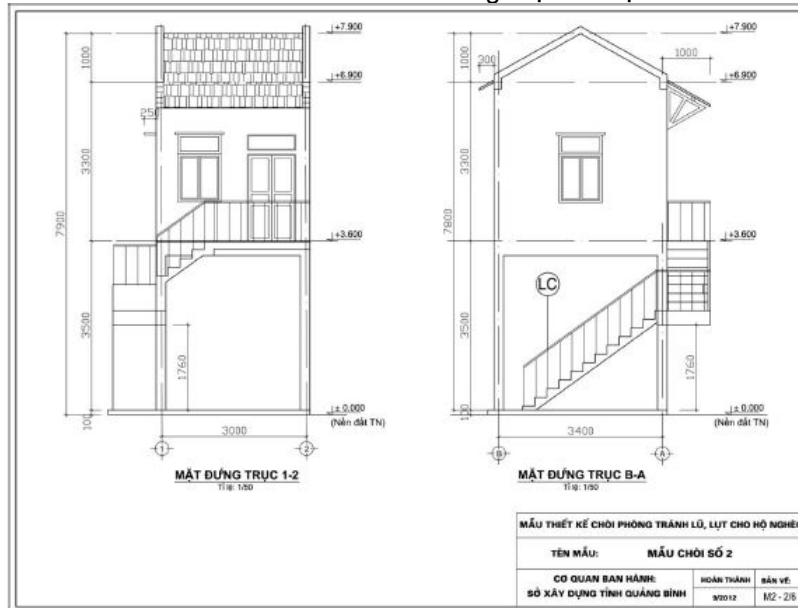

28. Trong khi thiết kế hiện nay đã cải tiến từ thiết kế thí điểm, Bộ Xây dựng vẫn nhấn mạnh sự cần thiết phải có cải tiến thêm để bảo vệ tốt hơn các gia đình dễ bị tổn thương từ tần suất và cường độ ngày càng tăng của lũ lụt và siêu bão/bão do biến đổi khí hậu. Cụ thể của những cải tiến này gồm (a) mái bê tông có các thanh giằng và khớp nối được tăng cường (900 US\$), (b) cửa sổ, cửa ra vào được gia cố và chống thấm (400 US\$) và (c) cải thiện đường thoát nước, chọn vị trí và nâng cao đế cột (400 US\$). Cải thiện công tác giám sát cũng được yêu cầu để đảm bảo các sản phẩm hoàn chỉnh phản ánh các tính năng chống chịu của thiết kế nhà (300 US\$). Tổng chi phí của việc cải thiện chất lượng này ước tính lên tới khoảng 2.000 US\$/nhà.

29. Vì việc hỗ trợ không hoàn lại được tiến hành thông qua chương trình xây nhà của Chính phủ không hỗ trợ toàn bộ tổng chi phí của căn nhà, nên gánh nặng tài chính tăng lên do phải bổ sung các biện pháp tăng cường nói trên khiến các gia đình dễ bị tổn thương, nhất là các hộ "rất nghèo" vào tình thế khó khăn. Cần hỗ trợ thêm các khoản không hoàn lại cho các hộ gia đình xây nhà theo thiết kế có tính năng bổ sung chống chịu với biến đổi khí hậu.

30. Ngoài ra còn có nhu cầu có thêm thông tin về lựa chọn địa điểm cho những ngôi nhà mới trong chương trình của chính phủ. Mặc dù có tính đến tình hình lũ lụt trong quá khứ, quá trình đánh giá hiện tại còn hạn chế và không đưa vào một cách có hệ thống các thông tin dữ liệu được xây dựng gần đây, bao gồm các thông tin về nước biển dâng và triều cường liên quan đến bão lốc cực đoan. Theo chính sách của Chính phủ, các hộ gia đình trong các khu vực đã từng có lịch sử lũ lụt trên 3,6m không được tham gia chương trình này, thay vào đó, sẽ phải di dời. Trong các trường hợp như vậy, các hộ gia đình này sẽ được đưa vào diện hỗ trợ trong các chương trình quốc gia khác.

31. Hơn nữa, chương trình nhà ở của chính phủ đã không sử dụng dữ liệu có sẵn về nguy cơ lũ lụt và bão ở cấp địa phương, và cũng không khai thác kiến thức cộng đồng trong việc quyết định chọn địa điểm và thiết kế. Một phần là vì Bộ Xây dựng thiếu khả năng tiếp cận đến cấp xã. Điều này có nghĩa rằng các khoản đầu tư hiện tại về nhà ở an toàn thiếu gắn kết với quy hoạch sử dụng đất và dự toán ngân sách hàng năm tại cộng đồng và cấp địa phương, do đó cơ hội để tăng cường giảm thiểu rủi ro tổng thể hoặc đóng góp vào các biện pháp bảo vệ bị bỏ qua. Đây có thể bao gồm đầu tư quy hoạch phát triển như cơ sở hạ tầng kháng bão (ví dụ cung cấp nước và vệ sinh môi trường sạch hơn, hoặc gia cố đê, v.v...) để đảm bảo rằng các dịch vụ công cơ bản không bị phá hủy và bị gián đoạn bởi bão và lốc xoáy.


32. Một chỉ số đánh giá/rủi ro dễ bị tổn thương tổng thể đã được tiến hành kết hợp nhiều mối nguy hiểm ở cấp quốc gia. Các bản đồ nguy cơ bão lụt đã được đưa thêm vào Phụ lục IX, những tấm bản đồ này chưa bao gồm dự báo khí hậu, cũng như chưa có lũ lụt sông liên quan.

- Xác suất bão lịch sử

- Xác suất của lũ lụt liên quan đến mưa

33. Tuy nhiên, đã có các thông lệ tốt ở Việt Nam về lập kế hoạch và lập bản đồ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, áp dụng các phương pháp đã thí điểm thành công. Chương trình CBDRM 2009-2020 khuyến khích quá trình sáu bước (xem Hình 2) chủ động lôi cuốn các cộng đồng tham gia trong mọi hoạt động quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với BĐKH, từ phân tích và xác định rủi ro tới lập kế hoạch hành động, thực hiện, giám sát & đánh giá, nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và nâng cao khả năng thích ứng và đối phó của cộng đồng. Chương trình đào tạo về giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với BĐKH cũng như hướng dẫn thực hiện đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRA) lập ra các kế hoạch CBDRM chỉ ra các xã sẽ làm thế nào để quản lý thiên tai và rủi ro BĐKH hiệu quả hơn. Các nhóm cộng đồng bao gồm lãnh đạo địa phương, chuyên gia kỹ thuật và dân địa phương thuộc mọi thành phần cũng như đại diện các tổ chức dân sự, kể cả Hội chữ thập đỏ, Hội phụ nữ, Hội những người khuyết tật.

Hình 2: Quy trình CBDRM sáu bước

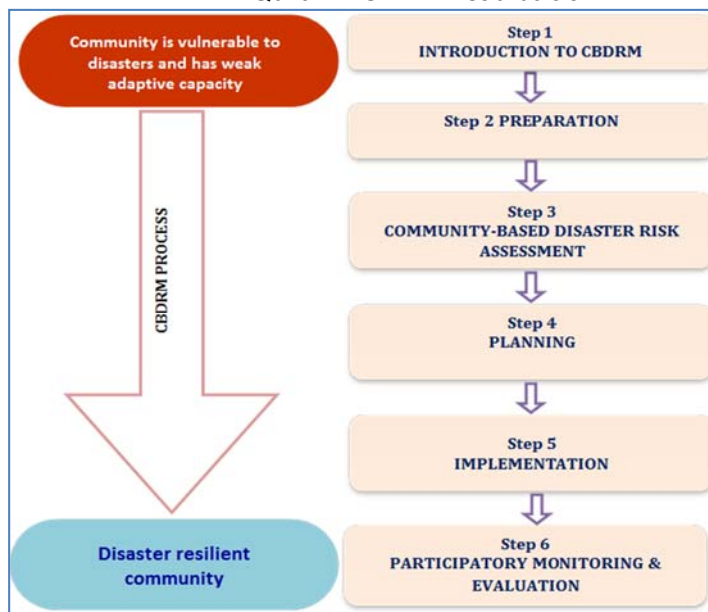

34. Chương trình Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM) có mục tiêu hướng tới 6.000 cộng đồng có rủi ro cao vào năm 2020 (hơn 60% số cộng đồng ở Việt Nam). Chương trình đã thành công bước đầu với hơn 1.700 xã. Phù hợp với cách tiếp cận lồng ghép thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ rủi ro thiên tai (DRR-CCA) bắt buộc của Ban đổi mới của Việt Nam, chương trình đã được thiết kế để giải quyết cả thiên tai truyền thống và các yêu cầu về bổ sung thích ứng với BĐKH. Các phương pháp lập kế hoạch, tài liệu hướng dẫn, đội ngũ giảng viên và hệ thống giám sát đánh giá đã được nêu bật trong Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về các sự cố cực đoan nộp cho IPCC là phương tiện hiệu quả trong xây dựng khả năng chống chịu và đã được LHQ, Hội chữ thập đỏ, EU và ASEAN và những tổ chức khác xác định là thông lệ tốt điển hình. Hướng dẫn về CBDRM và CBDRA được đính kèm đây để tham khảo tại Phụ lục XV.

35. Các đánh giá về chương trình nhà ở của Chính phủ và chương trình CBDRM có thể tìm trong Phụ lục VIII..

Tăng mạnh tỉ lệ che phủ rừng ngập mặn để cung cấp khu đệm tự nhiên giữa biển và các cộng đồng ven biển

36. Rừng ngập mặn ven biển đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ bờ biển, hoạt động như vùng đệm giữa biển và cộng đồng, hấp thụ một số tác động của bão và triều cường. Rừng ngập mặn cũng có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái ven biển, chống xói mòn đất và xâm nhập mặn, cung cấp nơi cư trú quan trọng cho cá, cua, sinh vật và động vật thủy sinh vùng cửa sông. Ở Việt Nam, rừng ngập mặn cũng đã bị phá hủy nghiêm trọng, từ 408.500 ha năm 1943 còn có 59.760ha vào năm 2008. Những yếu tố chính gây ra sự suy giảm này bao gồm đô thị hoá, phát triển cơ sở hạ tầng, và tăng trưởng nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình và hợp tác xã nông nghiệp tại địa phương.



37. Việc khôi phục thành công rừng ngập mặn rất phức tạp và cực kỳ tốn kém nếu không được thực hiện đúng cách. Ví dụ, kinh nghiệm từ các nước khác cho thấy chi phí để khôi phục thành công cả thảm thực vật và chức năng sinh thái của rừng ngập mặn nằm trong khoảng từ 225 US\$/ha đến 216.000 US\$/ha. Dữ liệu chưa công bố chỉ ra chi phí thậm chí còn cao hơn nhiều, 500.000 US\$/ha, đã được chi cho các dự án đơn lẻ (Lewis, 2001). Điều này là do mức độ suy thoái trên lập địa và mức độ nỗ lực cần thiết để phục hồi khu vực, và các can thiệp liên tục do bị thất bại. Nói chung phục hồi rừng ngập mặn có tỷ lệ thất bại cao, trích dẫn các bài học kinh nghiệm tương tự từ những dự án thí điểm ở Việt Nam.

38. Vào năm 2008, Chính phủ đã triển khai **Chương trình phát triển và phục hồi rừng ngập mặn 2008-2015**, tạo ra thành công trong việc đảo ngược xu hướng suy giảm tỉ lệ che phủ rừng ngập mặn ven biển. Tuy vậy, chương trình hiện nay được thiết kế để áp dụng chế độ trồng rừng độc canh và tỉ lệ cây sống của rừng ngập mặn được chương trình hỗ trợ chỉ có 50%. Đây là hệ lụy của nhiều yếu tố bao gồm: (a) chất lượng cây giống thấp, (b) thiếu biện pháp bảo vệ cây con khỏi hư hại vật chất trong giai đoạn đầu của sự phát triển, (c) thiếu chọn lọc các loài cây khác nhau, (d) phương pháp trồng không phù hợp với lập địa cụ thể và (e) thiếu sự tham gia của cộng đồng trong việc chăm sóc và giám sát. Số liệu thống kê của Chính phủ chỉ ra rằng 62% rừng ngập mặn hiện có của Việt Nam là rừng mới trồng độc canh. Thiếu sự tham vấn đầy đủ của cộng đồng và thiếu việc nâng cao nhận thức cho dân địa phương về ích lợi của trồng rừng ngập mặn dẫn đến hậu quả là sự tham gia của cộng đồng trong nhiều vùng thấp, ngăn cản công tác quản lý rừng dài hạn. Chương trình hiện nay của Chính phủ áp dụng định mức tái sinh rừng ngập mặn trong khoảng 800-1000 US\$/ha với mức cao nhất lên tới 1.000-7.000 US\$ đang được áp dụng cho trồng lại hoàn toàn, tùy thuộc vào mức độ khó khăn của vị trí trồng rừng được lựa chọn.

39. Một số các tổ chức quốc tế đã góp phần nâng cao phương pháp tiếp cận để hỗ trợ các mục tiêu của Chính phủ:

Bảng 1: Các dự án thí điểm phục hồi rừng ngập mặn

Tên dự án	Nguồn tài trợ	Ngân sách	Thời gian	Số hecta	Địa điểm
Chương trình trồng rừng ngập mặn phòng chống thiên tai	Hội chữ thập đỏ Nhật Bản	1.743.938	2009 - 2015	2.296	06 huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Sầm Sơn, Quảng Xương, Tĩnh Gia
Dự án đầu tư phát triển rừng ngập mặn ở các cộng đồng ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa	Quỹ hiểm họa thiên tai Trung bộ	925.250	2010 - 2015	200	Huyện Hậu Lộc
Lồng ghép bảo vệ và phục hồi rừng ngập mặn ven biển tỉnh Cà Mau	Đức (KfW)	1.200.000	2013 - 2019	21 ¹⁰	Tây Cà Mau (Huyện U Minh)

40. Những dự án thí điểm này được thực hiện bằng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) chủ yếu ở miền Nam Việt Nam và thực hiện nhằm khắc phục những thách thức hiện tại bằng cách áp dụng các công nghệ và phương pháp trồng được nâng cao. Những cách tiếp cận cải tiến gồm (a) đa dạng hóa và đưa các giống cây ngập mặn phù hợp với điều kiện địa phương, (b) sửa đổi kỹ thuật trồng, (c) sử dụng các công cụ như kè chắn sóng bằng tre, để khuyến khích các cây non phát triển, và (d) nâng cao chất lượng đất và cải tiến chăm sóc rừng non. Một số dự án thí điểm cũng đã tìm cách chủ động lôi cuốn sự tham gia của các cộng đồng trong việc lập kế hoạch và chăm sóc, cũng như trong việc chọn lựa địa điểm sao cho sinh kế của dân địa phương như thủy sản, và rừng ngập mặn có thể cùng tồn tại.¹¹ Mặc dù định mức của những dự án thí điểm cao hơn tỉ lệ hiện nay của Chính phủ, các nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng áp dụng các phương pháp công nghệ cải tiến có thể tăng tỉ lệ cây sống trung bình lên hơn 80% – cao hơn nhiều so với tỉ lệ trung bình 50% hiện nay. Các dự án nói trên hiện vẫn đang hoạt động, sẽ góp một phần vào mục tiêu của giai đoạn tiếp theo của chương trình rừng ngập mặn của Chính phủ. Khôi phục rừng ngập mặn ven biển trong Báo cáo nghiên cứu rừng ngập mặn Việt Nam 2012, đính kèm trong Phụ lục VIII (Báo cáo đánh giá) của tài liệu này đưa ra các đánh giá về nỗ lực phục hồi rừng ngập mặn trước đây.

41. **Dự án bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn ven biển ứng phó với BĐKH 2015-2020** mới được thông qua gần đây tại Quyết định 120/QĐ-TTg cho 28 tỉnh duyên hải Việt Nam. Dự án yêu cầu tổng số 245 triệu US\$ (5.415 tỉ đồng) và có kế

¹⁰ Mục tiêu hecta của dự án KfW tương đối thấp vì dự án chủ yếu tập trung vào hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ bờ biển.

¹¹ GIZ, 2012. Khôi phục bờ biển và phục hồi rừng ngập mặn sử dụng hàng rào trầm (Malaleuca): Kinh nghiệm thực tế từ tỉnh Kiên Giang. Dự án bảo tồn và phát triển Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang.



hoạch đầu tư hàng năm 41,4 triệu US\$ (902 tỉ đồng). Chính quyền trung ương dự tính cung cấp 70% tổng chi của chương trình và 25% đến từ nguồn ODA và 5% từ đóng góp của địa phương, mặc dù vậy đến nay mới chỉ có một phần vốn được thu xếp. Dự án này của Chính phủ được xếp vào hàng ưu tiên cao, và được trích dẫn cụ thể như một nền tảng cho hành động thích ứng trong dự thảo thích ứng của INDC Việt Nam. Dự án này hướng tới:

- bảo vệ 310.695ha rừng phòng hộ ven biển hiện có
- trồng lại 46.058ha rừng ven biển (trong đó 29.500ha là rừng ngập mặn)
- trồng lại 7.508ha rừng chắn gió và cát và 9.050ha rừng sản xuất
- và phục hồi 9.602ha rừng nghèo

42. Nhận thấy nhu cầu mở rộng qui mô và nhân rộng cách tiếp cận cải tiến thúc đẩy phục hồi rừng ngập mặn hiệu quả hơn, chính phủ đang xem xét khả năng tăng định mức từ US\$800-1000/ha lên US\$1.500 đối với tái sinh qua quá trình tuyển chọn tự nhiên, và áp dụng chi phí bình quân tăng lên US\$4.000 đối với trồng lại rừng.

Nâng cao chất lượng thông tin về nguy cơ từ biến đổi khí hậu để hướng dẫn lập kế hoạch chống chịu với biến đổi khí hậu và thông tin nguy cơ

43. Một yếu tố quan trọng, tăng cường hiệu quả của các nỗ lực để giải quyết các tác động biến đổi khí hậu ven biển, là đảm bảo rằng các quyết định được củng cố bằng dữ liệu rủi ro khí hậu có chất lượng. Khi xây dựng bản đồ xác định vị trí xây nhà ở và lưu giữ tài sản khác một cách an toàn, và đánh giá phần nào của bờ biển đòi hỏi cần bảo vệ rừng ngập mặn, thông tin rõ ràng về dự báo biến đổi khí hậu và rủi ro là điều cần thiết. Thông tin này cần kết hợp đánh giá rủi ro có sẵn, bản đồ triều cường, kiến thức lịch sử về thiên tai và mất mát, với dự báo biến đổi khí hậu để hướng dẫn lập kế hoạch phát triển có được thông tin rủi ro và chống chịu với biến đổi khí hậu.

44. Để thông tin này có thể thuyết phục được những người làm chính sách, các tác động nguy hiểm cũng cần được thể hiện dưới dạng số liệu kinh tế và tài chính, truyền tải giá trị hiện tại và trong tương lai của các tài sản đang có nguy cơ bị ảnh hưởng. Việc này đòi hỏi phải phân tích dữ liệu tổn thất và thiệt hại trong quá khứ để hiểu rõ hơn tác động hiện tại đối với nền kinh tế và sau đó xây dựng năng lực lập mô hình như vậy đối với các tác động liên quan đến BĐKH trong tương lai có thể xảy ra. Chính phủ đã nhận thấy sự cần thiết có thông tin loại này song cố gắng hỗ trợ mô hình hoá kinh tế và tài chính về rủi ro khí hậu được cải tiến trong các cơ quan quan trọng cần thông tin này (cả hai khu vực công và tư) đang còn phân tán và kém phát triển. Tác động lâu dài của thiếu sót này đối với tiềm năng phát triển, phát triển kinh doanh và quản lý rủi ro là rất lớn.

45. Tăng cường lập bản đồ nguy cơ cho các tỉnh về biến đổi khí hậu và mối hiểm hoạ tiềm ẩn đã được xác định là một nhu cầu quan trọng trong Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam và sau đó là một loạt các quyết định của Văn phòng Chính phủ để xây dựng bản đồ nguy cơ chi tiết cho các vùng khác nhau ở Việt Nam, đặc biệt là Quyết định 172/2007/QĐ-TTg năm 2007 về bản đồ sạt lở đất và lũ quét; và Thông báo của Thủ tướng Chính phủ số 171/TB-VPCP ngày 23/4/2014 và 410/TB-VPCP ngày 13/10/2014 về xây dựng bản đồ ngập lụt cho các cơn bão và triều cường. Nhu cầu bổ sung thông tin bản đồ cũng được nhấn mạnh bởi hơn 400 nhà khoa học từ Việt Nam và khu vực như tại kết luận chính của Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về các hiện tượng cực đoan (SRX 2014). Tương tự như vậy, một nghiên cứu năm 2010 của Ngân hàng Thế giới về Lựa chọn cho tài chính rủi ro thiên tai tại Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết của mô hình hoá rủi ro thảm họa, đánh giá rủi ro và đánh giá thiệt hại liên quan đến thảm họa như khuyến nghị hành động chính. Ở cấp xã, hội thảo rút kinh nghiệm để thực hiện CBDRM ở cấp xã do Chính phủ Việt Nam, UNDP, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Oxfam phối hợp tổ chức vào năm 2014 đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện tiếp cận dữ liệu về rủi ro như một hợp phần quan trọng trong lập kế hoạch có hiệu quả ở cấp xã.

46. Hiện nay ở Việt Nam việc dự báo BĐKH và xu hướng rủi ro thiên tai đi kèm chưa được hiểu rõ, hoặc không được phổ biến rộng rãi, do đó cản trở việc sử dụng những dự báo này, nhất là ở cấp địa phương. Chính phủ đã làm việc với các viện nghiên cứu và một số bộ ngành chủ chốt của Chính phủ ở cấp trung ương để xây dựng những dự báo BĐKH tốt hơn và thực hiện nghiên cứu trong một số lĩnh vực chủ chốt như rủi ro triều cường đi liền với khả năng tăng cường cường độ bão. Tuy nhiên, các dữ liệu này chưa được sử dụng một cách có hệ thống. Mới đây Chính phủ đã thiết lập bản đồ triều cường ven biển lần đầu tiên của Việt Nam để cải thiện việc lập bản đồ ngập lụt ven biển. Chất lượng dữ liệu cũng đã được cải thiện đưa vào các dữ liệu siêu bão và triều cường dựa trên mô hình 2014-2015, và dự báo mực nước biển dâng chính xác hơn được đưa vào báo cáo đánh giá lần thứ năm trình IPCC. Phân tích bổ sung các khu vực bị xâm nhập mặn sử dụng công nghệ vệ tinh cũng bắt đầu được áp dụng. Trong khi nhiều dữ liệu như vậy đã được xây dựng hay sắp hoàn thành,



việc sử dụng dữ liệu trong qui hoạch, lập kế hoạch vẫn chưa được tiến hành một cách có hệ thống hay phổ biến có hiệu quả.

47. Mặc dù Bộ NN&PTNT đã được tăng cường năng lực về khả năng báo cáo thiệt hại và tổn thất do BĐKH và thiên tai, cần phải tiếp tục xây dựng năng lực ở cấp trung ương và địa phương. Các xã cần yêu cầu tư vấn kỹ thuật về việc làm thế nào để thu thập các số liệu chính xác hơn về thiệt hại và tổn thất do BĐKH gây ra trong địa bàn mình để hỗ trợ giám sát có hệ thống việc xây dựng sức chống chịu ở vùng ven biển. Để đo lường hiệu quả những thay đổi về khả năng chống chịu từ cấp địa phương đến trung ương trong hoàn cảnh BĐKH, cần tiếp tục nâng cấp hệ thống hiện có.

48. Với sự hỗ trợ từ UNDP, Chính phủ đã bắt đầu dự thảo một thông tư tăng cường, nêu rõ cách thức thu thập, xử lý và công bố số liệu về tổn thất và thiệt hại do khí hậu và thiên tai gây ra, nhằm phục vụ công tác phân tích và qui hoạch, lập kế hoạch. Thông tư dự thảo hiện nay được xây dựng dựa trên hệ thống thiệt hại thiên tai DesInventar hiện có, được phát triển năm 2012 với sự trợ giúp của UNISDR và UNDP. DesInventar là công cụ khái niệm và phương pháp luận để điều tra thiên tai quốc gia và xây dựng cơ sở dữ liệu về thiệt hại, tổn thất và nói chung là ảnh hưởng của thiên tai. Hệ thống cũng hướng tới việc xây dựng một hệ thống quản lý thông tin thiên tai bền vững trong một cơ quan để thu thập, tài liệu hoá, và phân tích số liệu có hệ thống về tổn thất do thiên tai cùng với hiểm họa thiên nhiên gây ra. Bộ NN&PTNT hiện đang vận hành đầy đủ cơ sở dữ liệu sử dụng vốn và nguồn lực hiện có của Chính phủ, số liệu thống kê về thiên tai hàng năm được đưa lên trang mạng của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và tạo cơ sở thu thập các số liệu thiên tai chính thức của Việt Nam báo cáo với ISDR và IPCC.

49. Các tỉnh, thành thường xuyên sử dụng mẫu báo cáo thiên tai DesInventar để báo cáo số liệu thiệt hại và nhu cầu cứu trợ dùng đưa vào phần mềm. Tuy nhiên, chỉ với 1.900 thẻ dữ liệu cho giai đoạn 1989-2010, số liệu tổn thất/thiệt hại có sẵn của Việt Nam quá thấp, với ít phân tách ngoài cấp tỉnh¹². Tăng kỹ năng của các xã nhằm báo cáo số liệu có chất lượng sẽ, qua thời gian, giúp bộ dữ liệu thiên tai quốc gia trở nên chính xác hơn nhiều, và do đó có ích hơn trong việc giám sát thay đổi sức chống chịu và trong lập kế hoạch đầu tư thích ứng có mục tiêu rõ ràng. Thông tư mới, nếu được thực thi tốt, có thể là phương tiện chủ chốt cho cải thiện công tác thu thập và lưu hồ sơ số liệu thiên tai cũng như cơ chế thể chế để lưu trữ và cập nhật cơ sở dữ liệu. Việc mở rộng chương trình quốc gia CBDRM có thể cũng là một phương tiện quan trọng để tăng hiểu biết về cách thức làm thế nào và khi nào số liệu thiên tai nên được chuyển để đưa vào hồ sơ quốc gia. Để đảm bảo số liệu cấp xã đã thu thập được xử lý và sử dụng có hiệu quả, cần hỗ trợ cấp quốc gia và cấp tỉnh nâng cấp cơ sở dữ liệu về tổn thất và thiệt hại hiện có trên bộ số liệu theo dõi thiên tai quốc gia hiện có. Việc này sẽ nâng cao chất lượng giám sát và đánh giá việc xây dựng khả năng chống chịu của quốc gia.

50. UNDP có hai chương trình đang thực hiện **Tăng cường năng lực thể chế cho quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam giai đoạn 2 (SCDM-II)** và **Xây dựng năng lực thực hiện Chiến lược biến đổi khí hậu quốc gia (2014-2017)** góp phần tăng cường năng lực quốc gia để thu thập, phân tích, sử dụng và phổ biến thông tin về rủi ro thiên tai và khí hậu. Các chương trình này đang hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo, tăng cường điều phối trong khuôn khổ Chiến lược Quốc gia về Biến đổi khí hậu.

51. Tiếp cận đến số liệu là vấn đề then chốt, và Chính phủ cần củng cố hơn kho số liệu về rủi ro để có thể quản lý các số liệu đến, tăng tính dễ tiếp cận của nguồn số liệu này cho các Bộ ngành, các Viện khoa học và các bên liên quan khác. Một bộ số liệu tốt về tổn thất và thiệt hại liên quan đến khí hậu sẽ được sử dụng rộng rãi trong việc lập kế hoạch không chỉ của chính phủ, mà còn được lĩnh vực tư nhân sử dụng trong các công việc như định giá các sản phẩm bảo hiểm hay các công cụ chuyển giao và chia sẻ rủi ro tài chính.

52. Cuối cùng, mặc dù chính phủ đã và đang chủ động trong việc xây dựng các kịch bản khí hậu để dự đoán tác động trong tương lai, Việc ứng dụng và sử dụng các thông tin này trong quá trình lập kế hoạch và ra quyết định của các cơ quan Chính phủ vẫn còn là một thách thức. Số liệu rủi ro BĐKH và thiên tai không được kết nối hoàn toàn với các quá trình lập kế hoạch chi tiêu vốn/đầu tư ở cấp bộ, quốc gia và tỉnh. Thông lệ hiện nay có cả việc đưa ra số liệu khí tượng thủy văn (thời tiết), không dự báo xác suất khí hậu và rủi ro liên quan đến khí hậu. Định lượng rủi ro sẽ cho phép tính chi phí các phương án thay thế để giảm rủi ro. Lập kế hoạch thích ứng cũng chưa bắt đầu tính đến yếu tố rủi ro về mất mát và thiệt hại về lâu dài, nhất là mất đất do nước biển dâng, đang ngày một xảy ra nhiều hơn ở vùng đồng bằng và ven biển đất thấp.

¹² <http://222.252.27.1:8081/DesInventar>



53. Thông qua các sáng kiến hỗ trợ mới đây của ADB-UNDP, Bộ NN&PTNT cũng đang triển khai thí điểm chỉ số rủi ro tích hợp cho khả năng chống chịu có thể giúp đưa ra quyết định của tỉnh về các ưu tiên thích ứng. Những công cụ này tổng hợp rủi ro hiểm họa khí hậu với các số liệu tổn thương kinh tế-xã hội của địa phương sẽ cho ta thấu hiểu chính xác không chỉ tác động của khí hậu mà còn cả mức độ xuất hiện cấp địa phương đối với các tác động đó. Các chỉ số và bản đồ có thể tiếp cận được có thể được sử dụng như một công cụ giúp hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư và ra quyết định. Nhân rộng hình thức lập bản đồ này cho toàn bộ bờ biển, áp dụng số liệu thống nhất và so sánh được có thể là thay đổi chuyển hoá trong khả năng phân tích và so sánh rủi ro BĐKH vùng ven biển của Việt Nam.

54. Một vấn đề khó khăn nữa là tạo điều kiện để khu vực công và tư nhân có thể đầu tư vào nỗ lực giảm rủi ro một cách có hệ thống hơn. Để tháo gỡ khó khăn cũng như định hướng và chuyển hướng đầu tư công và tư vào giảm thiểu rủi ro, cần có số liệu chính xác về tổn thất và thiệt hại trong quá khứ, rủi ro hiểm họa cụ thể và số liệu tác động của khí hậu qui mô giảm dần. Những thông tin này hiện không thể tiếp cận được ngoài chính phủ, hay không đủ chất lượng ở vùng duyên hải Việt Nam, nhưng điều này đã không thể thực hiện được do hạn chế về năng lực.

55. Mặc dù chính phủ đã và đang chủ động trong việc xây dựng các kịch bản khí hậu để dự đoán tác động trong tương lai, các cơ quan của chính phủ lại thấy khó áp dụng các thông tin này trong việc lập kế hoạch và ra quyết định. Số liệu rủi ro BĐKH và thiên tai không được kết nối hoàn toàn với các quá trình lập kế hoạch chi tiêu vốn/đầu tư ở cấp bộ, quốc gia và tỉnh. Thông lệ hiện nay có cả việc đưa ra số liệu khí tượng thủy văn (thời tiết), không dự báo xác suất khí hậu và rủi ro liên quan đến khí hậu. Định lượng rủi ro sẽ cho phép tính chi phí các phương án giảm rủi ro thay thế.

56. Chương trình xây dựng năng lực thích ứng về kinh tế thích ứng với BĐKH của UNDP/USAID (ECCA¹³) đang hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực thể chế áp dụng các nguyên tắc kinh tế và kỹ thuật để thông báo lập kế hoạch thích ứng bền vững và tiết kiệm chi phí. Chương trình đã đào tạo về phân tích kinh tế (như phân tích chi phí-lợi ích (CBA) cho các cán bộ kỹ thuật của Bộ KH&ĐT, TNMT và NN&PTNT. Là một phần của chương trình, một cuộc khảo sát 600 hộ gia đình đã được tiến hành để đo lường tác động của BĐKH đến các hoạt động kinh tế. Công tác thu thập số liệu mới vừa hoàn thành với sự trợ giúp phân tích trong vài tháng tới. ECCA cũng là quá trình xây dựng tài liệu tập huấn để mở một lớp cho cán bộ chính phủ, hoặc trên mạng hoặc thông qua một đại học ở địa phương. Có cơ hội lồng ghép khóa huấn luyện này vào các cơ quan có liên quan, cũng như kết nối các số liệu khảo sát với số liệu DesInventar nhằm ước tính tác động kinh tế của thiên tai ở nhiều cấp dưới trung ương khác nhau.

57. Dự báo BĐKH đưa ra khả năng tăng thiên tai lớn liên quan đến BĐKH ở Việt Nam, như siêu bão 2013 tàn phá ở nước láng giềng Phillipine, gây thiệt hại hơn 3% GDP. Khả năng quản lý rủi ro tài chính của các sự cố tác động lớn/xác suất thấp được xác định có lẽ là khác biệt lớn nhất về năng lực thích ứng giữa các nước thu nhập trung bình và thấp. Hiện nay, chính phủ chịu gánh nặng trực tiếp của hầu hết những rủi ro tài chính lớn liên quan đến các sự cố khí hậu, đền bù cho các nạn nhân thông qua cứu trợ thiên tai hay các dự án tái thiết. Do vậy, dự án GCF cũng sẽ sử dụng các số liệu đối chiếu nói trên để hỗ trợ xây dựng kế hoạch của Chính phủ nhằm chuyển rủi ro trong trường hợp thiên tai qui mô lớn liên quan đến khí hậu ven biển (tổn thất hơn 3% GDP). Dự án cũng hỗ trợ Chính phủ xác định cơ chế chuyển rủi ro phù hợp, nhất là tính tới bảo hiểm hay những lựa chọn trái phiếu thảm họa nhằm tái thiết tài chính sau một cơn bão qui mô lớn. Việc này dựa trên rà soát các mô hình thành công trong khu vực hay toàn cầu và hiểu được hoàn cảnh địa phương mà các công cụ này đã được áp dụng thành công.

58. Mặc dù rất nhiều thiệt hại và tổn thất tiềm năng liên quan đến tác động của khí hậu có thể quản lý thông qua hành động thích ứng hiệu quả, kể cả điều chuyển và chia sẻ rủi ro với khu vực tư nhân, một số tổn thất còn lại sẽ vẫn còn đó. Nguồn lực của GCF sẽ hỗ trợ để thiết kế một hệ thống tính toán tốt hơn rủi ro tổn thất và thiệt hại dài hạn do tác động của BĐKH trong quá trình lập kế hoạch và xây dựng chính sách trên hệ thống hiện hành. Hỗ trợ kỹ thuật cũng sẽ được cung cấp giúp chính phủ bắt đầu xác định và theo dõi tổn thất dài hạn liên quan đến BĐKH phù hợp với các yêu cầu của Tuyên bố Vácxava mới đây.

59. Do mức độ rủi ro cao và đa dạng, việc chia sẻ rủi ro công-tư sẽ có lẽ là thành tố then chốt đối với thích ứng hiệu quả và lâu dài ở Việt Nam. Cơ chế chia sẻ và chuyển rủi ro tài chính hiện kém phát triển ở Việt Nam. Mức bảo hiểm cho hộ gia đình theo đầu người thấp, chính phủ thiếu chiến lược quản lý rủi ro liên quan đến khí hậu. Số liệu tin cậy về thiên tai và khí hậu là động cơ cho phát triển sản phẩm chuyển giao rủi ro sang khu vực tư nhân. Ngược với bảo hiểm nông nghiệp nơi xác định chính xác phạm vi khu vực bị ảnh hưởng rất phức tạp và chi phí cao, việc xác định phạm vi thiệt hại bão lụt sau

¹³ <http://www.undp-alm.org/projects/ecca-asia>



một sự cố hiểm họa cực đoan như một trận lũ lụt hay một cơn bão ít phức tạp hơn. Tuy vậy, khó khăn cho các công ty bảo hiểm là có khả năng định giá cạnh tranh các sản phẩm dựa trên phân tích xác suất toán học, việc này cần có số liệu thiệt hại và tổn thất trong quá khứ cấp xã làm cơ sở. Những số liệu như vậy hiện chưa có ở Việt Nam. Do đó, bóc tách số liệu thiệt hại và tổn thất trong quá khứ (và thậm chí định kết quả thông qua quá trình tham vấn CBDRM) xuống tận cấp xã do dự án thực hiện sẽ không chỉ giúp Chính phủ lập bản đồ rủi ro mà còn giúp xây dựng sản phẩm của khu vực tư nhân.

60. Trong khi lĩnh vực hoạt động để tăng sức chống chịu vùng ven biển rõ ràng, song vẫn có một số trở ngại cần phải đề cập.

Những trở ngại chính dự án cần giải quyết

61. Để tăng sức chống chịu của các cộng đồng vùng ven biển trước đe dọa của bão và triều cường, nước biển dâng, cần giải quyết những trở ngại sau để bảo vệ ven biển bền vững và cư trú an toàn hơn.

Phối hợp không hiệu quả giữa các bộ và các chương trình qui chế phòng chống quan trọng cho khả năng chống chịu khí hậu dài hạn (Programmes Preventing Regulations Critical for Long-term Climate Resilience):

62. Trở ngại chính trong tăng cường sức chống chịu của vùng ven biển ở Việt Nam là qui hoạch không thống nhất do thiếu phối hợp. Kết quả là những đánh giá rủi ro thiên tai và khí hậu, dữ liệu về thiệt hại và tổn thất tạm thời cũng như vĩnh viễn, và giám sát, khẳng định mất đất do hiểm họa từ khí hậu đã không bắt đầu được tính vào kế hoạch của chính phủ. Trong khi hiện nay số liệu còn hạn chế thì sự phối hợp để tổng hợp số liệu hiện hành một cách hiệu quả là rất cần thiết. Ví dụ, đánh giá rủi ro từ chương trình CBDRM và bản đồ triều cường do Trung tâm quản lý thiên tai sản xuất chưa được xem xét đến trong việc qui hoạch sử dụng đất liên quan đến chương trình xây nhà của chính phủ. Hơn nữa, thông lệ tốt nhất của các dự án thí điểm qui mô nhỏ chưa được lồng ghép vào thiết kế nhà hiện nay cho khu vực ven biển để đảm bảo việc xây dựng đã phản ánh đầy đủ các rủi ro. Không có các mối liên kết này có thể dẫn đến hệ lụy (a) nhà đang xây trên các khu vực không an toàn và (b) chi phí cao hơn liên quan đến tổn thất và thiệt hại khi tính đến rủi ro lũ lụt và khí hậu đã dự báo. Không có các mối liên hệ này cũng như hạn chế về tài chính của các nguồn trong nước từ khu vực công sẽ tác động đến khả năng của CPVN tăng cường qui hoạch và cập nhật các chính sách và qui định pháp lý có liên quan hướng tới phát triển thông minh trước biến đổi khí hậu (*climate smart development*).

Những kinh nghiệm thực tế tốt nhất không được cập nhật khi xây dựng các biện pháp bảo vệ ven biển

63. Bảo vệ ven biển chỉ mới hạn chế ở các công trình bảo vệ cứng như đê biển, cần nhiều vốn đầu tư và chi phí bảo dưỡng cao, cũng như có các hậu quả lớn về mặt sinh thái làm phản tác dụng với mục tiêu đề ra. Mặc dù cần thiết ở một số vị trí chiến lược nhất định, bằng chứng cho thấy các công trình cứng xung đột với quá trình lắng đọng trầm tích tự nhiên và thường làm trầm trọng thêm xói lở bờ biển, dẫn tới mất đất và lại dễ bị thiên tai nhiều hơn. Trong quá khứ, những cơ sở hạ tầng (cứng) do con người xây dựng chắc, đáng tin cậy thường hoạt động có hiệu quả và tiết kiệm¹⁴ mặc dù trong thời gian gần đây bằng chứng cho thấy các kết quả trái ngược nhau.

64. Chính phủ Việt Nam cũng đã bắt đầu đầu tư một cách khác vào phục hồi rừng ngập mặn như một phương thức bảo vệ ven biển; tuy nhiên các nỗ lực chỉ thu được ít kết quả tốt vì bảo vệ ven biển rộng lớn và có hiệu quả, bằng các giải pháp dựa vào hệ sinh thái, chưa được nhận thức một cách đầy đủ. Trong những năm gần đây, doanh nghiệp và chính phủ đã nhận thấy tiềm năng to lớn của “cơ sở hạ tầng tự nhiên” dưới hình thức đất ngập nước và rừng, đầu nguồn và sinh cảnh ven biển thực hiện nhiều nhiệm vụ tương tự như hạ tầng cơ sở xám (nhân tạo), đôi khi còn tốt hơn và rẻ hơn nhiều¹⁵. Ví dụ, đầu tư vào bảo vệ rạn san hô và rừng ngập mặn có thể làm lá chắn vững chắc hơn để bảo vệ các hoạt động ven biển chống lại lũ lụt và triều cường trong điều kiện thời tiết cực đoan, trong khi có thể hạn chế lũ lụt trong đất liền bằng cách đầu tư chiến lược vào rừng, thảm thực vật và đầm lầy¹⁶ ở các lưu vực. Bằng chứng từ thực tế thích ứng ở vùng ven biển của Việt Nam và của khu vực tiếp tục cho thấy các giải pháp tổng hợp dựa vào dịch vụ hệ sinh thái như cây đứng trong rừng ngập mặn có thể là các phương tiện hiệu quả hơn để bảo vệ các cộng đồng khỏi những cơn bão với tần suất ngày càng tăng. Mặc dù gần đây Chính phủ đã đầu tư nỗ lực phục hồi rừng ngập mặn (và như vậy đã cố gắng thử nghiệm các giải

¹⁴ UNEP-WCMC (2006) *In the front line: shoreline protection and other ecosystem services from mangroves and coral reefs*. UNEP-WCMC, Cambridge, UK 33 pp

¹⁵ UNEP-WCMC (2006) *In the front line: shoreline protection and other ecosystem services from mangroves and coral reefs*. UNEP-WCMC, Cambridge, UK 33 pp

¹⁶ UNEP-WCMC (2006) *In the front line: shoreline protection and other ecosystem services from mangroves and coral reefs*. UNEP-WCMC, Cambridge, UK 33 pp



pháp thí điểm) thì phạm vi vẫn còn sơ khai và cần phủ trên phạm vi địa lý lớn hơn để củng cố và bảo vệ các cộng đồng nghèo và thiệt thòi sống dọc theo bờ biển.

Thông tin rủi ro khí hậu chưa đủ để huy động vốn và lập kế hoạch thích ứng phòng ngừa có hiệu quả

65. Tình trạng thiếu thông tin rủi ro khí hậu chính xác là trở ngại đáng kể trong qui hoạch/lập kế hoạch chống chịu với khí hậu và đầu tư cho thích ứng. Khả năng sẵn sàng và tiếp thu thông tin rủi ro khí hậu còn lạc hậu liên quan đến những gì cần để ra quyết định có hiệu quả. Tăng cường (a) tiếp cận đến số liệu khí tượng thủy văn có chất lượng cao để biểu thị thời tiết hiện nay, (b) các kịch bản về BĐKH, (c) số liệu thiệt hại và tổn thất trong quá khứ và dự báo, (d) năng lực kỹ thuật để đánh giá tác động dựa trên số liệu thiệt hại và tổn thất và (e) thẩm định về mặt kinh tế các phương án thích ứng rất cần thiết để thiết kế các biện pháp thích ứng bền vững, có thông tin rủi ro và hiệu quả - tiết kiệm.

66. Hiện nay, chính phủ đang gánh chịu trực tiếp hầu như tất cả rủi ro tài chính lớn liên quan đến các sự cố khí hậu cực đoan, đền bù tới mức có thể cho các nạn nhân thông qua cứu trợ thiên tai hay các dự án tái thiết. Tuy nhiên chỉ tiêu công không có sẵn sàng cho trang trải rủi ro ở địa phương¹⁷. Tác động ngày một tăng về tần suất và cường độ của BĐKH làm căng thẳng nguồn lực công hạn chế vì các bộ đều gặp khó khăn để tìm kiếm nguồn tiền từ quỹ công. Những hạn chế nêu trên về kỹ năng và số liệu, do đó, đã cản trở việc tham gia có hiệu quả của khu vực tư nhân trong chuyển giao và chia sẻ rủi ro hiểm họa khí hậu. Thiếu số liệu cấp xã liên quan đến thiệt hại và tổn thất trong quá khứ và sự dễ dãi trong giám sát và khẳng định tác động, làm cho việc định mức bảo hiểm trở nên khó khăn. Thiếu hệ thống theo dõi thời tiết toàn diện làm cho việc kích hoạt thanh toán cho bất kỳ giải pháp theo hướng thị trường nào (ví dụ như bảo hiểm) đặc biệt tốn kém. Các thiết kế của sản phẩm đầu ra ghi chi tiết hơn trong phần, C.3. mô tả dự án/chương trình.

¹⁷ GoV's recent Public Climate Expenditure and Investment Review in Viet Nam, supported by UNDP, showed that domestic climate change response related spending is mainly directed towards large-scale infrastructure projects in the sectors of irrigation and transport (UNDP, 2015).


C.3. Mô tả dự án/chương trình

67. Nhận thức được tác động của mực nước biển dâng cao, gia tăng lũ lụt và tăng tỷ lệ hiện tượng cực đoan, mục tiêu của dự án là **Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng ven biển để bị tổn thương bởi những tác động liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam**. Dự án mong muốn đáp ứng mục tiêu này thông qua việc đạt được các kết quả bổ sung sau:

- Những tính năng thiết kế chống chịu bão lụt được đưa vào 4.000 nhà mới xây tại các địa điểm an toàn, với 20.000¹⁸ người nghèo và chịu ảnh hưởng nhiều từ thiên tai trong 100 xã được hưởng lợi
- Tái sinh 4.000 ha rừng ngập mặn làm các vùng đệm chắn triều cường và sóng biển dâng thông qua việc sử dụng các phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng đã thành công
- Tăng cường khả năng của các khu vực tư nhân và công cộng tiếp cận tới những dữ liệu về mất mát, thiệt hại, khí hậu tại 28 tỉnh duyên hải của Việt Nam.

68. Mỗi kết quả của dự án đều rất quan trọng để đáp ứng mục tiêu dự án. Nếu thực hiện riêng rẽ, các kết quả sẽ ít có tác động đến tính chống chịu của các cộng đồng ven biển. Ví dụ, khôi phục rừng ngập mặn có thể hấp thụ một số tác động của bão và triều cường sóng biển dâng (xem Hình 3) song người nghèo sống trong các ngôi nhà dưới chuẩn có thể vẫn bị tổn thương. Xây dựng các ngôi nhà chống chịu được bão nhưng ở những vùng có rủi ro cao (không lồng ghép với đánh giá rủi ro) có thể vô tình đưa những người đã bị tổn thương tiếp tục chịu rủi ro. Và cải thiện hệ thống quản lý dữ liệu và thông tin sẽ cho phép quyết định, đã có thông tin rủi ro khí hậu, về các khoản đầu tư thích ứng ở các vùng ven biển có nguy cơ chịu thiên tai. Do đó, dự án GCF sẽ thúc đẩy tác động biến đổi bằng cách tạo điều kiện để CPVN giải quyết toàn diện các vấn đề trong tầm tay, đưa đến một giải pháp thích ứng có những lợi ích lâu dài đáng kể cho các cộng đồng nghèo và thiệt thòi.

Hình 3: Vai trò tiềm năng của rừng ngập mặn trong việc bảo vệ các cộng đồng ven biển¹⁹

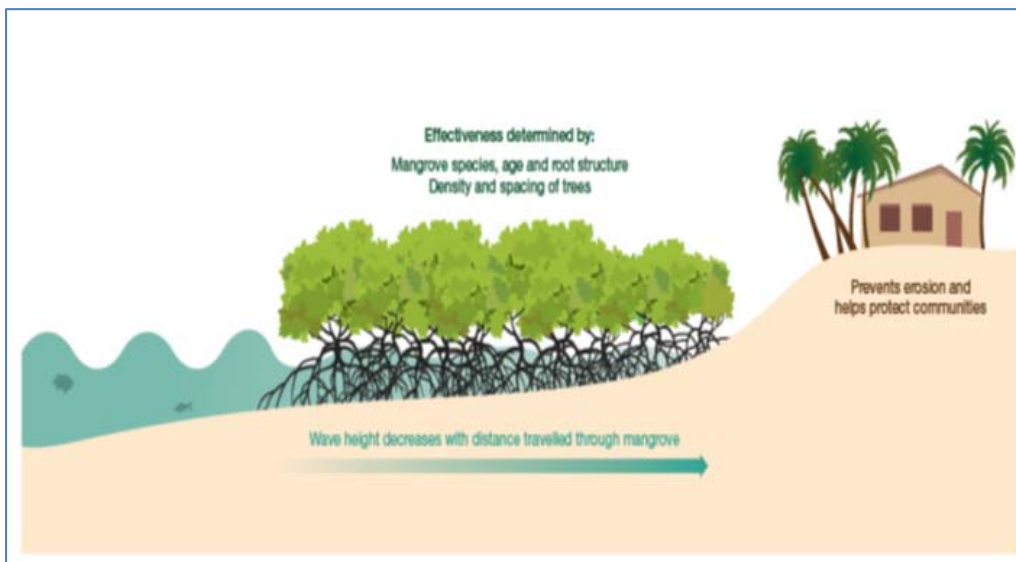

69. Kết quả của dự án kết hợp với nhau để tăng cường hợp tác liên Bộ và sự tham gia của cộng đồng. Ví dụ, hiện nay hai thách thức chính đối với rừng ngập mặn và các chương trình nhà ở là đảm bảo sự tham gia và giám sát có hiệu quả của cộng đồng. Việc liên kết những yếu tố để mở rộng quy mô dựa trên chương trình quản lý rủi ro thiên tai cộng đồng hiệu quả đã được chứng minh giúp giải quyết vấn đề này. Lập kế hoạch CBDRM, lựa chọn địa điểm xây nhà ở và khôi phục rừng ngập mặn thường thiếu dữ liệu cập nhật về nguy cơ hiểm họa, có thể được cung cấp thông qua các gói thông tin địa phương.

¹⁸ Quy mô hộ gia đình ở khu vực mục tiêu được ước tính khoảng 5 người/hộ, mặc dù báo cáo hiện nay nêu trung bình 4 người/hộ được đưa vào tính toán, những ước tính này được coi là thấp tại các khu vực nông thôn, vì các thành phố có xu hướng có kích thước hộ gia đình nhỏ hơn.

¹⁹ The Importance of Mangroves to People: A Call to Action. van Bochove, J., Sullivan, E., Nakamura, T. (Eds). United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre, Cambridge. 128 pp. 52-53 (UNEP, 2014).



70. Những lợi ích của việc kết hợp này là cốt lõi của tính bền vững và tác động biến đổi của dự án. Được củng cố bằng việc quản lý và chất lượng dữ liệu rủi ro được cải thiện và duy trì, dự án trực tiếp tạo điều kiện cho các Bộ được hưởng lợi từ các dữ liệu và các chương trình bên ngoài kho biệt lập truyền thống của họ. Khi quá trình lập kế hoạch cho dự án được trình bày, thường cán bộ kỹ thuật sẽ sẵn sàng sử dụng dữ liệu và phương pháp tiếp cận tốt hơn, nhưng họ hiếm khi có thời gian và kiến thức kỹ thuật cụ thể về làm thế nào để truy cập các dữ liệu đó. Tuy nhiên, những liên kết và các mối quan hệ giữa các Bộ sẽ là trọng tâm để thích ứng dài hạn hiệu quả hơn ở Việt Nam. Ngoài ra, tăng cường khả năng của chính quyền trung ương và cấp tỉnh để định lượng, và thậm chí ước tính tài chính liên quan đến rủi ro biến đổi khí hậu sẽ là chìa khóa để tạo điều kiện cho các quyết định thích ứng quan trọng trong tương lai, chẳng hạn như xác định địa điểm của phần mở rộng chương trình nhà ở quốc gia được dựa trên căn cứ vào dữ liệu so sánh hơn là thúc đẩy bởi các ưu tiên của nhà tài trợ hoặc ưu tiên ở cấp độ dự án. Qua thời gian, dữ liệu từ lập kế hoạch CBDRM và bài học kinh nghiệm từ dự án cũng có thể giúp cải thiện chất lượng và mục tiêu của nỗ lực thích ứng trong tương lai.

71. Dự án chọn cách tiếp cận tổng hợp có sự tham gia của các bên liên quan, làm việc với các cộng đồng để giảm nguy cơ lũ lụt, bão/lốc và triều cường ven biển qua việc cung cấp nhà an toàn và tăng cường bảo vệ rừng ngập mặn tại các cộng đồng ven biển. Ở cấp quốc gia, dự án tăng việc lồng ghép và tính hiệu quả các khoản đầu tư hiện nay của Chính phủ trong việc chống chịu, và sử dụng các dữ liệu có chất lượng cao về khí hậu để định hướng chi tiêu công vào các lĩnh vực cần nhất và tạo điều kiện cho khu vực tư nhân đầu tư vào giảm thiểu rủi ro. Để đạt được mục tiêu, dự án sẽ xem xét những khó khăn mà các cộng đồng ven biển gặp phải từ góc độ lập kế hoạch thông tin về rủi ro và khí hậu, áp dụng các thông lệ tốt nhất cho cơ sở hạ tầng chống chịu với khí hậu (đặc biệt khi có liên quan tới khu vực ven biển dễ bị tổn thương nhất), và giảm thiểu các tác động thực tế của các sự cố gây ra biến đổi khí hậu. Quan trọng hơn, thiết kế tổng thể của dự án nhấn mạnh sự tham gia của cộng đồng ven biển, vì cam kết của họ rất quan trọng để đảm bảo khả năng chống chịu dài hạn. Các kết quả đầu ra được thiết kế để thúc đẩy hợp tác và tạo ra kiến thức để tăng cường lập kế hoạch và cải thiện khả năng chống chịu, tạo ra một dòng dữ liệu và phân tích giữa các kết quả đầu ra.

72. Như đã thống nhất với Bộ Xây dựng và Bộ NN&PTNT, nhằm đảm bảo bổ sung cho các nỗ lực trước/đang và đã có kế hoạch cũng như làm nổi bật các ưu tiên của Chính phủ, bảy (07) tỉnh đã được lựa chọn để tham gia GCF. Trong một, hai năm đầu, các hoạt động sẽ tập trung ở Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế, và Quảng Ngãi nơi có nhu cầu đặc biệt khẩn thiết về cả xây nhà và phục hồi rừng ngập mặn. Trong năm thứ ba và bốn, các hoạt động sẽ được mở rộng đến Quảng Bình, Quảng Nam, Cà Mau và Nam Định. Nam Định sẽ chỉ nhận được sự ủng hộ phục hồi rừng ngập mặn. Trong khi hiện không tham gia chương trình nhà ở, Nam Định đang được xem xét cho giai đoạn tiếp theo. Các tỉnh được lựa chọn để nhận hỗ trợ nhà ở và tái sinh rừng ngập mặn được xác định là khu vực có nguy cơ cao bị ngập lụt liên quan đến mực nước biển/triều cường cực đoan cũng như mất mát từ các cơn bão/lốc.

Kết quả 1: Những tính năng thiết kế chống chịu bão lụt được đưa vào 4.000 nhà mới xây tại các địa điểm an toàn, với 20.000 người nghèo và chịu ảnh hưởng nhiều từ thiên tai trong 100 xã được hưởng lợi

73. Tại các vùng ven biển dễ bị ảnh hưởng của bão lụt, tài trợ của GCF sẽ cung cấp thêm kinh phí cho các tính năng an toàn (ước tính 2.000 đô la Mỹ/nhà) cho 4.000 nhà được xây dựng theo chương trình xây nhà rộng lớn hơn của Chính phủ cho người nghèo. Những tính năng an toàn bao gồm (a) mái dốc bê tông cốt thép có các thanh giằng và khớp nối được tăng cường (900 US\$), (b) cửa sổ, cửa ra vào được gia cố và chống thấm (400 US\$), (c) cải thiện đường thoát nước, chọn vị trí và nâng cao đế cột (400 US\$), và (d) cải thiện công tác giám sát để đảm bảo các sản phẩm hoàn chỉnh phản ánh các tính năng chống chịu của thiết kế nhà (300 US\$). Vì dự án GCF sẽ xây dựng dựa trên các chương trình nhà ở của chính phủ hiện có, thiết kế tổng thể của ngôi nhà là phù hợp với Hình 1: Thiết kế nhà chống chịu lụt bão.

74. Kết quả 1 sẽ được phối hợp đầy đủ với chương trình nhà ở của chính phủ, hỗ trợ không hoàn lại cho các đối tượng hưởng lợi sẽ theo lịch trình giám sát và giải ngân của chính phủ. Hỗ trợ tài chính của Chính phủ được cung cấp cho các đối tượng hưởng lợi theo hai đợt (70% sau khi hoàn thành phần móng và đợt hai sau khi hoàn thành khung nhà theo đúng yêu cầu thiết kế). Tại các cột mốc quan trọng này, Bộ Xây dựng, chuyên gia từ các nhóm dự án GCF và UNDP sẽ có một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng phần xây dựng. Là một phần của công tác quản lý định kỳ dự án, nhóm này sẽ tiến hành thăm hiện trường để đánh giá tiến độ dự án và cung cấp hỗ trợ phù hợp khi cần thiết để đảm bảo các mục tiêu của dự án GCF, cũng như các chương trình nhà ở chính phủ, đang đi đúng hướng và cuối cùng sẽ đạt được. Tiền hỗ trợ thêm của GCF để xây nhà sẽ được quản lý thông qua các tài khoản ngân hàng của dự án và sẽ được cung cấp trực tiếp cho các hộ gia đình sau khi hoàn thành công tác theo dõi và giám sát tương ứng.



75. Nguồn tài chính của GCF cũng sẽ hỗ trợ đánh giá rủi ro thông qua các cơ chế CBDRM được thiết lập, để đảm bảo rằng xây nhà tại vị trí an toàn. Liên kết sẽ được thực hiện để thông tin hiện có như các bản đồ triều cường do Trung tâm quản lý thiên tai xây dựng.

76. 100 xã được lựa chọn tham gia hoạt động này sẽ là đầu mối học tập để phổ biến rộng hơn sang các xã và tỉnh lân cận. Việc lựa chọn các xã và các hộ gia đình nhận hỗ trợ sẽ theo các tiêu chí hiện có của Chính phủ. Tiêu chí và tiêu chí ưu tiên sẽ được cụ thể hoá trong Phụ lục II: Nghiên cứu khả thi.

77. Nguồn lực của GCF sẽ được sử dụng cho các hoạt động đào tạo về cải tiến kỹ thuật những công nghệ xây nhà chống bão lụt, và để chuyển giao tư vấn thực hành và hướng dẫn về thiết kế và xây dựng nhà an toàn với giá cả phải chăng cho các cơ quan địa phương và các hộ gia đình chịu ảnh hưởng.

78. Một hợp phần về thiết kế nhà an toàn sẽ được bổ sung vào quá trình xây dựng kế hoạch và lập bản đồ rủi ro CBDRM hiện nay, quá trình này sẽ được triển khai rộng rãi ở tất cả các tỉnh ven biển. Các chương trình xây dựng nhà dựa trên các thông lệ tốt về thiết kế và lựa chọn địa điểm cho nhà chống chịu với khí hậu sẽ được thực hiện trên qui mô lớn hơn sẽ kích hoạt sự thay đổi lớn hơn nữa trong việc xây dựng nhà ở gia đình.

79. Lựa chọn thông tin rủi ro khí hậu về lựa chọn địa điểm an toàn để xây dựng ngôi nhà là rất quan trọng cho sự ổn định và khả năng chống chịu. Các thông tin cần thiết để thông báo lựa chọn địa điểm đã có sẵn và sẽ được nhanh chóng gộp vào gói thông tin ngay khi bắt đầu dự án, nhằm giúp nâng cao chất lượng thẩm định vị trí. Mặc dù thông tin này đã có sẵn, song hiện nay thông tin này chưa được trình bày và chia sẻ một cách phù hợp, do đó chưa được sử dụng. Ví dụ, bản đồ hiểm họa triều cường đối với bão quy mô lớn đang được chính phủ hoàn thiện cho tất cả các tỉnh ven biển, nhưng dữ liệu vẫn chưa được sử dụng ở cấp xã. Tương tự như vậy, các dữ liệu về mực nước biển dâng và biến đổi khí hậu có ở cấp trung ương, nhưng không được chia sẻ thường xuyên ở cấp địa phương, và thậm chí dữ liệu thiên tai trong quá khứ có nhưng không thống nhất và liên tục.

80. Dựa trên gói thông tin, các cộng đồng cũng sẽ xây dựng kế hoạch hành động quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng (CBDRM), sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư giảm nhẹ rủi ro dựa vào cộng đồng và đưa vào dự toán ngân sách của xã và tỉnh. Kế hoạch hoàn chỉnh của xã sẽ được UBND phê duyệt và các hoạt động cần bổ sung ngân sách sẽ được khuyến nghị để đưa vào quá trình lập ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội định kỳ hàng năm của Chính phủ. Các kế hoạch của xã được thông tin về rủi ro khí hậu sẽ khiến cho các chương trình xây dựng nhà cửa trong tương lai cũng được thông tin về rủi ro khí hậu khi ra quyết định lựa chọn địa điểm xây dựng và lựa chọn các biện pháp bảo vệ và giảm thiểu rủi ro. Những biện pháp giảm thiểu rủi ro như vậy có thể bao gồm cả gia cố đê của địa phương, nâng cấp các hệ thống kênh mương thoát nước và các biện pháp giảm thiểu quan trọng khác để chuyển khối lượng nước lũ thừa ra khỏi khu vực nhà cửa và các đơn vị hạ tầng cơ sở công cộng khác, rất quan trọng để cung cấp dịch vụ ở địa phương và phát triển xã.

81. Những biện pháp lập kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, đội ngũ giảng viên và hệ thống theo dõi đánh giá đã được xây dựng trong chương trình quốc gia CBDRM sẽ được sử dụng, áp dụng các phương pháp đã đến hơn 1.700 xã từ năm 2009 và đã được các cơ quan LHQ, Hội Chữ thập đỏ, EU, ASEAN và nhiều tổ chức khác xác định là thông lệ tốt điển hình. Điều này cũng đảm bảo rằng chi phí thực hiện sẽ giảm tới mức tối thiểu vì nguồn lực của GCF sẽ được sử dụng để bổ sung cho chương trình do Chính phủ chỉ đạo đang thực hiện.

82. Như vậy các hoạt động cho ra kết quả này gồm:

- Hoạt động 1.1. Tài trợ hỗ trợ chi phí cho bổ sung các tính năng chống chịu bão lụt cho 4.000 ngôi nhà
- Hoạt động 1.2. Qui hoạch và lập bản đồ rủi ro thiên tai và khí hậu dựa vào cộng đồng
- Hoạt động 1.3. Các sản phẩm kiến thức được xây dựng dựa trên bài học kinh nghiệm cho các nhà tạo lập chính sách và cộng đồng

83. Các hoạt động cụ thể hơn được trình bày trong mục H.1.2. Kết quả, kết quả đầu ra, hoạt động và đầu vào ở cấp chương trình/dự án.

Kết quả 2: Tái sinh 4.000 ha rừng ngập mặn ven biển làm các vùng đệm chắn triều cường và sóng biển dâng thông qua việc sử dụng các phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng đã thành công



84. Tài trợ của GCF sẽ hỗ trợ tái sinh khoảng 4.000 ha rừng ngập mặn, thuộc vùng ven biển dễ bị tổn thương bởi tác động của BĐKH. Nguồn lực của GCF sẽ tạo điều kiện nhân rộng các thông lệ tốt từ các điểm thử nghiệm khác nhau và gắn kết các phương pháp tuyển chọn tự nhiên đã thử nghiệm thành công ở hiện trường như cách tiếp cận thông lệ tốt nhất. Nguồn tài trợ bổ sung sẽ cho phép áp dụng các công nghệ cải tiến trồng và chăm sóc rừng nói trên và thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo duy trì sinh kế (như di chuyển các ao nuôi tôm của xã đến nơi sức ép vào rừng ngập mặn sẽ ít nhất và việc nuôi tôm sẽ được duy trì tốt).

85. Các địa điểm cụ thể trong tỉnh để thực hiện dự án sẽ được xác định/đánh giá qua các tiêu chí khác nhau, như (a) chịu ảnh hưởng của các sự cố BĐKH (ví dụ như bão, triều cường, nước biển dâng, ngập ven biển), (b) tiềm năng phục hồi rừng ngập mặn, và (c) bổ sung vào các hỗ trợ đang thực hiện của Chính phủ hay các đối tác làm tối ưu hoá tác động của kết hợp nguồn lực. Những nỗ lực phục hồi và tái sinh sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Trong khi các kỹ thuật được sử dụng dựa trên thông lệ tốt nhất của các nỗ lực phục hồi rừng ngập mặn trước đây, do tỉ lệ thành công thấp của các hoạt động này nên cách tiếp cận theo giai đoạn sẽ cho phép có thời gian để theo dõi và đánh giá về kỹ thuật, cũng như thành công của các biện pháp giảm thiểu rủi ro. Khi cần thiết sẽ điều chỉnh để tối ưu hoá tỉ lệ thành công.

86. Do dự án sẽ tập trung vào nhân rộng những thông lệ tốt tới qui mô chuyển đổi, việc tái sinh sẽ tập trung vào các địa bàn có khó khăn ít đến vừa phải, áp dụng trực tiếp các thông lệ tốt nhất dựa trên bằng chứng ở các địa điểm có khó khăn tương tự. Ngay khi đã chọn được địa bàn, các xã tham gia sẽ thành lập một ban cộng đồng bao gồm đại diện chính quyền địa phương và các thành phần dân cư để tiến hành quá trình đánh giá rủi ro CBDRM và lập kế hoạch sử dụng phương pháp sáu bước tương tự như nêu ra ở kết quả 1. Sẽ có thêm các buổi về lập bản đồ ven biển, tái sinh rừng ngập mặn và duy trì sinh kế. Kế hoạch CBDRM của cộng đồng do đó sẽ đưa cả các hoạt động cụ thể ở từng địa bàn để hỗ trợ thực hiện và chăm sóc rừng ngập mặn.

87. Tiếp đó dự án sẽ triển khai các hoạt động tái sinh rừng ngập mặn, bổ sung vốn cơ bản của chính phủ để hỗ trợ áp dụng các cải tiến kỹ thuật tăng tỉ lệ cây sống. Đây là quá trình do cộng đồng chỉ đạo như một phần của việc lập kế hoạch và thực hiện ở xã có sử dụng qui trình CBDRM để huy động sự tham gia của cộng đồng

88. Các hoạt động sẽ đặc biệt nhân rộng nỗ lực ở các tỉnh phía bắc và nam Việt Nam hiện đang thuộc diện ưu tiên chính để tiến hành dự án tái sinh rừng ngập mặn của Chính phủ và là những nơi thích hợp nhất cho việc tái sinh tự nhiên rừng ngập mặn. Các can thiệp sẽ hướng tới việc nhân rộng các thông lệ tốt trong việc trồng lại và phục hồi rừng ngập mặn có tính đến điều kiện của địa phương các vùng phục hồi rừng ngập mặn; thúc đẩy quản lý bền vững rừng ngập mặn thông qua quản lý dựa vào cộng đồng; hỗ trợ phát triển sinh kế cho dân địa phương các vùng trồng rừng ngập mặn; và củng cố xây dựng năng lực, nâng cao nhận thức và giám sát có sự tham gia. Tài trợ của GCF cũng được sử dụng để đào tạo bổ sung giúp các chuyên gia kỹ thuật của Chính phủ học hỏi về các cách tiếp cận sẽ được sử dụng để xem xét tiềm năng áp dụng rộng rãi hơn ở các vùng khác. Những nhóm cộng đồng được huy động thông qua chương trình CBDRM sẽ tiếp nhận đào tạo quản lý rừng ngập mặn bền vững, hỗ trợ sinh kế cộng đồng ven biển và tăng cường bảo vệ rừng trước bão lụt ven biển.

89. Các hoạt động hỗ trợ đạt được kết quả này bao gồm:

- Hoạt động 2.1. Tái sinh hay trồng lại 4.000 ha rừng ngập mặn vùng ven biển dễ bị tổn thương bởi BĐKH
- Hoạt động 2.2. Chương trình dựa vào cộng đồng phục hồi, chăm sóc và theo dõi rừng ngập mặn đối với các cộng đồng tham gia dự án
- Hoạt động 2.3. Các sản phẩm kiến thức được xây dựng dựa trên bài học kinh nghiệm cho các nhà tạo lập chính sách và cộng đồng

90. Các hoạt động cụ thể hơn được trình bày trong mục H.1.2 Kết quả, kết quả đầu ra, hoạt động và đầu vào ở cấp chương trình/dự án.

Kết quả 3: Tăng cường khả năng của các khu vực tư nhân và công cộng tiếp cận tới những dữ liệu về mất mát, thiệt hại, khí hậu tại 28 tỉnh duyên hải của Việt Nam.

91. Bộ NN&PTNT với sự giúp đỡ của UNDP đã xây dựng cơ sở dữ liệu đầu tiên về thiệt hại, mất mát do thiên tai gây ra, thiết kế hệ thống cảnh báo sớm và năng lực phục vụ khí tượng thủy văn được tăng cường. Bộ TNMT với sự giúp đỡ của UNDP đã được tăng cường dữ liệu và phân tích về BĐKH và hoàn thiện Báo cáo đặc biệt về các sự kiện cực đoan trình



lên IPCC năm 2014. Chính phủ vừa xây dựng những bản đồ sóng biển dâng và triều cường lần thứ nhất nhằm cải tiến bản đồ ngập lụt ven biển.

92. Dựa trên các công việc đã làm này, tài trợ của GCF sẽ được Bộ NN&PTNT và Bộ TNMT nâng cấp thông tin để các nhà ra quyết định của Chính phủ, nhất là ở cấp tỉnh, các chương trình quốc gia đang thực hiện và khu vực tư nhân tiếp cận dễ dàng hơn. Việc này được thực hiện thông qua xây dựng bản đồ rủi ro tổng hợp ở cấp tỉnh, sử dụng các phương pháp đã xây dựng mà Việt Nam đã áp dụng để sản xuất bản đồ ở 20 trong số 63 tỉnh thành. Với tài trợ của GCF, Việt Nam có khả năng sản xuất, lập bản đồ rủi ro của toàn vùng duyên hải, kết hợp kiến thức của địa phương với các dữ liệu khoa học tốt nhất. Đây có thể là biến đổi mang tính chuyển đổi về khả năng của Việt Nam trong việc phân tích và so sánh rủi ro BĐKH vùng duyên hải.

93. Chất lượng dữ liệu cũng được cải thiện nhờ đưa các dữ liệu về siêu bão và triều cường và sóng biển dâng dựa trên mô hình 2014-2015 và dự đoán mực nước biển dâng một cách chính xác hơn trong báo cáo đánh giá của IPCC lần thứ năm. Phân tích bổ sung khu vực ngập mặn sử dụng công nghệ vệ tinh mới cũng được đưa vào. Mặc dù dữ liệu này đã được xây dựng, hay gần hoàn thiện song hiện nay vẫn chưa được Chính phủ ở bất kỳ cấp nào áp dụng một cách có hệ thống.

94. Nhằm giúp hỗ trợ phân tích tài chính khả năng thiệt hại và mất mát liên quan đến khí hậu, dữ liệu mất mát và thiệt hại hiện có sẽ được nâng cấp. Mô hình rủi ro kinh tế-xã hội dựa vào GIS để đánh giá thiệt hại và mất mát sẽ được xây dựng và sử dụng ở tất cả các cấp cơ quan Chính phủ. Việc này giúp tổng hợp dữ liệu kinh tế-xã hội và rủi ro khí hậu thành các chỉ số và bản đồ có thể truy cập được để hướng dẫn lập kế hoạch và quyết định đầu tư. Những công cụ này sẽ giúp tạo ra kết nối giữa dữ liệu khí hậu và chi tiêu vốn/đầu tư ở cấp tỉnh hay quốc gia.

95. Nguồn lực GCF sẽ tạo điều kiện để các sản phẩm cụ thể được thiết kế hỗ trợ trực tiếp công cuộc phát triển trong chu kỳ kế hoạch năm năm tiếp theo của Việt Nam (2020-2025) song cũng sẽ đưa các thông tin bổ sung về xu hướng BĐKH dài hạn đến 2050. Liên quan đến việc này, kỹ năng và phương pháp phân tích chi phí và lợi ích của một loạt các lựa chọn thích ứng và giảm thiểu rủi ro sẽ được giới thiệu tới các cơ quan Chính phủ quan trọng ở tất cả các cấp. Một phiên bản dựa vào trang mạng về rủi ro BĐKH sẽ giúp công chúng tiếp cận với thông tin rủi ro. Kết quả ròng sẽ có bộ dữ liệu chính xác hơn nhiều và cải tiến quản lý về tất cả các rủi ro và thảm họa chính liên quan đến biến đổi khí hậu cho cả vùng ven biển của Việt Nam.

96. Các hoạt động hỗ trợ đạt được kết quả này bao gồm:

- Hoạt động 3.1 – Cập nhật dữ liệu thiên tai và xây dựng kho dữ liệu rủi ro với cơ chế được xây dựng theo hướng chia sẻ/phổ biến thông tin
- Hoạt động 3.2 – Hỗ trợ chính sách cho cán bộ của các bộ chuyên ngành/kế hoạch ở cấp Trung ương và cấp tỉnh để áp dụng thông tin tổn thất/thiên tai cho việc lập kế hoạch chống chịu
- Hoạt động 3.3 – Phân tích cơ chế chuyển giao rủi ro cho bảo hiểm, kể cả đối với các trường hợp thiên tai liên quan đến khí hậu vùng ven biển trên qui mô lớn (mất mát hơn 3% GDP).

97. Các hoạt động cụ thể hơn được trình bày trong mục H.1.2 Kết quả, kết quả đầu ra, hoạt động và đầu vào ở cấp chương trình/dự án.

C.4. Thông tin cơ bản về cơ quan chủ quản của chương trình/dự án

98. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) là cơ quan chủ quản của dự án (tức là bộ điều hành dự án hay bộ chuyên ngành phù hợp với Hướng dẫn quản lý dự án và chương trình hài hoà hoá (HPPMG), được ký giữa Chính phủ Việt Nam và hệ thống LHQ tại Việt Nam.

99. Bộ NN&PTNT là cơ quan của Chính phủ chịu trách nhiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, sản xuất muối, thủy sản, dịch vụ nước/tưới tiêu và phát triển nông thôn trên toàn quốc, kể cả các chức năng quản lý nhà nước liên quan tới cung cấp dịch vụ công phù hợp với các văn kiện pháp lý. Bộ NN&PTNT thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình và có thẩm quyền theo Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 do Chính phủ ban hành.



100. Theo Hướng dẫn của UNDP về phương thức quốc gia thực hiện (NIM), cơ quan chủ quản hoặc Đối tác thực hiện/Cơ quan điều hành (thuật ngữ của UNDP)/ Cơ quan điều hành (thuật ngữ của GCF) là cơ quan chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm giải trình về quản lý dự án, bao gồm cả việc giám sát và đánh giá hoạt động của dự án, đạt kết quả đầu ra của dự án, và cho việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực của UNDP. Chỉ một Đối tác thực hiện/Cơ quan điều hành được chỉ định để quản lý từng dự án do UNDP hỗ trợ. Các thực thể thực hiện Đối tác / Thực hiện có thể nhập vào các thỏa thuận với tổ chức, đơn vị khác để hỗ trợ trong việc cung cấp thành công kết quả đầu ra của dự án.

101. Dưới Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thủy lợi (TCTL) được giao là Đối tác thực hiện quốc gia theo HPPMG. TCTL có trách nhiệm trực tiếp thực hiện các chương trình quốc gia quan trọng như chương trình CBDRM và các dự án lập bản đồ ngập lụt, triều cường, và sóng biển dâng cho tất cả các tỉnh duyên hải mà dự án GCF sẽ bổ sung. TCTL đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, Bộ TNMT, Bộ xây dựng và Bộ KHĐT kể cả ở cấp xã. Thông qua TCTL, Bộ NN&PTNT cũng sẽ tận dụng quan hệ đối tác hiện có với các đối tác phát triển (như GIZ, JICA, Ngân hàng Thế giới, ADB, v.v...), các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ quốc tế, và khu vực tư nhân để huy động và xúc tác các nguồn lực, tối ưu hoá tác động của các nguồn lực được kết hợp. Ở tầm quốc gia, TCTL cũng phục vụ như Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai (BCĐQGPKTT), một tổ chức điều phối liên bộ có khả năng lớn trong việc huy động liên ngành, các bộ chuyên ngành và các tỉnh.

102. UNDP cung cấp các nguồn lực tài chính cần thiết để Đối tác thực hiện/Cơ quan điều hành để thực hiện các hoạt động dự án trong chu kỳ hàng năm. Những thỏa thuận này sẽ được ghi rõ trong kế hoạch công tác hàng năm. Theo cách tiếp cận hài hoà để chuyển tiền (ACT), ba phương thức chuyển tiền mặt có sẵn: chuyển tiền mặt trực tiếp, thanh toán trực tiếp và hoàn trả. Thông tin bổ sung về quản lý tài chính được nêu trong phần F.4. của đề xuất này.

103. Sự tham gia của Bộ Xây dựng, là một Bên có trách nhiệm, sẽ được chính thức hoá thông qua một Thư thỏa thuận (LoA). Một Bên có trách nhiệm được xác định là một cơ quan được lựa chọn để hoạt động thay mặt cho Đối tác thực hiện/Cơ quan điều hành trên cơ sở văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng mua hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ sử dụng ngân sách dự án. Ngoài ra, Bên có trách nhiệm có thể sử dụng các hàng hóa và dịch vụ để thực hiện các hoạt động dự án và tạo kết quả đầu ra. Tất cả các Bên có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm giải trình trực tiếp trước Đối tác thực hiện/Cơ quan điều hành theo các điều khoản của thỏa thuận hoặc hợp đồng của họ với Đối tác thực hiện/Cơ quan điều hành. Đối tác thực hiện/Cơ quan điều hành sử dụng Bên Chịu trách nhiệm để tận dụng lợi thế kỹ năng chuyên môn của họ, để giảm thiểu rủi ro và để giảm bớt gánh nặng hành chính.

C.5. Tổng quan thị trường (nếu có)

104. Do Kết quả 3 có mục tạo ra các sản phẩm thông tin rủi ro khí hậu cho khu vực tư nhân và bảo hiểm, tóm tắt tiềm năng cho các sản phẩm này được trình bày dưới đây.

105. Hơn 30 triệu người sống ở các tỉnh ven biển Việt Nam chịu rủi ro bão lụt ngày càng tăng. Tỷ lệ phát triển GDP của các khu vực này bình quân hơn 5% hàng năm trong những năm gần đây, do đó có nhu cầu lớn từ các cơ quan có thẩm quyền của các tỉnh nhằm đảm bảo rằng nhà cửa và các công trình công cộng chống chịu được khí hậu và duy trì rừng ngập mặn tự nhiên làm vùng đệm chống rủi ro triều cường sóng biển dâng. Việt Nam cần có qui hoạch tổng thể và quản lý quốc phòng tổng hợp ven biển tốt hơn để bảo vệ lợi ích phát triển tránh các tác động có liên quan đến biến đổi khí hậu. Cơ sở dữ liệu thiên tai trong quá khứ cấp xã và số liệu về mất mát, thiệt hại đã cải thiện được yêu cầu để nâng cao chất lượng lập kế hoạch công và mô hình hoá rủi ro tài chính.

106. Để có số liệu đã cải thiện, các cộng đồng cần được tiếp cận với những công nghệ xây dựng nhà cửa chống chịu hiện có song chưa được phổ biến rộng rãi hay áp dụng ở cấp xã.

107. Tầng lớp trung lưu mới nổi của Việt Nam và bước phát triển nhanh tạo nên tiềm năng lớn chưa được khai thác cho lĩnh vực bảo hiểm, miễn là các sản phẩm có thể được định giá hợp lý, phù hợp với nhu cầu của khách hàng, và có hệ thống chính sách và các biện pháp bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Theo báo cáo thị trường bảo hiểm hàng năm của Bộ Tài chính, trong giai đoạn từ 2005 đến 2012, nguồn thu từ kinh doanh bảo hiểm tăng trung bình hàng năm 13-15% một năm, với tổng số khoảng 2 tỉ đô la Mỹ vào cuối năm 2012. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 20% của thị trường này là bảo hiểm nhà cửa và tài sản, ít hơn 1% so với bảo hiểm sản phẩm nông nghiệp.



108. Cán bộ của Chính phủ đã yêu cầu được phát triển các kỹ năng kỹ thuật về chuyển giao rủi ro và tính toán thiệt hại và mất mát để họ có thể áp dụng tốt hơn các thông số lập kế hoạch tài chính trong công tác lập kế hoạch cấp tỉnh và quốc gia của họ. Dự kiến dự án do GCF tài trợ sẽ đặt nền móng để phát triển và mở ra các hình thức dịch vụ tài chính như vậy. Nếu không có các can thiệp tháo dỡ những trở ngại này, Việt Nam sẽ không thể khai thác được tiềm năng các dịch vụ tài chính này.

C.6. Qui định, thuế và bảo hiểm

Giấy phép xây dựng, sử dụng đất và trồng rừng

109. Đất thổ cư ở Việt Nam được thuê từ Chính phủ. Những phương pháp hiện tại được sử dụng để kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng đất trong chương trình xây nhà ở đang thực hiện của Chính phủ đối với các địa điểm tiến hành các hoạt động được GCF hỗ trợ. Tương tự, rừng ngập mặn là tài sản của Chính phủ; những địa điểm được lựa chọn cho hoạt động tái sinh rừng ngập mặn sẽ phản ánh chính sách và khu vực ưu tiên của Chính phủ.

Quản lý thuế trong các dự án do UN hỗ trợ ở Việt Nam

Các điều khoản chung

110. Mua sắm cho các dự án do UN hỗ trợ được hoàn thuế VAT. Về nguyên tắc, VAT được trả từ nguồn vốn đối ứng. Trong trường hợp nguồn vốn đối ứng đó chưa có sẵn, Ban quản lý dự án trả VAT cho các nhà cung cấp từ tiền mặt được UNCO chuyển vào và số tiền VAT sẽ được hoàn trả vào ngân sách dự án.

Kế toán VAT

111. VAT sẽ được kế toán trong một tài khoản riêng. VAT của quý bốn hàng năm được kế toán cho năm tiếp theo.

Hoàn VAT

- Trên cơ sở hàng quý, Giám đốc dự án chịu trách nhiệm duyệt các khoản kê khai hoàn thuế VAT của mỗi quý, theo các qui định hiện hành của Nhà nước. Nếu dự án hoàn thành mọi thủ tục hoàn thuế mà VAT vẫn chưa được hoàn trả vào thời điểm tiến hành kiểm toán thì UNCO sẽ không khấu trừ giá trị VAT từ số tiền mặt sẽ được chuyển cho các hoạt động của dự án vào quý tiếp theo.
- Tiền hoàn thuế VAT được giữ trong tài khoản ngân hàng của dự án.

112. Thời gian hoàn thuế, quy trình và các tài liệu hỗ trợ cho việc kê khai hoàn thuế VAT và cơ quan thuế chịu trách nhiệm về hoàn thuế VAT được nêu cụ thể trong Sổ tay Kế toán Dự án.

Các chính sách về quy đổi ngoại tệ và bảo hiểm

113. Chính sách bảo hiểm rủi ro tiền tệ của UNDP dựa trên việc sử dụng các hàng rào bảo vệ tự nhiên đến mức có thể (phù hợp với dòng chảy tiền mặt (ví dụ: doanh thu và chi phí) bằng ngoại tệ phi USD). Sổ dự tài khoản ngân hàng của Văn phòng UNDP được quản lý để không vượt quá các yêu cầu giải ngân trong một tháng để giảm thiểu rủi ro.

114. Chính phủ Việt Nam đã ký Hiệp định hỗ trợ cơ bản tiêu chuẩn (SBAA) với UNDP năm 1978. Phù hợp với Điều III của SBAA, trách nhiệm đảm bảo an toàn và an ninh của Đối tác thực hiện/Cơ quan điều hành cũng như nhân viên và tài sản của các cơ quan này, và tài sản của UNDP trong các Đối tác thực hiện/Cơ quan điều hành thuộc về các Đối tác thực hiện/Cơ quan điều hành.

C.7. Tổ chức/phương thức thực hiện

115. Dự án sẽ được thực hiện theo phương thức quốc gia thực hiện của UNDP (NIM), theo Hợp đồng hỗ trợ cơ bản tiêu chuẩn giữa UNDP và Chính phủ Việt Nam, Kế hoạch chung của Một LHQ (2012-2016), và các chính sách và thủ tục được nêu trong UNDP POPP (xem <https://info.undp.org/global/popp/ppm/Pages/Defining-a-Project.aspx>).


116. Cần có một cơ quan điều hành quốc gia - cũng được gọi là “Đối tác thực hiện/Cơ quan điều hành” quốc gia trong thuật ngữ của UNDP - để thực hiện các dự án phù hợp với các quy định, chính sách, thủ tục của UNDP, và cả hướng

dẫn NIM. Ở đây bao gồm các yêu cầu liên quan đến ủy thác, mua sắm, biện pháp bảo đảm an toàn môi trường và xã hội, và các tiêu chuẩn hoạt động khác. Về mặt pháp lý, điều này được đảm bảo thông qua chữ ký của chính phủ quốc gia trong Hợp đồng hỗ trợ cơ bản tiêu chuẩn của UNDP (SBAA), cùng với văn kiện dự án của UNDP sẽ được ký kết bởi Đối tác thực hiện/Cơ quan điều hành để quản lý sử dụng tiền hỗ trợ. SBAA đã được ký kết với Chính phủ Việt Nam năm 1978.

117. **Đối tác thực hiện/Cơ quan điều hành quốc gia** của dự án này là Tổng cục Thủy lợi (TCTL) thuộc Bộ NN&PTNT (Bộ chuyên ngành). TCTL chịu trách nhiệm giải trình trước UNDP về quản lý dự án, bao gồm giám sát, đánh giá hoạt động của dự án, đảm bảo đạt được kết quả đầu ra của dự án, và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của UNDP.

118. Các đối tác sau đây sẽ ký thoả thuận với TCTL về việc hỗ trợ chuyển giao các kết quả đầu ra của dự án và chịu trách nhiệm giải trình trực tiếp với TCTL theo các điều khoản thoả thuận giữa các bên: Bộ Xây dựng, Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN), và UBND bảy tỉnh (Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Nam, Nam Định và Cà Mau).

Hình 3: Sơ đồ bố trí quản lý dự án đề xuất

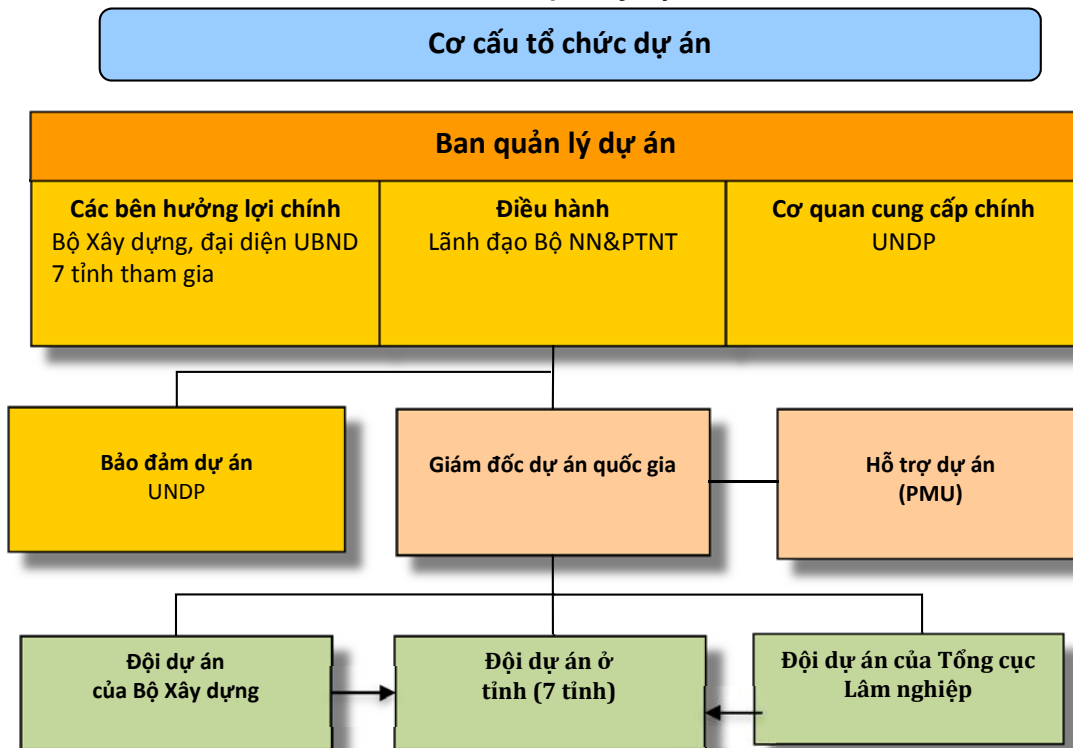

119. **Vai trò tổng thể của UNDP** - tổ chức được công nhận - là cung cấp giám sát và đảm bảo chất lượng, thông qua trụ sở chính ở New York và các đơn vị thuộc văn phòng tại Việt Nam. Vai trò này bao gồm: (i) giám sát việc chuẩn bị dự án; (ii) giám sát và quản lý thực hiện dự án, bao gồm cả quản lý tài chính; và (iii) và giám sát việc kết thúc và đánh giá dự án. Ở đây cũng bao gồm vai trò giám sát liên quan đến báo cáo và quản lý tri thức. Các chức năng “**đảm bảo dự án**” của UNDP nhằm hỗ trợ Ban quản lý dự án thực hiện các chức năng giám sát và theo dõi dự án một cách khách quan và độc lập. Vai trò này đảm bảo các mốc quản lý dự án được giám sát và hoàn thành. Đảm bảo dự án phải được độc lập với người quản đốc dự án; Vì vậy, Ban quản lý dự án không thể ủy thác bất kỳ trách nhiệm bảo đảm của mình cho người quản đốc dự án. Theo thông lệ, một cán bộ chương trình UNDP, hoặc một cán bộ Giám sát & Đánh giá sẽ thay mặt UNDP đảm trách vai trò Đảm bảo Dự án. Ở vai trò “nhà cung cấp bậc cao”, UNDP đảm trách vai trò đại diện cho các mối quan tâm của các bên tài trợ kinh phí hoặc hỗ trợ kỹ thuật/chuyên gia cho dự án (như thiết kế, phát triển, điều phối, đấu thầu, triển khai). Chức năng chính của nhà cung cấp là hướng dẫn về tính khả thi kỹ thuật của dự án. Vai trò cơ quan cung cấp chính phải có thẩm quyền để thực hiện hoặc có được nguồn cung cấp theo yêu cầu. Nếu cần thiết,



nhiều hơn một người có thể được yêu cầu cho vai trò này. Thông thường, Đối tác thực hiện/Cơ quan điều hành, UNDP và/hoặc các nhà tài trợ (s) sẽ giữ vai trò này.

120. **Ban quản lý dự án** bao gồm các tổ chức sau: Bộ NN&PTNT, Bộ xây dựng, UNDP Việt Nam, và UBND bảy tỉnh (Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Nam, Nam Định và Cà Mau). Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định quản lý theo biểu quyết khi Giám đốc dự án quốc gia (NPD) yêu cầu có sự chỉ đạo. Ban quản lý dự án sẽ đưa các quyết định phù hợp với tiêu chuẩn để đảm bảo quản lý kết quả phát triển, cạnh tranh quốc tế với giá trị tiền tốt nhất, công bằng, liêm khiết, minh bạch và hiệu quả. Trong trường hợp không đạt được sự đồng thuận trong Ban quản lý dự án, quyết định cuối cùng sẽ do Giám đốc quốc gia chương trình UNDP đưa ra. Ban quản lý dự án sẽ họp sáu tháng một lần.

121. **Giám đốc dự án quốc gia (NPD)** thay mặt TCTL điều hành dự án hàng ngày trên cơ sở các tiêu chí do Ban quản lý Dự án đưa ra. NPD sẽ chấm dứt nhiệm vụ khi báo cáo đánh giá kết thúc cuối cùng của dự án và các tài liệu khác do GCF và UNDP yêu cầu được hoàn thành nộp cho UNDP. NPD chịu trách nhiệm quản lý hàng ngày và ra các quyết định cho dự án. Trách nhiệm chính của NPD là đảm bảo dự án tạo ra các kết quả được nêu rõ trong văn kiện dự án, đạt tiêu chuẩn chất lượng đề ra và trong khuôn khổ thời gian và kinh phí cụ thể.

122. Theo các qui định về ODA của Việt Nam và HPPMG, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT sẽ giao thẩm quyền cho Bộ Xây dựng và UBND bảy tỉnh tham gia giữ vai trò và trách nhiệm của Bộ chuyên ngành (bộ điều hành) về những kết quả đầu ra/hoạt động được giao cho bộ và các tỉnh.

123. Thay mặt Bộ NN&PTNT, TCTL sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng và UBND bảy tỉnh để lập kế hoạch, quản lý, thực hiện và giám sát & đánh giá dự án dựa trên các thoả thuận đã ký. Mẫu chuẩn thoả thuận và phương thức hợp tác được nêu trong HPPMG.

C.8. Bảng phân bổ thời gian thực hiện chương trình/dự án

XEM PHỤ LỤC X

D.1. Giá trị gia tăng khi GCF tham gia

124. Chính phủ Việt Nam đầu tư tương đối cho giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Thiên tai liên quan đến khí hậu ở Việt Nam gây ra tổn thất hàng năm trung bình 1.8 tỉ US\$ hay 1,5% GDP (UNDP, 2014). Để ứng phó, chính phủ đã phân bổ ngân sách thông qua các chương trình mục tiêu của chính phủ nhằm giảm thiểu tổn thất và bảo vệ người dân cũng như tài sản kinh tế. CPEIR hiện nay cho rằng 18% tổng chi tiêu của năm bộ chủ chốt của chính phủ có thể gắn liền với các lợi ích thích ứng với khí hậu.

125. Mặc dù được đầu tư như vậy, kết quả thực hiện các chương trình của chính phủ thường dưới mức tối ưu, không kết nối và phân tán về mặt địa lý. Bảng dưới đây tóm tắt những điểm mạnh của các chương trình của chính phủ đang thực hiện và các lĩnh vực nơi hỗ trợ của GCF sẽ cung cấp giá trị cần thiết.

Bảng 1: Hiệp lực những tác động có thể mạnh của chương trình hiện hành

	Thế mạnh của hỗ trợ chính phủ hiện nay	Giá trị gia tăng của GCF
Phục hồi rừng ngập mặn	Kinh nghiệm của Bộ NN & PTNT trong việc phục hồi rừng ngập mặn, và cam kết mạnh mẽ của chính phủ để mở rộng quy mô chương trình hiện hành, sử dụng phương pháp tiếp cận bằng chứng hỗ trợ để nâng tỷ lệ sống của rừng ngập mặn.	Can thiệp từ GCF sẽ nhân rộng các thông lệ tốt từ những chương trình thí điểm khác nhau và lồng ghép các phương pháp thành công về tuyển chọn tự nhiên như cách tiếp cận thông lệ tốt nhất để tái sinh 4.000ha rừng ngập mặn. Tài trợ sẽ cho phép áp dụng các công nghệ tái sinh và chăm sóc đã cải thiện như đề cập ở những phần trên, và thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhằm đảm bảo giải quyết tình trạng sinh kế gián đoạn tạm thời (ví dụ di dời các ao nuôi tôm của cộng đồng bị tác động của việc trồng rừng, là một phần của kế hoạch tái sinh rừng). Những cách tiếp cận đã cải thiện sẽ bao gồm các hoạt động hỗ trợ nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng, thông qua chương trình CBDRM, ở mọi giai đoạn của quá trình tái sinh rừng ngập mặn (ví dụ, vườn ươm, trồng, theo dõi) và hỗ trợ cộng đồng khi cần thiết nhằm đảm bảo sinh kế không bị tác động tiêu cực bởi các hoạt động của dự án. Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cũng sẽ được cung cấp giúp Bộ NN&PTNT nâng cấp các hướng dẫn kỹ thuật và chính sách để lồng ghép các cách tiếp cận của GCF đã được chứng tỏ đạt tiêu chuẩn vào các kế hoạch và chương trình tái sinh trong tương lai.
Các chương trình xây nhà ở của Chính phủ	Chuyên môn kỹ thuật mạnh của Bộ Xây dựng trong thiết kế và xây dựng nhà ở, kinh nghiệm trong triển khai các dự án quy mô lớn, và hoạt động mô hình tài chính để hỗ trợ các hộ gia đình dễ bị tổn thương.	Can thiệp từ GCF được đề xuất sẽ kết hợp phương pháp CBDRM được phê duyệt để lập bản đồ rủi ro cấp cộng đồng với áp dụng các thiết kế xây dựng đã cải tiến của Bộ Xây dựng + các tính năng chống chịu với khí hậu nhằm tăng hiệu quả và mở rộng kế hoạch xây nhà an toàn cho các vùng ven biển dễ bị tổn thương nhất. Kết nối quan trọng này sẽ đảm bảo nhà ở, tài sản duy nhất của người nghèo được xây trên vị trí an toàn và có thể chống chịu, không chỉ với các tác động BĐKH hiện nay mà còn với cường độ dự báo còn tăng trong những năm tiếp theo.
Quản lý rủi ro thiên tai/thích ứng dựa vào cộng đồng	Cơ cấu tổ chức có sự tham gia, hoà nhập và có trách nhiệm, có thể làm việc với các cộng đồng và có sở hữu lâu dài, vững chắc Cộng đồng cũng là nơi tạo ra các số liệu thiệt hại và tổn thất có giá trị cũng như các tác động BĐKH khác. Chương trình bao gồm cơ chế xây dựng kế hoạch thích ứng dựa vào cộng đồng và đưa cả những nhu cầu hỗ trợ vào kế hoạch thường kỳ.	Hỗ trợ của GCF sẽ đảm bảo tập huấn cho các bên liên quan ở 28 tỉnh ven biển về thiết kế nhà tang cường chống chịu với khí hậu có thể (a) giải quyết mối rủi ro ngày càng tăng đi kèm với dự báo BĐKH và các sự cố cực đoan, và (b) sử dụng các số liệu rủi ro cũng như kiến thức của cộng đồng đã nâng cao để đảm bảo vị trí lựa chọn an toàn. Ở cấp quốc gia, hỗ trợ của GCF sẽ nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật và khuôn khổ pháp lý cho các chương trình nhà ở chống chịu thiên tai của chính phủ trong tương lai.
Thông tin rủi ro khí hậu	Chính phủ đã chủ động làm việc với các tổ chức quốc tế và trong nước nhằm thúc đẩy củng cố số liệu để dự báo BĐKH và các rủi ro chính như siêu bão và triều cường.	Hỗ trợ của GCF sẽ xây dựng trên cơ sở những nỗ lực trước kia và hiện tại để thu thập và ghi lại dữ liệu về tổn thất và thiên tai, và xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật của chính phủ với các kỹ năng cần thiết để phân tích dữ liệu cũng như đào tạo các nhà làm chính sách áp dụng các phân tích đó vào qui hoạch/quá trình lập kế hoạch. Nhìn chung, các hoạt động được thiết kế để góp phần chuyển đổi cách tiếp cận hiện nay của chính phủ Việt Nam sang hỗ trợ và tạo điều kiện thích ứng. Kinh phí từ GCF sẽ giúp chính phủ theo đuổi chiến lược dài hạn kết hợp các cách tiếp cận giảm nhẹ rủi ro hiện hành với cách tiếp cận quản lý rủi ro xác suất BĐKH được nâng cao nhằm bảo vệ thành quả của phát triển. Nhằm đảm bảo số liệu được cung cấp theo hình thức và phương tiện có ích cho khu vực tư nhân, và để nâng cao hiểu biết của chính phủ về cách thức làm thế nào tạo ra động lực đối với sản phẩm quản lý rủi ro trong tương lai, dự án sẽ hỗ trợ đối thoại giữa khu vực tư nhân và các đối tượng có liên quan của chính phủ ở trung ương và tỉnh. Việc này bao gồm đối thoại về kỹ thuật với khu vực tư nhân về cải thiện các ứng dụng và tiếp cận số liệu thiệt hại và tổn thất, và hiểm hoạ. Dự án cũng sẽ hỗ trợ tham vấn rộng rãi với các doanh nghiệp về những trở ngại

hiện nay và các giải pháp để tăng sự tham gia chia sẻ và chuyển rủi ro của khu vực tư nhân trong việc quản lý khí hậu ở Việt Nam.

126. Việc tham gia của GCF rất quan trọng ở hai khía cạnh: (i) dự báo BĐKH cho thấy mối đe dọa vùng ven biển có lẽ đang gia tăng ở Việt Nam. Lũ lụt, triều cường và bão có thể sẽ ngày càng tăng về cả tần suất và cường độ. Do đó cần thiết phải đầu tư thêm để có thông tin rủi ro khí hậu thông báo cho và cải thiện các chương trình xây nhà an toàn và bảo vệ ven biển hiện có của chính phủ; (ii) các mối đe dọa liên quan đến khí hậu cũng yêu cầu có thêm tài chính cho hạng mục khí hậu để tăng qui mô đầu tư giảm nhẹ rủi ro khí hậu cho vùng định cư ven biển (người và tài sản chính của họ - ngôi nhà) cũng như cải thiện các phương pháp và áp dụng các thông lệ tốt nhất, sự tham gia của GCF sẽ nâng cao đáng kể các chương trình hiện nay của chính phủ bằng cách cung cấp thông tin rủi ro khí hậu, thực hiện các thông lệ tốt nhất và nhân rộng thành quả của các dự án thí điểm thành công cũng như các kinh nghiệm tốt trên thế giới. Kết quả của việc đầu tư trong đề xuất này sẽ tạo chuyển biến. Cụ thể hơn, giá trị gia tăng của tài trợ GCF sẽ được nói rõ dưới đây theo từng kết quả đầu ra.

Kết quả 1: Những tính năng thiết kế chống chịu với bão lụt được bổ sung cho 4.000 nhà mới ở địa điểm an toàn, mang lại lợi ích cho 20,000²⁰ người nghèo và bị ảnh hưởng cao của thiên tai trong 100 xã.

127. Các chương trình xây nhà hiện nay của chính phủ ưu tiên an ninh và an toàn cho bộ phận nghèo nhất của xã hội, đặc biệt là những người sống ở các vùng dễ bị ảnh hưởng nhất ở ven biển. Tuy nhiên, phương pháp chọn địa điểm và thiết kế nhà chưa được xây dựng tốt, thiếu tính chặt chẽ về kỹ thuật để chịu được các mối đe dọa gia tăng ở khu vực ven biển. Trong khi các thiết kế được nâng cao đã có và được thử nghiệm, Bộ Xây dựng lại không có khả năng áp dụng những thiết kế được cải tiến đó do thiếu kinh phí. Tài trợ của GCF sẽ chi trả khoản chi phí tăng thêm do đưa thêm vào các tính năng an toàn dựa trên những bài học từ thiết kế chương trình xây nhà trước đây, cũng như các thiết kế thành công ở Đà Nẵng (như gác lửng trên mực lũ dự báo, cũng như gia cố tường và mái bê tông) ước tính \$2000/nhà. Sự tham gia của GCF cũng sẽ kết nối chương trình xây nhà với cách tiếp cận dựa vào cộng đồng để đánh giá rủi ro nhằm thông báo địa điểm an toàn đối với việc xây nhà mới. Sự tham gia của cộng đồng rất quan trọng đối với thay đổi hành vi và chấp nhận lâu dài các phương pháp và tiêu chuẩn xây dựng để ổn định và an toàn hơn. Tài trợ của GCF như vậy sẽ tạo thuận lợi để công bố lần đầu và phổ biến số liệu về khả năng được cứu sống/ sống sót của nạn nhân ở những vùng hay xảy ra triều cường, nước biển dâng và lũ lụt đến cộng đồng.

128. Việc cải thiện mối liên kết giữa số liệu cấp quốc gia và cấp xã là điều quan trọng trong việc ra quyết định sử dụng đất và giảm khả năng tiếp xúc của tài sản với tác động BĐKH vì Việt Nam đang tiếp tục phát triển nhanh. Thông qua việc đưa CBDRM thông minh trước khí hậu ở toàn vùng ven biển (phủ tất cả 28 tỉnh và 500 xã), hỗ trợ của GCF sẽ giúp so sánh thông tin rủi ro trong toàn vùng bờ biển, xác định ba chiều số liệu trung ương và địa phương về mặt không gian để cung cấp các thông tin rủi ro quan trọng cho việc qui hoạch/lập kế hoạch và ra quyết định. Những tiến bộ trong đánh giá s, phân tích chi phí-lợi ích sẽ chỉ có thể làm được với các số liệu thống kê đầy đủ nhằm cải thiện công tác lập kế hoạch và quyết định đầu tư cho vùng ven biển. Do khả năng chịu ảnh hưởng cao của vùng ven biển, cung cấp đầy đủ thông tin rủi ro sẽ làm chuyển biến lớn trong quá trình lập kế hoạch và lập ngân sách của chính phủ.

Kết quả 2: Tái sinh 4.000 ha rừng ngập mặn làm vùng đệm chắn triều cường sử dụng cách tiếp cận dựa vào bằng chứng thành công

129. Diện tích rừng ngập mặn tạo ra khu đệm quan trọng giữa biển và các cộng đồng ven biển. Những căn nhà chống chịu được bão lụt sẽ bảo vệ gia đình và các tư liệu sản xuất khỏi tác động BĐKH. Nỗ lực phục hồi rừng ngập mặn có tỉ lệ thất bại cao ở nhiều nước. Đây cũng là khó khăn mà Chính phủ Việt Nam phải đối mặt. Chính phủ đã đầu tư trong phục hồi rừng ngập mặn song tỉ lệ cây sống chỉ có 50%. Thông qua hỗ trợ kỹ thuật để nhân rộng các cách tiếp cận thành công, cụ thể là tái sinh tự nhiên, tài trợ của GCF sẽ tăng tỉ lệ sống lên 80%. Tương tự như ở Kết quả 1, nguồn lực của GCF sẽ kết nối tái sinh rừng ngập mặn với cách tiếp cận có sự tham gia dựa vào cộng đồng để xây dựng bản đồ, trồng

²⁰ Household size in target areas is estimated at 5 people/household, though reports exist that state an average of 4/household, these estimates are considered low for rural areas, as cities which tend to have smaller household sizes, were included in the calculations.

rừng và theo dõi, nhằm đảm bảo tính bền vững của nỗ lực tái sinh rừng ngập mặn. Quan trọng hơn, tái sinh rừng ngập mặn sẽ có nghiên cứu và phân tích đi trước nhằm đảm bảo các điều kiện đất đai và sức ép của cộng đồng được tính đến. Khi cần thiết, những sinh kế quan trọng cản trở sự phát triển của rừng ngập mặn (ví dụ nuôi trồng thủy sản) sẽ phải di dời tới nơi phù hợp và bền vững hơn.

130. Mỗi kết quả nêu trên sẽ được thực hiện theo giai đoạn, cho phép tạo ra những thông lệ tốt nhất và bài học kinh nghiệm, để thông báo tiếp tục triển khai các chương trình hiện hành, cũng như củng cố các chính sách liên quan và lập kế hoạch tương lai.

Kết quả 3: Tăng khả năng tiếp cận số liệu về tổn thất và thiệt hại do khí hậu đối với ứng dụng của khu vực công và tư ở cả 28 tỉnh ven biển Việt Nam

131. Hiện nay dữ liệu thông tin rủi ro khí hậu hiện có ở Việt Nam còn yếu, và được tư liệu hoá để sử dụng trong việc lồng ghép CCA và DRR vào quá trình lập kế hoạch đầu tư quy mô lớn hơn của chính phủ cấp trung ương và địa phương. Hơn nữa, thông tin rủi ro khí hậu đã cải thiện cả về chất lượng và khả năng tiếp cận sẽ giúp bổ sung nguồn tài chính công và tư vào các giải pháp giảm nhẹ rủi ro khí hậu và chống chịu với khí hậu ở khu vực duyên hải. Các sản phẩm rủi ro khí hậu được thiết kế theo đặc thù sẽ được phát triển sẵn sàng cung cấp cho khu vực tài chính/tư nhân sử dụng nhằm cải thiện công tác lập kế hoạch của họ và khuyến khích họ đầu tư vào các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với BĐKH. Do đã có các đầu tư để thích ứng với BĐKH, Chính phủ Việt Nam không chuẩn bị về mặt tài chính cho các sự cố khí hậu lớn. Nhưng cùng với khả năng xảy ra các sự cố lớn ngày càng tăng, như bão lũ, Chính phủ yêu cầu hỗ trợ xác định và khảo sát các phương án chia sẻ rủi ro, ví dụ như việc phát hành trái phiếu thảm họa. Tài trợ của GCF do đó sẽ chỉ cải thiện công tác lập kế hoạch công, song cũng mở cơ hội cho chia sẻ rủi ro và chi phí.

D.2. Chiến lược kết thúc

132. Các hoạt động thực hiện trong dự án này đều gắn với các chương trình đang thực hiện của chính phủ, do đó các cán bộ của chính phủ sẽ tham gia thực hiện ở cấp trung ương, và như vậy đảm bảo tính bền vững của can thiệp và lưu giữ kiến thức sau khi sự tham gia của GCF chấm dứt. Dự án hướng tới bổ sung và tăng cường các chương trình hiện tại của chính phủ ở các lĩnh vực trọng điểm bao gồm nhà ở an toàn, phục hồi rừng ngập mặn và quản lý và đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Những kinh nghiệm thực tế dựa trên bằng chứng tốt nhất thu được từ các dự án GCF sẽ tiếp tục thông báo cho giai đoạn tiếp theo của chương trình cũng như tăng cường chính sách và lập kế hoạch, sau khi dự án kết thúc. Điều này được đảm bảo qua quan hệ đối tác tác với UNDP, Bộ NN & PTNT, Bộ Xây dựng và các bên liên quan khác trong quá trình thực hiện dự án. Do đó các chi phí liên quan đã được tính đến trong ngân sách của chương trình.

133. Kết quả xây nhà thiết lập trên chương trình xây nhà chống chịu do chính phủ thành lập. Các thông lệ tốt nhất và bài học kinh nghiệm từ các hoạt động được đề xuất sẽ được thông báo cho các giai đoạn lập kế hoạch tiếp theo của chương trình cũng như quy hoạch cơ sở hạ tầng rộng hơn, nhằm đảm bảo tác động tiếp tục của dự án trong dài hạn. Tài trợ của GCF sẽ chỉ dùng cho chi phí tăng thêm khi bổ sung các tính năng an toàn (ví dụ, gác lửng trên mức lũ dự báo, tường và mái gia cố bê tông). Khoản đầu tư chính là một hình thức kết hợp giữa tài trợ không hoàn lại/hoặc vay nằm trong chương trình của chính phủ. Do những hộ dân tham gia chương trình đã cam kết một khoản vay trong 10 năm theo chương trình của chính phủ, những hộ dân này sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư để duy trì kết cấu này. Hiện tại, cũng đã có các bằng chứng ở giai đoạn này của chương trình cho thấy các gia đình tiếp tục đầu tư vào ngôi nhà chống chịu bão lụt của họ theo cách riêng (ví dụ, màu sơn tường phía ngoài và các trang trí khác). Ngoài ra, vì nhà ở thường là tài sản lớn duy nhất của gia đình nghèo, khi lũ lụt hay bão lớn xảy ra, nếu không có nhà chống chịu bão lụt, các gia đình sẽ khó có khả năng bảo vệ các tư liệu sản xuất của mình. Tránh được những tổn thất và thiệt hại này sẽ giảm bớt sức ép tài chính khi khôi phục lại sau các sự cố BĐKH.

134. Các mẫu thiết kế nhà ở được áp dụng trong dự án đã được phát triển để có chi phí bảo dưỡng thấp. Các tính năng thiết kế còn nhằm mục đích đảm bảo rằng các thành phần kết cấu dễ bị tổn thương hơn, như mái nhà và khớp nối ở góc được gia cố trong quá trình xây dựng, giảm chi phí sửa chữa tiềm năng. (Do xây dựng bằng bê tông, chi phí bảo trì hàng năm thường thấp hơn nhà xây dựng bằng tranh hay tre, những vật liệu hàng năm đòi hỏi phải tu bổ và đầu tư đáng kể). Ngoài ra, dự án cũng sẽ phổ biến thông tin về làm thế nào để chuẩn bị khi có bão để giảm thiệt hại tiềm tàng dựa trên các vật liệu hiện tại của Bộ xây dựng (ví dụ: các thiết bị bảo vệ, sử dụng các bao cát, v.v). Trong trường hợp nhà vẫn bị

hư hỏng trong một cơn bão bất chấp những nỗ lực này, các hộ gia đình sẽ có đủ điều kiện để được nhận khoản đền bù hạn chế để sửa chữa thông qua các chương trình hỗ trợ ứng phó thiên tai hiện đang hoạt động ở cấp tỉnh.

135. Thông qua dự án, quá trình lập kế hoạch dựa vào cộng đồng sẽ đảm bảo công tác tái sinh rừng ngập mặn sẽ chỉ được thực hiện ở những vùng mà việc chăm sóc lâu dài là có tính khả thi. Vì hầu hết các vùng được lựa chọn đã được qui hoạch là rừng phòng hộ theo một số hình thức, kinh phí chăm sóc thường xuyên đã được cấp trong dòng ngân sách hiện có của chính phủ để cộng đồng chăm sóc rừng sau khi dự án kết thúc. Cách tiếp cận dựa vào cộng đồng để tái sinh và theo dõi sẽ đảm bảo cộng đồng có ý thức sở hữu, cũng như động lực tài chính để chăm sóc khu rừng ngập mặn, và trong một số trường hợp, là việc thay đổi một số hành vi làm cản trở sinh trưởng của rừng ngập mặn (ví dụ nuôi trồng thủy sản). Tương tự như ở trên, các thông lệ tốt nhất và bài học kinh nghiệm qua sự tham gia của GCF sẽ là một đầu vào cho quá trình lập kế hoạch của Bộ NN&PTNT để thông tin cho các chương trình/đầu tư trong tương lai về diện tích bảo vệ và tái sinh rừng ngập mặn.

136. Đối với Kết quả đầu ra 3 về thông tin rủi ro khí hậu, số liệu sẽ được thu thập và tư liệu hoá trong cơ sở dữ liệu về tổn thất và thiên tai của chính phủ. Nhằm đảm bảo cơ sở dữ liệu sẽ được nhập và duy trì sau khi GCF dừng tham gia, một mô hình thành công sẽ được áp dụng – đây là mô hình mà UNDP đã sử dụng trước đây để thành lập cơ sở dữ liệu thiên tai cho khu vực. Indonesia²¹, Cambodia²² và Sri Lanka²³ được coi là những nước có hoạt động tốt nhất, với một khối lượng lớn và đa dạng các công việc đã làm để nhập thông tin và xác minh cơ sở dữ liệu của họ. Trong cả ba điển hình nêu trên, chính phủ đã tiếp nhận toàn bộ trách nhiệm để duy trì cơ sở dữ liệu tiếp tục hoạt động. Trong quá trình chuẩn bị, UNDP đã hỗ trợ tài chính cho một cán bộ quản lý cơ sở dữ liệu và một trợ lý hỗ trợ thiết lập cơ sở dữ liệu và nhập số liệu quá khứ.

137. Tổ chức tập huấn cho cơ quan được giao nhiệm vụ phụ trách vấn đề thiên tai về cách thu thập, xác minh và tài liệu hoá số liệu. Tập huấn về cách sử dụng số liệu trong lập kế hoạch cũng được cung cấp cho các bộ chuyên ngành và Bộ kế hoạch. Dự án này sẽ sử dụng cách tiếp cận tương tự như vậy. Do đây là một hoạt động được chính phủ ưu tiên, sẽ có rất ít (hoặc gần như không có) rủi ro về việc cơ sở dữ liệu sẽ không tiếp tục được duy trì, nhất là trong điều kiện được dự án GCF cung cấp các hỗ trợ và đào tạo phù hợp.

138. HDào tạo kỹ năng do dự án cung cấp (ví dụ, đào tạo CBA và ứng dụng thông tin rủi ro khí hậu vào lập kế hoạch) thông qua hình thức học trực tuyến, với giáo trình và hướng dẫn được cài đặt sẵn trên một trang web sẽ đảm bảo cung cấp các cơ hội học tập và ôn tập mở rộng cho nhiều đối tượng hơn, không chỉ bó hẹp trong các đối tượng mục tiêu của dự án. Bằng cách này, dự án hỗ trợ xây dựng đội ngũ chuyên gia về phân tích kinh tế và lồng ghép thông tin rủi ro khí hậu vào lập kế hoạch. Sản phẩm thông tin rủi ro khí hậu phù hợp và cơ chế loại bỏ rủi ro của Kết quả 3 sẽ là động lực để khu vực tài chính và tư nhân tham gia và đầu tư nhiều hơn, góp phần giảm nhẹ sức ép tài chính mà Chính phủ Việt Nam đang và sẽ phải đương đầu trong lĩnh vực ứng phó với BĐKH hiện tại và trong tương lai.

139. Hơn nữa, Kết quả 3 tìm cách khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân và tài chính/bảo hiểm. Trường hợp cần thiết, các phương án/ dàn xếp về mặt pháp lý sẽ giúp chính thức hóa các can thiệp và xây dựng quan hệ đối tác. Điều này sẽ được quyết định, khi cần thiết, trong quá trình thực hiện dự án sau khi thảo luận và đàm phán với các bên có liên quan.

140. Nhìn chung, chủ đề phổ biến xuyên suốt các kết quả đầu ra của dự án là sự tích hợp của thông tin rủi ro khí hậu có chất lượng và áp dụng các thực hành tốt nhất trong việc lập kế hoạch rộng lớn hơn, do đó đảm bảo tính bền vững và giới thiệu một sự chuyển đổi mô hình.

²¹ <http://dibi.bnbp.go.id>

²² <http://camdi.ncdm.gov.kh>

²³ <http://www.desinventar.lk>

E.1. Tiềm năng tác động

Tiềm năng của chương trình/dự án góp phần đạt được mục tiêu và kết quả của Quỹ

E.1.1. Tiềm năng tác động thích ứng/giảm thiểu

141. Tài trợ của GCF sẽ mang lại lợi ích cho các thành phần khác nhau của Việt Nam. Bao gồm:

- 20.000 người dễ bị tổn thương cao hưởng lợi trực tiếp từ các căn nhà an toàn hơn, có khả năng chống chịu khí hậu tốt hơn (người hưởng lợi trực tiếp, 60% phụ nữ)²⁴
- Tổng số 3.865.100 dân ở các tỉnh ven biển trong dự án sẽ được bảo vệ khỏi các tác động của thảm họa, khi các khu vực rừng ngập mặn diện tích lớn được khôi phục đầy đủ và khỏe mạnh (người hưởng lợi gián tiếp, 50% phụ nữ)²⁵
- Hơn 30 triệu người sống tại 28 tỉnh ven biển được hưởng lợi từ lập bản đồ rủi ro khí hậu và lập kế hoạch có sự tham gia về quản lý rủi ro thiên tai và các thực hành về giảm thiểu rủi ro (người hưởng lợi gián tiếp, 50% phụ nữ).

142. Ngoài ra, 500.000 người được tiếp cận với các công nghệ xây nhà chống chịu với bão lụt, an toàn, chi phí thấp thông qua tiếp tục phổ cập CBDRA và thiết kế nhà an toàn cũng như đào tạo qua chương trình CBDRM.

143. Những thành viên của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam được truy cập miễn phí tới kho dữ liệu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu có chất lượng tốt hơn.

144. Ít nhất 4 Bộ sẽ được hưởng lợi từ sự phát triển năng lực thể chế của dự án trong lĩnh vực quản lý rủi ro khí hậu: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT); Bộ Xây dựng; và Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN & MT).

145. Ít nhất 4 Viện khoa học quốc gia sẽ hưởng lợi từ việc nâng cao nguồn nhân lực và cơ sở kiến thức của họ trong lĩnh vực thích ứng với BĐKH: Viện khí hậu, thủy văn, môi trường và BĐKH (đầu mối kỹ thuật chính thức về dự báo khí hậu) và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (đầu mối kỹ thuật chính thức về lập bản đồ rủi ro lũ); Viện Khoa học và Công nghệ Xây dựng (đầu mối chính thức về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng), và Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam (đầu mối kỹ thuật về lâm nghiệp, bao gồm đánh giá địa điểm để lựa chọn giống cây, các biện pháp kỹ thuật phục hồi rừng ngập mặn).

E.1.2. Các chỉ số tiềm năng tác động chính

Cung cấp giá trị số cụ thể cho các chỉ số dưới đây.

Chỉ số GCF chính	Tấn các bon dioxit tương đương dự tính (t CO ₂ eq) sẽ được giảm hay tránh phát thải (lĩnh vực giảm nhẹ)	Hàng năm	93.036
		Cả vòng đời	1,860.720
	• Dự kiến tổng số người hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp, theo giới (giảm sự tổn thương hoặc tăng khả năng chống chịu); • Số người hưởng lợi tương đối so với tổng dân số, phân chia theo giới tính (chỉ thích ứng)	30 triệu người sống ở các tỉnh ven biển của Việt Nam (15 triệu phụ nữ), hưởng lợi gián tiếp	
		Phần trăm (%)	30%

²⁴ Bình quân qui mô hộ gia đình ở vùng dự án là 5 người/hộ, mục tiêu là 4.000 nhà

²⁵ Ước tính có khoảng 4.000 - 10.000 người / xã. Ước tính thấp nhất là 4.000 được sử dụng cho 25 xã của dự án.

Các chỉ số liên quan khác	<i>Ví dụ như:</i> • Dự kiến tăng về số lượng các hộ gia đình tiếp cận đến năng lượng phát thải thấp • Dự kiến tăng về số lượng các nhà cung cấp điện, nhỏ vừa và lớn có lượng khí thải thấp, và năng lực lắp đặt hiệu quả • Dự kiến tăng việc tạo lập và sử dụng thông tin khí hậu trong quá trình ra quyết định • Dự kiến mức độ tăng cường năng lực thích ứng và mức độ giảm tiếp xúc với rủi ro khí hậu • Khác																
146. Dự tính lượng các bon hấp thụ trong dự án dựa trên xem xét các nghiên cứu về trữ lượng các bon trong rừng ngập mặn (Y. Okimoto và cộng sự 2013 cho Nam Định và Thanh Hóa; Vu Tan Phuong và cộng sự 2012 cho Kiên Giang và Cà Mau; GIZ 2012 cho Kiên Giang và Sóc Trăng). Các nghiên cứu ước tính lượng tăng trưởng sinh khối hàng năm dao động từ 15 – 20 tấn/ha/năm phụ thuộc vào lập địa (ở miền Nam, tăng trưởng sinh khối cao hơn). Không có thông tin về rừng ngập mặn đã bị suy thoái. Để thận trọng, chúng tôi sử dụng tỉ lệ tăng trưởng thấp nhất 15 tấn/ha/năm để ước tính lượng hấp thụ các bon. Tỉ lệ các bon được sử dụng là 0,5; mức phát thải đi cùng tái sinh rừng ngập mặn đến chủ yếu từ sản xuất cây giống (ví dụ phát thải do dùng phân bón) và vận chuyển cây giống tới nơi trồng (dùng xăng) được ước tính là 80 t CO₂ tương đương/ha/năm. Việc ước tính mức giảm phát thải trong các hoạt động rừng ngập mặn như sau:																	
<table border="1"> <tr> <td>Tổng diện tích rừng ngập mặn được tái sinh (ha)</td><td>4.000</td></tr> <tr> <td>Tăng trưởng sinh khối trung bình (tấn/ha/năm)</td><td>15,4</td></tr> <tr> <td>Phần các bon</td><td>0,5</td></tr> <tr> <td>Vòng đời/chu kỳ (năm)</td><td>20²⁶</td></tr> <tr> <td>Mức hấp thụ các bon trên một hecta trong vòng đời (tCO₂ tương đương/ha)</td><td>565</td></tr> <tr> <td>Lượng các bon thuần (trừ phát thải) (tCO₂ tương đương/ha)</td><td>485</td></tr> <tr> <td>Tổng lượng phát thải giảm trong diện tích được tái sinh (tCO₂/20 năm)</td><td>1.860.720</td></tr> <tr> <td>Chi phí giảm phát thải (US\$/t CO₂ tương đương)</td><td>6,18</td></tr> </table>	Tổng diện tích rừng ngập mặn được tái sinh (ha)	4.000	Tăng trưởng sinh khối trung bình (tấn/ha/năm)	15,4	Phần các bon	0,5	Vòng đời/chu kỳ (năm)	20 ²⁶	Mức hấp thụ các bon trên một hecta trong vòng đời (tCO ₂ tương đương/ha)	565	Lượng các bon thuần (trừ phát thải) (tCO ₂ tương đương/ha)	485	Tổng lượng phát thải giảm trong diện tích được tái sinh (tCO ₂ /20 năm)	1.860.720	Chi phí giảm phát thải (US\$/t CO ₂ tương đương)	6,18	
Tổng diện tích rừng ngập mặn được tái sinh (ha)	4.000																
Tăng trưởng sinh khối trung bình (tấn/ha/năm)	15,4																
Phần các bon	0,5																
Vòng đời/chu kỳ (năm)	20 ²⁶																
Mức hấp thụ các bon trên một hecta trong vòng đời (tCO ₂ tương đương/ha)	565																
Lượng các bon thuần (trừ phát thải) (tCO ₂ tương đương/ha)	485																
Tổng lượng phát thải giảm trong diện tích được tái sinh (tCO ₂ /20 năm)	1.860.720																
Chi phí giảm phát thải (US\$/t CO ₂ tương đương)	6,18																
147. Lượng carbon hấp thụ tại rừng ngập mặn của Việt Nam thay đổi theo lập địa và phụ thuộc vào tổ thành loài. Ở miền Nam, rừng ngập mặn có trữ lượng tăng trưởng cao nhất, do đó khả năng hấp thụ carbon là cao hơn so với miền Bắc. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng tăng sinh khối hàng năm của rừng ngập mặn là 20 tấn / ha / năm đối với miền Bắc (tỉnh Nam Định và Thanh Hóa; Okimoto 2013) và 25-40 tấn / ha / năm ở miền Nam (Cà Mau, Kiên Giang, Cần Giờ; Tân năm 2002; Nam năm 2010; Wilson 2010). Giá trị này là khoảng 36 tấn / ha / năm ở Malaysia (Ong 1993), và 28-70 tấn / ha / năm ở Thái Lan (Christensen 1978). Điều này chỉ ra rằng tỷ lệ tăng sinh khối của rừng ngập mặn ở miền Nam Việt Nam là khá tương tự như của Malaysia và Thái Lan.																	
148. Ước tính lượng carbon dioxide tương đương để được giảm hoặc tránh được dựa trên tăng sinh khối được tạo ra bằng cách phục hồi rừng ngập mặn. Công thức để tính là: CO₂ tương đương = sinh khối * CF * 44/12.																	
149. Trường hợp sinh khối là khối lượng khô được tạo ra bằng cách trồng rừng; CF là tỉ lệ carbon (coi như là 0,5) và 44/12 là hệ số chuyển đổi từ carbon sang carbon dioxide. Do lượng tăng sinh khối khác nhau tùy vào lập địa, một "ước tính thấp nhất" đã được sử dụng (tức là dự tính giá trị tăng sinh khối tối thiểu).																	

²⁶ Dự án thực hiện trong 5 năm, nhưng rừng ngập mặn sẽ được duy trì ít nhất trong 20 năm - ước tính rằng rừng ngập mặn trở nên ổn định ở tuổi 20. Phát thải do đó được tính cho toàn bộ vòng đời của rừng ngập mặn. Như một ước tính, trong vòng 5 năm, dự án sẽ tạo ra: 15,5 tấn sinh khối * 4000 ha * 0,5 * 3,67 = 565.180 tấn CO₂

150. Lượng tăng sinh khối ước tính cho 20 năm là vòng đời tối thiểu của rừng ngập mặn và tỷ lệ tăng trưởng được ước tính dựa trên tuổi của rừng ngập mặn. Đối với tuổi <5 năm, tăng sinh khối là 5 tấn/ha/năm; với độ tuổi 5-10, mức tăng là 17 tấn/ha/năm; độ tuổi 11-15 là 21 tấn/ha/năm; độ tuổi 16-20 là 14 tấn/ha/năm.

151. Mức giảm 1.860.720 tCO₂e hơn 20 năm bằng cách phục hồi 4.000 ha rừng ngập mặn ven biển được trình bày trong phần E.3.1. Đồng lợi ích về môi trường, xã hội và kinh tế, bao gồm cả tác động phát triển nhạy cảm giới.

E.2. Tiềm năng chuyển đổi mô hình

Mức độ mà hoạt động đề xuất có thể xúc tác đến tác động vượt khỏi đầu tư riêng cho một chương trình/dự án

E.2.1. Tiềm năng để mở rộng qui mô và nhân rộng (Cung cấp số liệu và cơ sở lý luận để hỗ trợ)

152. Dự án sẽ xúc tác chuyển đổi mô hình đầu tư chống chịu với BĐKH của chính phủ, chuyển từ đầu tư theo ngành từ trên xuống sang cách tiếp cận có sự tham gia, lồng ghép thông tin rủi ro. Hai hiệu ứng biến đổi được mong chờ: thứ nhất, tăng sự tham gia của cộng đồng và tăng cường hiệp lực giữa các chương trình của chính phủ đang thực hiện sẽ tăng hiệu quả và tính bền vững của chương trình. Thứ hai, tăng chất lượng và tiếp cận tới các dữ liệu sẽ hỗ trợ lập kế hoạch rủi ro chính xác hơn và đóng góp một môi trường thuận lợi hơn cho phát triển sản phẩm chuyển giao rủi ro tại Việt Nam.

Tăng hiệu quả của các chương trình chống chịu của chính phủ đang thực hiện

153. Những can thiệp của dự án sẽ nhân rộng mô hình lồng ghép thay đổi, được triển khai trên 28 tỉnh duyên hải của Việt Nam. Các hoạt động sẽ bổ sung trực tiếp cho các chương trình đầu tư của Chính phủ đang thực hiện, hướng tới việc tạo ra hiệu ứng theo cấp số nhân, và đầu tư của chính phủ được thực hiện hiệu quả và bền vững hơn thông qua đồng tài trợ của dự án. Các hoạt động của dự án sẽ trực tiếp tăng cường thực hiện các chương trình quốc gia về CBDRM, rừng ngập mặn ven biển, nhà ở an toàn và chuẩn bị ứng phó với thiên tai cấp quốc gia.

154. Hiến pháp Việt Nam, theo Điều 59 mục 3, khẳng định rằng Nhà nước thực hiện chính sách phát triển nhà ở và tạo điều kiện để mọi người có nhà ở. Do một phần ba dân số (30 triệu người) cư trú ở các tỉnh ven biển, nên có tiềm năng đáng kể để nhân rộng qui mô chương trình, cho cả các nhóm dễ bị tổn thương, hay để cải thiện hơn nữa chất lượng nhà ở của các gia đình thu nhập trung bình. Thiết kế này cũng có thể được điều chỉnh khi cần thiết để phản ánh những mối quan tâm chính của các khu vực dễ bị tổn thương khác (ví dụ như vùng đồng bằng sông Cửu Long).

155. Dự án GCF hướng tới đối tượng mục tiêu là 4.000ha rừng ngập mặn, với tiềm năng lớn về mở rộng qui mô do diện tích mất rừng ngập mặn ở Việt Nam lớn - từ 408.500 ha vào năm 1943 xuống chỉ còn 59.760ha vào năm 2008. Những kinh nghiệm thực tế tốt nhất dựa trên bằng chứng xác thực sẽ được thu thập và sẵn sàng chia sẻ với các nước khác. Đơn cử, Timor-Leste cũng đang đối mặt với thách thức trong việc duy trì các khu vực rừng ngập mặn do sự phát triển nhanh chóng ở ven biển, và có thể được hưởng lợi từ những kiến thức được xây dựng và tích lũy từ dự án này.

156. Các tỉnh mục tiêu đã được chọn lựa là nơi chịu rủi ro cao đặc biệt trước mực nước biển, triều cường và/hay mất rừng ngập mặn. Với việc sử dụng bản đồ hiện có của CBDRM làm cơ sở, nguồn lực của GCF sẽ được dùng để đảm bảo rằng hơn 95% các xã ven biển thuộc 28 tỉnh có kế hoạch CBDRM. Những kế hoạch này bao gồm thứ tự ưu tiên đầu tư để thích ứng BĐKH và xây dựng khả năng chống chịu. Đảm bảo lồng ghép các hành động ưu tiên được nêu trong kế hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và ngân sách là một trong những bước quan trọng xây dựng kế hoạch CBDRM. Mức độ lồng ghép này cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến quá trình lập kế hoạch hàng năm của tỉnh dọc theo toàn bộ bờ biển của Việt Nam. Việc đánh giá rủi ro như là một phần của quá trình CBDRM có thể được áp dụng cho các mục đích khác nhau, phương pháp này sẽ được phổ biến thông qua các chương trình CBDRM đến 6.000 xã thuộc dự án, và nhiều hơn sau khi dự án GCF kết thúc.

Thúc đẩy tiếp cận đến dữ liệu có chất lượng để tăng cường công tác lập kế hoạch và phát triển sản phẩm khu vực tư nhân

157. Nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận dữ liệu có thể tạo ra tác động chuyển đổi cách lập kế hoạch và thực hành quản lý rủi ro ở Việt Nam. Quá trình ra quyết định liên quan đến lập kế hoạch đầu tư và sắp xếp ưu tiên dự án thích ứng hiện hay không được hưởng lợi từ phân tích xác suất rủi ro cả về sinh kế và tiếp cận được tài chính. Ngoài nâng cao việc thực hiện các dự án hiện đã đưa vào thực hiện đến năm 2020, việc cung cấp sớm các dữ liệu rủi ro đã được cải thiện cho tất cả các tỉnh đồng bằng và ven biển có thể là một yếu tố thúc đẩy Chính phủ tiến hành nhân rộng cách tiếp cận tổng hợp này trong thiết kế của chu kỳ kế hoạch 2020-2025 của mình.

158. Dữ liệu chính xác về sự cố cực đoan trong quá khứ và các thông tin rủi ro liên quan đến khí hậu khác cũng là động lực cho việc phát triển sản phẩm chuyển giao rủi ro khu vực tư nhân. Nguồn lực của GCF sẽ giúp tạo lập và tiếp cận được các dữ liệu và công cụ như bản đồ rủi ro và các mô hình tài chính nhằm hỗ trợ việc ra quyết định chính xác hơn trong thích ứng với BĐKH ở tất cả các cấp.

159. Tăng cường các hệ thống để thu thập dữ liệu cấp xã về tổn thất và thiệt hại do thiên tai cũng sẽ nâng cao đáng kể bộ dữ liệu dài hạn có thể được sử dụng làm phân tích IPCC và các phân tích khác của quốc gia.

160. Về mặt số liệu, sự chuyển biến này có thể tóm tắt:

- Tất cả 28 tỉnh ven biển của Việt Nam sẽ có bản đồ rủi ro tương thích, được cập nhật, có khả năng để tính toán cho các rủi ro như triều cường cũng như tiềm năng tác động BĐKH lâu dài (hiện nay không có tỉnh nào có các bản đồ như vậy, và ở những nơi có sẵn dữ liệu cấp tỉnh thì cũng không tương thích).
- Tỷ lệ thành công bình quân đối với tái sinh rừng ngập mặn tại vùng ven biển sẽ tăng lên từ mức bình quân 50% đến hơn 80% và năng lực để thực hiện tiêu chuẩn này về mặt kỹ thuật sẽ được chuyển giao từ một số ít các tỉnh có dự án thí điểm thành công đến cán bộ cấp tỉnh của tất cả các tỉnh ven biển;
- Lần đầu tiên, những dự án nhà ở chống chịu lũ lụt của chính phủ sẽ được tích hợp trong nỗ lực xây dựng chống chịu rộng lớn hơn, và sẽ phân biệt sự khác nhau giữa rủi ro toàn diện và rủi ro triều cường/siêu bão, áp dụng trực tiếp các bài học kinh nghiệm từ Philippine sau bão Tacloban. Các dự án nhà ở trong tương lai sẽ bao gồm việc đưa phân tích bản đồ rủi ro được cập nhật cũng như các thông lệ CBDRM vào lập kế hoạch và thực hiện.

161. Cuối cùng, tại các tỉnh duyên hải, các bài học kinh nghiệm cũng như những thiếu hụt có thể có trong dự án cũng sẽ được trực tiếp phân tích trong quá trình lập KH hàng năm (bước 5, quá trình CBRDM), từ đó có thể dẫn đến tăng đầu tư cho công tác xây dựng năng lực chống chịu, và cải tiến các chính sách, kế hoạch, tiêu chuẩn chủ chốt của quốc gia.

E.2.2. Tiềm năng cho kiến thức và học tập

162. Ở cấp xã, cán bộ và nhân dân địa phương lần đầu tiên có cơ hội chia sẻ và học hỏi về rủi ro BĐKH ở xã, kết hợp các quá trình CBDRA dựa vào kiến thức bản địa có sự tham gia với dữ liệu từ các gói thông tin khổng lồ có tính khoa học chứa đựng dữ liệu rủi ro và BĐKH đã cập nhật. Các xã cũng có khả năng học hỏi về các phương án xây nhà an toàn, và ích lợi của tái sinh rừng ngập mặn, giảm rủi ro triều cường và củng cố các hệ sinh thái. Năng lực của cộng đồng để chuyển giao từ học hỏi sang hành động sẽ được tăng cường thông qua hỗ trợ để gây ảnh hưởng đến quá trình lập ngân sách hàng năm của tỉnh, và thông qua tài liệu hoá thường xuyên các thông lệ tốt suốt thời gian dự án.

163. Ở cấp tỉnh, năng lực kỹ thuật của tỉnh sẽ được nâng cao trực tiếp liên quan đến toàn bộ cả ba kết quả đầu ra của dự án. Lũy kế này sẽ giúp nhân rộng hơn bài học kinh nghiệm từ các dự án thí điểm thành công ven biển, cũng như tăng cường ứng dụng trực tiếp trong quá trình sử dụng đất và quy hoạch/lập kế hoạch khác.

E.2.3. Đóng góp để tạo ra một môi trường thuận lợi

164. Kết quả 3 sẽ tăng khả năng tiếp cận tới các dữ liệu khí hậu, tổn thất và thiệt hại để ứng dụng trong khu vực công và tư.

165. Để thông tin thuyết phục được các nhà làm chính sách, tác động hiểm họa cũng cần được thể hiện dưới dạng tài chính, có thể ước tính được giá trị của tài sản hiện tại và tương lai khi gặp rủi ro. Để làm được việc này cần phân tích dữ liệu tổn thất và thiệt hại trong quá khứ để hiểu hơn các tác động hiện tại tới kinh tế, và sau đó xây dựng năng lực lập mô hình cho các tác động liên quan đến BĐKH có thể xảy ra trong tương lai. Việt Nam đã nhận thấy nhu cầu cho thông tin loại này, song nỗ lực hỗ trợ cải thiện mô hình tài chính còn manh mún và phần lớn kém phát triển. Tác động dài hạn của thiếu hụt này đối với phát triển rất lớn. Khả năng quản lý rủi ro tài chính của các sự cố xác suất thấp, tác động cao có lẽ là sự khác biệt lớn nhất giữa năng lực thích ứng của các nước thu nhập thấp và trung bình.

166. Để đảm bảo dữ liệu được cung cấp dưới hình thức và phương thức hữu ích đối với khu vực tư nhân, và để tăng sự hiểu biết của chính phủ về cách thức làm thế nào dữ liệu có thể tạo ra động lực đối với sản phẩm quản lý rủi ro trong tương lai, dự án cũng sẽ hỗ trợ đối thoại giữa khu vực tư nhân và các đối tượng liên quan của tỉnh và trung ương. Việc này bao gồm đối thoại kỹ thuật với khu vực tư nhân về tăng cường ứng dụng và tiếp cận đến dữ liệu hiểm họa, tổn thất và thiệt hại. Việc tham vấn rộng rãi các doanh nghiệp về những trở ngại và giải pháp hiện nay để tăng sự tham gia của khu vực tư nhân, chia sẻ và chuyển giao rủi ro trong quản lý khí hậu ở Việt Nam cũng sẽ được hỗ trợ.

167. Để khu vực tư nhân và cộng đồng đầu tư vào dữ liệu giảm nhẹ rủi ro, cần có dữ liệu quá khứ chính xác và dữ liệu tác động của khí hậu ở các cấp. Những số liệu này hiện nay, ngoài chính phủ, là không thể tiếp cận được, hay chất lượng còn chưa đầy đủ ở vùng ven biển Việt Nam. Do đó, đầu tư vào kết quả này sẽ góp phần trực tiếp tạo điều kiện thuận lợi để khu vực công và tư nhân có thể đầu tư vào nỗ lực giảm nhẹ rủi ro một cách hệ thống hơn.

E.2.3. Đóng góp vào khuôn khổ pháp lý và chính sách

168. Dự án đặc biệt hướng tới tăng cường thực hiện các chương trình và kế hoạch hiện có của Chính phủ và mỗi kết quả đầu ra đều có phần xây dựng năng lực kỹ thuật cụ thể trong đó. Ngoài ra, mỗi kết quả đầu ra cũng có thành tố tăng cường chính sách cụ thể, hỗ trợ Chính phủ các đầu vào kỹ thuật nhằm tăng cường hay nâng cấp các hướng dẫn và văn bản chính sách chính thức.

169. Cải thiện công tác lập bản đồ rủi ro cho tỉnh là điều rất quan trọng để làm tốt hơn công tác lập kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Với các dữ liệu được cải thiện về mặt chất lượng, khi được sử dụng, sẽ trực tiếp nâng cao chất lượng dự báo khí hậu và báo cáo cho IPCC.

170. Mở rộng tái sinh rừng ngập mặn là một ưu tiên chính của Chính phủ trong dự thảo INDC cho Việt Nam, một phần vì những đồng lợi ích về thích ứng và giảm nhẹ đạt được. Tiêu chuẩn và định mức tốt hơn để ứng dụng công nghệ đã được thông qua sẽ tăng khả năng của Chính phủ trong việc đáp ứng các mục tiêu chính nhằm tăng tỉ lệ che phủ rừng trong vùng bị tác động bởi bão.

171. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng ở cấp xã, và thí điểm lồng ghép các nỗ lực CBDRM với các chương trình quốc gia khác cũng cho thấy tiềm năng lớn đối với việc sử dụng những nhóm ở cấp xã này làm phương tiện chuyển tải nâng cao nhận thức tăng trưởng xanh, sử dụng tiết kiệm năng lượng và các lĩnh vực khác. Trong nội bộ Chính phủ, tiềm năng để đưa thêm các hoạt động bổ sung cụ thể trong chương trình nhà ở an toàn hơn có thể đề cập đến vấn đề tiết kiệm năng lượng, tiềm năng về năng lượng mặt trời hay tăng trưởng xanh khác có liên quan đến nhu cầu của các hộ nghèo cũng sẽ được cân nhắc khi hỗ trợ chính sách để soạn thảo chương trình quốc gia vòng sắp tới.

E.3. Tiềm năng phát triển bền vững

Lợi ích lớn hơn và ưu tiên

E.3.1. Đồng lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường, bao gồm cả tác động phát triển có yếu tố giới

172. Mục tiêu của dự án được thiết kế để xây dựng và tăng cường thực thi các kế hoạch và chương trình hiện có của Chính phủ nhằm nâng cao kỹ năng của cán bộ Chính phủ và lãnh đạo cộng đồng. Những yếu tố này sẽ làm tăng đáng kể đóng góp dài hạn của các can thiệp. Dự án cũng đóng góp cho phát triển bền vững thông qua các đồng lợi ích khác như tóm tắt dưới đây:

Lợi ích kinh tế

- Lập kế hoạch tốt hơn khi lồng ghép thông tin rủi ro khí hậu, mang lại ích lợi cho 30 triệu dân ven biển
- Giảm tổn thất do thiên tai gây ra ở các ngành quan trọng bao gồm nông nghiệp và nhà ở tại các xã vùng đồng bằng và ven biển
- Tăng độ chính xác của dữ liệu khí hậu, giảm tính không chắc chắn về kinh tế và tăng tính khả thi về kinh tế của các sản phẩm và dịch vụ quản lý khí hậu
- Có kế hoạch tài chính để Chính phủ quản lý rủi ro tài chính từ các thiên tai lớn ở ven biển (vượt quá 3% GDP)
- Tăng khả năng tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm rủi ro khí hậu giá phải chăng cho dân vùng đồng bằng ven biển

Lợi ích xã hội

- Xây nhà ở an toàn cho 20.000 người, thuộc các hộ gia đình thu nhập thấp, chịu rủi ro cao
- Tăng khả năng tiếp cận nhà ở an toàn cho 500.000 người, thuộc các hộ gia đình thu nhập thấp, chịu rủi ro đặc biệt cao
- Tổng số 3.865.100 dân ở các tỉnh ven biển tham gia dự án sẽ được bảo vệ bởi các khu vực rừng ngập mặn khỏe mạnh và rộng lớn
- Giảm thương vong và chết do thiên tai khí hậu cực đoan
- Tăng cường việc lập kế hoạch có sự tham gia trong các xã mục tiêu, đảm bảo có đại diện các nhóm dễ bị tổn thương kể cả người khuyết tật, dân tộc thiểu số, thanh niên và người cao tuổi
- Cải thiện cơ chế truyền thông hai chiều và có tham khảo các dự án xây dựng chống chịu trong quá trình lập kế hoạch kinh tế-xã hội
- Tăng cường sự tham gia của cộng đồng để bảo vệ di sản thiên nhiên

Lợi ích môi trường

- Giảm lượng khí nhà kính 1.860.720 tCO₂ trong hơn 20 năm thông qua phục hồi 4.000 ha rừng ngập mặn ven biển
- Bảo vệ đa dạng sinh học dưới hình thức quản lý phục hồi rừng ngập mặn
- Phát triển kỹ năng của dân địa phương về bảo vệ công nghệ sinh học
- Sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường cho 4.000 căn nhà, có tính đến sự hiểu biết đầy đủ của dân cư ven biển về rủi ro của các hệ sinh thái.
- Cải thiện việc áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn môi trường, đánh giá môi trường, và tài nguyên môi trường tại các xã mục tiêu.
- Bảo vệ hệ thống đê biển bằng cách giảm năng lượng sóng biển và như vậy giảm chi phí liên quan tới duy tu bảo dưỡng đê biển.

Những cân nhắc và lợi ích giới

- Các nhóm chuyên gia CBDRM cấp xã phải có ít nhất 30% phụ nữ kể cả trong các vị trí ra quyết định
- Cơ sở dữ liệu về tổn thất và thiệt hại cần theo dõi dữ liệu phân tách riêng về giới đối với các số liệu thống kê thiên tai chính
- Tăng cường vai trò của Hội Phụ nữ Việt Nam trong lập kế hoạch của cộng đồng và trong quá trình tham vấn.

E.4. Nhu cầu của người nhận

Tính dễ tổn thương và nhu cầu tài chính của dân và nước hưởng lợi

E.4.1. Tính dễ tổn thương và nhu cầu tài chính của dân và nước hưởng lợi (chỉ với thích ứng)

173. Theo Chỉ số tổn thương do BĐKH (CCVI), Việt Nam xếp thứ 23 trong tổng số 193 nước và là một trong 30 nước "đặc biệt rủi ro/có nguy cơ đặc biệt". CCVI đánh giá 42 yếu tố xã hội, kinh tế và môi trường để đánh giá tính dễ bị tổn thương trong cả ba lĩnh vực chính, bao gồm (a) dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai liên quan đến khí hậu và nước biển dâng; (b) độ nhạy cảm của con người về mô hình dân số, phát triển, tài nguyên thiên nhiên, phụ thuộc nông nghiệp và xung đột; và (c) tính dễ tổn thương trong tương lai có xét đến khả năng thích ứng của Chính phủ và cơ sở hạ tầng của quốc gia giải quyết hiệu ứng BĐKH. Các nước chịu rủi ro nhất có đặc tính là mức độ nghèo khổ cao, mật độ dân số cao, chịu ảnh hưởng của các sự cố liên quan đến khí hậu; và mức độ phụ thuộc vào đất nông nghiệp dễ bị ảnh hưởng bởi hạn hán và lũ lụt.

174. Với hơn 3.260 km bờ biển, khoảng 30% dân số của 90 triệu dân Việt Nam sống tại 28 tỉnh ven biển. Những khu vực này rất dễ bị tổn thương với nước biển dâng và đi kèm với xâm nhập mặn và siêu bão, lụt, triều cường. Thông báo quốc gia của Việt Nam lần thứ hai dự báo trung bình mực nước biển dâng 57-73cm dọc bờ biển Việt Nam vào năm 2100. Nếu không có hành động lớn, khoảng 30.000km² tương đương 9,3% tổng diện tích mặt đất của quốc gia sẽ bị ngập. Các dự báo khí hậu cũng chỉ ra mức tăng có thể về xác suất các cơn bão cường độ lớn hay siêu bão đi kèm với triều cường tương tự như cơn bão đã tàn phá vùng Tacloban của Phillipine năm 2013.

175. Những xu hướng này đặt các khu vực đồng bằng ven biển và đất thấp duyên hải của Việt Nam vào mức có rủi ro đặc biệt. Tỷ lệ nghèo 23% của vùng ven biển nhiều gấp hai lần tỷ lệ trung bình cả nước, một phần do tăng tổn thất hàng năm từ tác động thiên tai liên quan đến khí hậu. Hơn 500.000 người sống cách bờ biển 200 m. Nhà cửa của họ hầu như thường xuyên chịu tác động của bão, xói lở và triều cường. Số người nghèo và dễ bị tổn thương càng ngày càng tăng tại các khu vực ven biển, với điều kiện nhà ở không an toàn, một phần do sự đô thị hóa nhanh chóng và đói nghèo dai dẳng.

176. Việt Nam phải chịu trung bình 6-8 cơn bão hàng năm²⁷. Trong những năm ENSO, bão xuất hiện khốc liệt hơn, mạnh hơn và với xói lở trên diện rộng. Quan sát trong quá khứ không cho thấy thay đổi nào về mô hình hay cường độ bão trong vùng Đông Nam Á/Tây Thái Bình Dương do ảnh hưởng của BĐKH song sự mạnh lên của các cơn bão đã được quan sát thấy ở phía Nam Đại Tây Dương/vùng Caribbean. Tuy nhiên, có khả năng các cơn bão nhiệt đới (tropical storm) và bão (typhoon) ở khu vực Đông Nam Á tăng dần cường độ của, theo bản cập nhật đánh giá lần thứ tư của IPCC năm 2007. Hơn nữa, tiềm năng thiệt hại do bão nhiệt đới và bão có vẻ tăng lên do hậu quả của tăng mật độ dân số trong những khu vực dễ chịu ảnh hưởng và do các cơ sở hạ tầng có giá trị kinh tế cao trong các khu vực đó. Chính phủ đã nhấn mạnh đến các giải pháp công trình, như đê biển và kè chắn sóng. Đất nước có hơn 10.600km đê sông cao 6-9m và 2.600km đê biển cao 3,5-5m cần được tiếp tục mở rộng và gia cố hơn nữa²⁸. Chính phủ đã đầu tư nhiều vào hệ thống đê biển và có các kế hoạch tham vọng trong thập kỷ tới mở rộng đê biển.

177. Nhà cửa được tính là tổn thất lớn nhất về tiền trong các thiên tai liên quan đến khí hậu. Nhà cửa thường là tài sản lớn duy nhất các cá nhân và gia đình sở hữu. Đó cũng là nơi mà các tài sản gia đình sở hữu khác (công cụ lao động, đồ gỗ, cất giữ lương thực, v.v...) tập trung và là nơi diễn ra nhiều hoạt động chính của đời sống và giáo dục. Nhà ở chống chịu được là trung tâm năng lực thích ứng của hầu hết các gia đình. Năng lực thích ứng là khả năng giữ và sử dụng tài sản để đáp ứng nhu cầu đang nổi lên khi điều kiện thay đổi.

²⁷ Nguyen Trong Hieu, Pham Thi Lan Huong, Vu Van Thang và Nguyen Thi Lan (2012) Hạn hán và mối quan hệ giữa ENSO và khô hạn. Báo cáo trình bày tại Hội nghị quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và BĐKH lần thứ 15, Hanoi; trang 39-45

²⁸ UN Viet Nam (2012). Giảm nghèo bền vững và quản lý rủi ro thiên tai tại các tỉnh duyên hải Trung bộ: Bài học kinh nghiệm và gợi ý chính sách.

E.4.2. Nhu cầu tài chính, kinh tế, xã hội và thể chế

178. Nhu cầu thích ứng dự kiến sẽ tăng lên đáng kể vì tác động của BĐKH và nước biển dâng tăng. Có nhu cầu cấp bách để tìm ra những cơ chế thích ứng tiết kiệm và do cộng đồng chủ trì. Theo dự tính của 2015 INDC, Việt Nam hiện chỉ đáp ứng được 30% vốn cần có hàng năm cho các dự án thích ứng đã được phê duyệt hiện hành từ nguồn thu và vay của Chính phủ. Số thiếu hụt hiện phải được bù đắp bằng ODA hay nguồn vốn khác của tỉnh, và thậm chí khi đã tính đến các nguồn này thiếu hụt vốn vẫn tồn tại ở tất cả các cấp. Rà soát vốn đầu tư BĐKH năm 2015 của Việt Nam cho thấy các khoản đầu tư không được đáp ứng theo yêu cầu riêng trong lĩnh vực thủy lợi là 120 triệu đô la Mỹ hàng năm (CPEIR 2015).

179. Không chỉ thị trường vốn thiếu hụt trầm trọng mà thị trường chuyển giao và chia sẻ rủi ro hầu như cũng không tồn tại, đặc biệt ở vùng nông thôn. Trong thực tế, Chính phủ Việt Nam chịu hầu như toàn bộ trách nhiệm trực tiếp cho các chi phí của các sự cố cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu. Theo dự báo BĐKH của Việt Nam và xu hướng phát triển của quốc gia hiện nay, có thể thấy đầu tư tập trung vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ khu vực ven biển, bảo vệ thành quả phát triển thông qua chuyển giao và chia sẻ rủi ro có ưu tiên ngày càng cao. Tuy nhiên, phát triển thị trường chuyển giao rủi ro bị cản trở đáng kể do chất lượng và khả năng tiếp cận dữ liệu thấp.

180. Về mặt thể chế, Việt Nam đã xây dựng được một năng lực thể chế mạnh mẽ và khuôn khổ pháp lý cho việc giảm rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, năng lực thực thi hạn chế đã mở rộng qui mô thực hiện, nhất là về công nghệ và tài chính cũng như lập kế hoạch đa ngành.

181. Tài trợ của GCF sẽ hỗ trợ xây dựng năng lực kỹ thuật cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cán bộ quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu và về lập bản đồ rủi ro và lập kế hoạch. Một phần của công việc này cũng sẽ tập trung vào nâng cao năng lực của cán bộ Chính phủ liên quan đến rủi ro và giả định xác suất trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Điều này sẽ bao gồm việc xác định các tác động và cách tiếp cận tăng cường đối với những rủi ro khi có thể khôi phục / tái thiết và làm nổi bật tác động mà khôi phục hồi và tái thiết là không thể và yêu cầu có chiến lược thay thế.

E.5. Quyền sở hữu của nước tiếp nhận

Quyền sở hữu của (các) nước hưởng lợi của, và năng lực thực hiện, dự án/chương trình được tài trợ

E.5.1. Có tồn tại một chiến lược khí hậu quốc gia và gắn kết với các kế hoạch và chính sách hiện hành bao gồm NAMAs, NAPAs và NAPs

182. Dự án được thiết kế để giải quyết những khó khăn cụ thể được coi là ưu tiên trong các kế hoạch chiến lược chính của đất nước:

183. Thông qua Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 2011-2020, Việt Nam mong muốn đạt được một nền kinh tế các bon thấp và làm giàu vốn tự nhiên. Tăng trưởng xanh là định hướng chủ đạo hướng tới phát triển kinh tế bền vững, và giảm phát thải khí nhà kính, tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính và dần dần trở thành các chỉ số quan trọng, bắt buộc trong phát triển KTXH. Trong những khu vực dễ bị tổn thương cao vì BĐKH, hạ tầng cơ sở-đô thị hoá bền vững nên thích ứng với BĐKH để giảm nhẹ tổn thất về kinh tế.

184. Chiến lược PTBV 2012-2020 ghi rằng mục tiêu tổng quan của chiến lược là phát triển hiệu quả và bền vững phải đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường và TNTN, ổn định chính trị-xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập-chủ quyền-thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Cụ thể chiến lược nhằm giảm ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai, chủ động ứng phó hiệu quả với BĐKH. Điều này bao gồm xếp thứ tự ưu tiên nguồn lực cho giảm nghèo và nâng cao đời sống của nhân dân ở các vùng khó khăn nhất, cũng như cho người nghèo và hộ gia đình nghèo xây dựng nhà cửa.

185. Chiến lược quốc gia về BĐKH 2011-2020 hướng tới chủ động đối phó với thiên tai và theo dõi khí hậu. Chiến lược ghi cụ thể trong khuôn khổ chức năng của mình giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra thông qua:

- rà soát và thiết kế các qui hoạch/kế hoạch phát triển và tiêu chuẩn xây dựng trong những vùng thường xuyên chịu thiên tai ứng phó với sự tăng lên của thiên tai do BĐKH.
- nâng cao chất lượng rừng và trồng rừng, bao gồm phủ xanh đất trống đồi núi trọc, khai thác có hiệu quả các loại rừng khác nhau nhằm đảm bảo và nâng cao sức chống chịu trước thiên tai, phòng ngừa sa mạc hoá, xói mòn

và suy thoái đất, tăng cường bảo vệ, quản lý và phát triển rừng ngập mặn và các hệ sinh thái đất ngập nước, và tăng tỉ lệ che phủ rừng lên 45% vào năm 2020.

186. Chiến lược Bảo vệ môi trường đến 2020 với tầm nhìn đến 2030 ghi rõ các giải pháp phục hồi và tái sinh các hệ sinh thái tự nhiên, nhất là rừng ngập mặn, cũng như nêu các giải pháp tăng tỉ lệ che phủ rừng và cải thiện chất lượng rừng. Bao gồm:

- khảo sát và đánh giá mức độ thoái hoá và suy thoái của các hệ sinh thái tự nhiên cụ thể và đại diện, nhất là rừng ngập mặn, sau đó thiết kế các kế hoạch để phục hồi.
- thực hiện các chương trình tìm hiểu và huy động các nguồn ODA và các nguồn khác từ các ngành và tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên, tăng khả năng chống chịu trước BĐKH, tìm ra các cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng hướng tới thúc đẩy phục hồi, tái tạo và bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên
- địa phương hoá và bảo vệ rừng tự nhiên, đặc biệt là rừng ngập mặn, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng đầu nguồn, đồng thời ngăn chặn tình trạng phá rừng và khai thác bất hợp pháp, tiếp tục trồng rừng và bảo vệ rừng nhằm đảm bảo lâm nghiệp bền vững; quản lý chặt chẽ việc cho thuê đất rừng, nhất là rừng phòng hộ và rừng đầu nguồn.

187. Chiến lược quốc gia về Bảo tồn ĐDSH tới 2020 và tầm nhìn đến 2030: tập trung bảo tồn và quản lý bền vững các hệ sinh thái rừng quan trọng, các loài có nguy cơ tuyệt chủng và nguồn gen. Mục tiêu của chính sách này là tăng diện tích hệ sinh thái tự nhiên trong đất liền lên 9% diện tích đất nước; 45% tỉ lệ che phủ rừng; 15% hệ sinh thái bị suy thoái được phục hồi; Mục tiêu đến năm 2030 đạt được 25% hệ sinh thái tự nhiên có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế.

188. Giải pháp 7 của Kế hoạch phát triển KTXH trong giai đoạn 2011-2015 tập trung cải thiện và nâng cao năng suất và hiệu quả của chính sách và luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên nhằm đảm bảo phát triển bền vững. Quan trọng hơn, Kế hoạch khuyến khích sự tham gia rộng rãi của xã hội trong bảo vệ môi trường, phần này được phản ánh rõ trong cách tiếp cận dựa vào cộng đồng của dự án GCF.

189. Trong khi đã có chính sách và các thể chế quốc gia mạnh, điểm còn thiếu là sự phối hợp liên bộ, có thể đảm bảo thông báo rủi ro và lập kế hoạch phát triển chống chịu với khí hậu. Đề xuất GCF không chỉ đề cập đến sự thay đổi nhiều mặt mà cách tiếp cận tổng hợp của đề xuất còn thúc đẩy nhu cầu phối hợp này.

E.5.2. Năng lực của các tổ chức được công nhận và cơ quan điều hành thực hiện dự án

190. Kể từ khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 1977, UNDP đã đóng góp đáng kể vào bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH, đặc biệt trong việc tạo thuận lợi để tạo lập chính sách, chiến lược, luật, phối hợp và chia sẻ thông tin. UNDP có đội ngũ các chuyên gia trình độ cao cả chuyên gia trong nước và quốc tế, giúp UNDP chuyển tải cách tiếp cận toàn diện trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.

191. UNDP là đối tác lâu năm của Chính phủ Việt Nam. UNDP đã hỗ trợ rất nhiều quá trình tạo lập chính sách khác nhau ở Việt Nam, gồm:

- Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH (NTP-RCC 2008)
- Các kịch bản BĐKH (2009 and 2011)
- Chiến lược BĐKH (2012),
- Chiến lược tăng trưởng xanh (2012) và kế hoạch hành động tăng trưởng xanh (2014)
- Chiến lược quốc gia về DRM (2007) và KHHĐ DRM 2009
- Chiến lược và KHHĐ đa dạng sinh học quốc gia (2012)

192. UNDP đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các nhà ra quyết định, và chứng tỏ thế mạnh của mình là một nhà hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật vô tư. Các lĩnh vực phát triển ưu tiên cho Việt Nam là cơ sở để UNDP hỗ trợ chính sách. UNDP cũng đóng vai trò tư vấn trong quá trình chuẩn bị và phê duyệt các luật và qui định pháp lý liên quan ở Việt Nam. UNDP được công nhận là một tổ chức có kinh nghiệm trong phát triển thể chế và xây dựng năng lực, mang trọng tâm lâu dài, thể chế và con người là trung tâm vào xây dựng năng lực.

193. Với vai trò trung tâm trong hệ thống LHQ, UNDP tạo thuận lợi cho cách tiếp cận đa ngành nhằm giúp Chính phủ ứng phó với các vấn đề phức tạp như BĐKH và tăng trưởng xanh. UNDP đã cung cấp đầu vào kỹ thuật để chuẩn bị và tham vấn cho một số khung pháp lý quan trọng, trong đó có Luật Đa dạng sinh học năm 2008, Luật bảo toàn và tiết kiệm năng lượng 2010, Luật Phòng chống thiên tai năm 2012, Luật Bảo vệ môi trường 2014 trong đó có một chương về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, và thực hiện Luật thuế bảo vệ môi trường, Luật thuế tài nguyên liên quan đến quản lý tài nguyên thiên nhiên.
194. Với đặc tính của một cơ quan đa biên, UNDP có thể thúc đẩy phổ biến các tiêu chuẩn quốc tế, trợ giúp hỗ trợ kỹ thuật kinh nghiệm và thông lệ tốt để thực hiện ở Việt Nam. UNDP đã chứng tỏ cam kết lâu dài của mình trong cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nhằm ảnh hưởng và duy trì thay đổi thể chế cần thiết trong việc thực hiện những cải thiện rõ ràng về năng lực thể chế. UNDP hiện có 6 danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật về BĐKH với các bộ quan trọng như Bộ KHĐT, NNPTNT, Xây dựng và Công thương. UNDP cũng đang phối hợp chặt chẽ làm việc về tiết kiệm năng lượng với Bộ Công thương và Bộ Giao thông, gắn kết người làm chính sách với một cộng đồng toàn cầu có kinh nghiệm thực tế trong các vấn đề chính sách quan trọng và cung cấp nền tảng cho việc chia sẻ các bài học và kinh nghiệm quốc tế.
195. Qua hỗ trợ bốn bộ đóng vai trò chính về các vấn đề quản lý rủi ro thiên tai, BĐKH, tăng trưởng xanh, UNDP đã ở một vị trí giúp nâng cao năng lực điều phối về tổ chức và liên ngành, và khuyến khích các cách tiếp cận hài hoà với các vấn đề về BĐKH của Chính phủ, khu vực tư nhân, nhà tài trợ và các tổ chức khác.
196. UNDP thực hiện các hoạt động dựa vào kết quả và đảm bảo các đối tác thực hiện/cơ quan điều hành được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để đạt được các hoạt động và kết quả dự án mong chờ. Tăng cường và mở rộng việc phân tích trong các khu vực quan trọng và thúc đẩy các kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu trong bối cảnh rộng lớn hơn của sự phát triển bền vững, hỗ trợ của UNDP cho mạng lưới và các tổ chức nghiên cứu là rất quan trọng để được tư vấn và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật kịp thời cho Chính phủ Việt Nam.
197. Dự án cũng sẽ hưởng lợi từ chuyên môn và nguồn lực của các dự án UNDP đang thực hiện với các Bộ KHĐT, NNPTNT, TNMT và Xây dựng như:
- Dự án của Bộ KHĐT về “Tăng cường năng lực và cải cách thể chế cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam” (CIGG)
 - Dự án của Bộ NNPTNT về “Tăng cường năng lực thể chế cho quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam bao gồm rủi ro liên quan đến BĐKH” (SCDM giai đoạn II);
 - Dự án liên Bộ NNPTNT-TNMT về “Xây dựng năng lực thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH ở Việt Nam” (CBICS Project);
 - Dự án của Bộ NNPTNT về “Củng cố cơ sở hạ tầng chống chịu khí hậu ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam”
 - Dự án của Bộ Xây dựng về “Thúc đẩy năng lực hiệu quả trong xây dựng nhà thương mại và nhà ở cao tầng”
 - Dự án của Bộ Xây dựng về “Thúc đẩy việc sản xuất và sử dụng gạch không nung tại Việt Nam”.
198. Bộ NNPTNT là cơ quan triển khai dự án. Với nhiệm vụ xuyên suốt liên quan đến phòng chống và kiểm soát thiên tai, Bộ NNPTNT là cơ quan phù hợp chủ trì thực hiện dự án này. Bộ NNPTNT có vai trò điều phối chiến lược trong Ủy ban Quốc gia về Phòng chống và Kiểm soát Thiên tai. Bộ NNPTNT đã trải qua quá trình đánh giá năng lực bắt buộc đối với các dự án do UNDP quản lý và được thực hiện theo mô hình Quốc gia thực hiện (NIM). Trong quá trình đánh giá này, Bộ đã trải qua các đánh giá cụ thể về năng lực quản lý kỹ thuật, hành chính và tài chính, và đã đáp ứng được các yêu cầu của phía UNDP trên tất cả các tiêu chí đánh giá. Cần lưu ý rằng kết quả đánh giá năng lực cho thấy Bộ NNPTNT có năng lực triển khai cao (80%), mặc dù trước kia kết quả kiểm toán còn chưa tốt. Giữa UNDP và Bộ NNPTNT đã có một quá trình hợp tác lâu dài và thành công, bao gồm chương trình CBDRM và chương trình UN-REDD.

E.5.3. Sự tham gia của các cơ quan quốc gia có thẩm quyền (NDAs), tổ chức xã hội dân sự và các bên liên quan khác

199. Dự án đề xuất được thiết kế với sự phối hợp chặt chẽ với Chính phủ (cả cấp trung ương và địa phương) các tổ chức dân sự xã hội, các đối tác phát triển và những người hưởng lợi. Những cuộc tham vấn chính bao gồm:

- UNDP và MPI, MARD và GCF họp về ý tưởng và thiết kế đề xuất và kế hoạch làm việc, 12-16/1/2015
- UNDP và MPI sàng lọc ý tưởng, 2/4/2015
- Chuyên gia UNDP và MARD hoàn thiện ý tưởng và xây dựng đề xuất, 7/5/2015
- Tham vấn UNDP ROAP và chuyên gia, lãnh đạo MARD tại Bonn đầu 6/2015
- UNDP, MARD và MOC chuẩn bị viết dự án 25/6/ 2015
- UNDP, MARD, MOC và MPI xem xét thiết kế văn kiện dự án 10/7/2015
- Hội thảo tham vấn và thẩm định khả thi giữa UNDP, MARD và các tỉnh 13-14/7/2015
- Chuyển đi thực địa của UNDP, MARD và các tỉnh tới Đà để tạo ra Nẵng và Quảng Nam
- Hợp ban thẩm định dự án địa phương của UNDP (LPAC), (13-16/7/2015)

200. NDA, có trụ sở tại Bộ KH & ĐT, cũng đã thường xuyên thông báo về tiến độ của việc xây dựng đề xuất.

201. Dự án đề xuất GCF xây dựng dựa trên các sáng kiến hiện có, với sự tham gia của nhiều đối tác bao gồm các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế như Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội phụ nữ Việt Nam, và Oxfam. Trong giai đoạn khởi động dự án, UNDP, Bộ NNPTNT và Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tham vấn với các INGO và khu vực tư nhân thiết lập lộ trình và kế hoạch hành động đối tác cụ thể, hưởng lợi từ các thông lệ tốt và mối quan hệ công tác hiện có và thiết lập quan hệ kỹ thuật giữa Bộ NNPTNT, Bộ Xây dựng và các NGO quốc tế và trong nước.

202. Để đảm bảo quan điểm của phụ nữ được ghi nhận trong việc thiết kế các đề xuất dự án này, những nỗ lực cụ thể đã được thực hiện để tham khảo ý kiến với các nhóm phụ nữ, và để thu thập thông tin liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu đối với phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được tham vấn cụ thể ở cả cấp quốc gia và địa phương, và các đoàn đi hiện trường đã cẩn thận tham khảo ý kiến với cả phụ nữ và nam giới liên quan đến bài học kinh nghiệm cho đến nay. Dự án cũng được hưởng lợi từ những bài học quan trọng đã học trong các dự án thí điểm trước đó đã cụ thể chú trọng gia tăng sự tham gia của phụ nữ, người già, thanh niên và các nhóm dễ bị tổn thương khác. Thông tin phản hồi và bài học kinh nghiệm từ rà soát các dự án trước và rà soát chính sách đã được áp dụng trong thiết kế các hoạt động. Việc áp dụng các phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng trong quá trình thực hiện cũng sẽ đảm bảo rằng thông tin liên lạc thường xuyên được duy trì trong suốt quá trình thực hiện dự án với các đại diện cấp xã, ít nhất 30% trong số đó sẽ là phụ nữ.

203. Dự án cũng sẽ tập hợp chuyên môn và kỹ năng của cộng đồng làm khoa học. Các cơ sở kỹ thuật và viện khoa học bao gồm IMHEN (đầu mối kỹ thuật chính thức về dự báo khí hậu), Viện khoa học thủy lợi Việt Nam (đầu mối kỹ thuật chính thức về rủi ro lũ lụt và lập bản đồ lũ lụt), Viện khoa học kỹ thuật xây dựng (đầu mối kỹ thuật chính thức về tiêu chuẩn nhà ở và luật xây dựng) và Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam (đầu mối kỹ thuật về lâm nghiệp kể cả đánh giá địa điểm lựa chọn loài cây, các biện pháp kỹ thuật về phục hồi rừng ngập mặn) sẽ tham gia thực hiện dự án. Các đối tượng thuộc khu vực tư nhân, nhất là từ khu vực bảo hiểm cũng sẽ được tham vấn về tăng cường cơ sở dữ liệu về tổn thất và thiệt hại.

204. Trong giai đoạn khởi động dự án, thiết lập lộ trình và kế hoạch hành động đối tác cụ thể, kể cả các thông lệ tốt nhất của Bộ NNPTNT/Bộ Xây dựng và các nhóm công tác kỹ thuật NGO. Dự án cũng hướng tới thiết lập quan hệ đối tác trong việc hỗ trợ các tỉnh mục tiêu thực hiện các sáng kiến của dự án, theo dõi giám sát, và thúc đẩy thực hiện các thông lệ tốt của các chương trình quốc gia.

205. Một kế hoạch tham vấn các bên liên quan sẽ được xây dựng cho dự án trong giai đoạn khởi đầu. Kế hoạch này bao gồm:

- a) các cuộc tham vấn (loại và tần số) đã được thực hiện trong giai đoạn thiết kế, chi tiết của vấn đề thảo luận, bao gồm cả các quan điểm của các bên liên quan và các đối tượng hưởng lợi;
- b) đề nghị tham vấn trong quá trình thực hiện dự án về việc đảm bảo dự án vẫn còn phù hợp và cập nhật với các tác động của dự án ở cấp quốc gia, tỉnh, xã và cộng đồng;

- c) Các chi tiết về cách thức tham vấn cụ thể nhằm tới các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, người khuyết tật, người già và người ở các khu ổ chuột và những tác động gì của dự án sẽ ảnh hưởng đến họ trong ngắn, trung và dài hạn với các chi tiết làm thế nào những tác động đó được xem xét trong quá trình ra quyết định;
- d) bổ sung với các chương trình có liên quan hoặc phù hợp để phát huy tối đa tác động của các nguồn lực kết hợp;
- e) Các chi tiết về cách giải quyết, xử lý các ý kiến trong quá trình tham vấn của các bên bị ảnh hưởng ; và
- f) thường xuyên rà soát kế hoạch để đảm bảo các bên liên quan mới được tính đến trong các kế hoạch có liên quan.

206. Kế hoạch này sẽ chứng minh sự tham gia của các bên có liên quan là một quá trình liên tục, được gộp vào trong cả vòng đời của dự án như thế nào và mức độ cùng chịu trách nhiệm cũng như tính minh bạch sẽ xuất hiện như một phần của quá trình liên tục trong thời gian xây dựng và hoạt động. Kế hoạch này sẽ phác thảo cách khuyến khích các bên liên quan bao gồm cả phụ nữ tham gia vào dự án, và trao quyền cho họ thực hiện các hành động thực tế để giải quyết bất kỳ vấn đề gì có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

207. Ban quản lý dự án tiếp tục cung cấp một cơ cấu chính thức cho Bộ KH & ĐT, Bộ NN & PTNT, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, các điểm đầu mối của tỉnh và các đối tượng hưởng lợi để đưa ra hướng dẫn triển khai dự án, hướng đến việc cùng hợp tác đạt được mục tiêu của dự án

E.6. Năng suất và hiệu quả

Lành mạnh về kinh tế và nếu thích hợp, về tài chính của chương trình/dự án

E.6.1. Năng suất và hiệu quả sử dụng chi phí

208. Dự án sẽ hỗ trợ trực tiếp để nhân rộng các phương pháp đã được kiểm nghiệm và được Chính phủ Việt Nam phê duyệt và đang được ưu tiên tích cực để tăng quy mô và nhân rộng. Một bản tóm tắt về dữ liệu năng suất và hiệu quả của các phương pháp này được cung cấp dưới đây:

209. **Nhà ở chống chịu được khí hậu:** trong dự án này, các kịch bản làm cơ sở cho đầu tư lựa chọn ưu tiên các phương án nhà ở chống chịu được khí hậu giả định rằng tần suất và cường độ của bão sẽ vẫn tương tự như 25 năm qua. Lợi ích từ nhà ở chống chịu được khí hậu là tránh được những thiệt hại khi có bão. Cuộc thi thiết kế nhà ở và nghiên cứu “Nhà ở từ một cơn bão lớn” (xem Phụ lục XV) chỉ ra tỉ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) mong muốn cho các công trình xây dựng nhà ở mới với các tính năng chống chịu bão.

210. **Tái sinh rừng ngập mặn:** Chi phí phục hồi rừng ngập mặn bao gồm nhân giống / cây giống và quản lý lâu dài cần thiết cho tỷ lệ sống của rừng ngập mặn cao. Tái sinh rừng ngập mặn sẽ áp dụng một định mức 1.500 USD cho mỗi ha. Trồng lại sẽ được xem xét với diện tích nhỏ hơn nếu cần thiết, áp dụng định mức 6.000 USD cho mỗi ha. Các thông lệ tốt nhất áp dụng cho tái sinh rừng ngập mặn thuộc dự án này đã có một tỷ lệ thành công là 80%, một sự cải thiện đáng kể so với tỉ lệ 50% nếu sử dụng các cách tiếp cận khác.

211. **Quá trình quản lý rủi ro thiên tai, đánh giá tổn thương và lập kế hoạch dựa vào cộng đồng** đã được Bộ NN & PTNT phê duyệt trong năm 2014. Đầu tư toàn cầu trong phòng ngừa thiên tai đã được ước tính là chi phí hiệu quả hơn bốn lần so với ứng phó thiên tai, đồng thời làm giảm chấn thương và thương vong trong khu vực mục tiêu.

212. Xét về lợi ích hấp thụ CO₂, một nghiên cứu năm 2011 về trên và dưới mặt đất, bao gồm cả tỉ lệ hấp thụ khá đối với rừng ngập mặn trên một khu vực rộng (mở rộng vĩ độ 30 ° và kinh độ 73 °) của khu vực Indo -Thái Bình Dương phát hiện ra rằng tổng lưu trữ carbon (của rừng ngập mặn-Ind) là rất cao so với hầu hết các loại rừng, với giá trị trung bình 1,043 và trong khoảng 437 đến 2,186 Mg C ha⁻¹ (tấn carbon

mỗi ha mỗi năm). Các nghiên cứu của SNV được đính kèm như là một phần của Phụ lục XV (Tài liệu hỗ trợ bổ sung). Các nghiên cứu ở Việt Nam đã cho thấy rừng ngập mặn trưởng thành ở vị trí tương tự có khả năng hấp thụ trong khu vực của 20-25100 tấn CO₂ mỗi ha mỗi năm, cho thấy rằng lợi ích hàng năm từ dự án sẽ có trong khu vực là 84.000-105.000t mỗi năm, trừ đi mọi phát thải do các hoạt động liên quan đến trồng lại / tái sinh. (Phương, 2015) .

E.6.2. Đồng tài trợ, cân đối và huy động đầu tư dài hạn (chỉ giảm thiểu)

213. Đồng tài trợ đã được xác định cho ba kết quả đầu ra của dự án GCF là:

- Trong Kết quả đầu ra 1, GCF sẽ hỗ trợ chi phí bổ sung cho các tính năng chống chịu khí hậu (\$ 2,000) cho 4.000 nhà ở thuộc Chương trình quốc gia cung cấp các chính sách và giải pháp hỗ trợ cho các hộ nghèo xây nhà chống chịu bão lụt. 4.000 nhà mục tiêu sẽ nhận được sự hỗ trợ của Bộ Xây dựng dựa trên thiết kế nhà hiện có, ước tính khoảng \$ 2000/nhà. Do đó đồng tài trợ liên quan đến 4.000 ngôi nhà cụ thể mục tiêu của dự án ước tính là 8 triệu US\$, hoặc 2.000 \$/nhà.
- **Đối với kết quả đầu ra 2 (tái sinh rừng ngập mặn), 1.406.625 \$ 516.600 \$ được tính là tiền đồng tài trợ từ phía Bộ NNPTNT. Khoản kinh phí này bao gồm 1.226.625\$ cho chi phí bảo trì, sẽ phải được tính đến trong 20 năm tiếp theo cho việc duy trì các khu vực tái sinh. Ước tính 180.000\$ là đóng góp (in-kind: cơ sở vật chất, đóng góp của cán bộ) từ chính phủ.**
- Đồng tài trợ của UNDP trong kết quả 3 góp phần cải thiện thông tin thiên tai và khí hậu và khí hậu, cũng như lồng ghép vào quá trình lập kế hoạch. Theo đó, 1.600.000 \$ có thể được xem là đồng tài trợ trực tiếp.

214. Tham khảo Phụ lục IV các Thư khẳng định/ cam kết.

E.6.3. Khả năng tài chính sinh lời

215. Dự án này dựa hoàn toàn vào viện trợ không hoàn lại (a) Theo chính sách của Chính phủ Việt Nam, thích ứng nên được tài trợ bởi nguồn viện trợ không hoàn lại; (b) các biện pháp can thiệp được đề xuất là hàng hoá công và (c) các hoạt động không tạo thu nhập. Vì dự án được đề xuất không tạo thu nhập, đánh giá khả năng tài chính sinh lời truyền thống là không thích hợp.

E.6.4. Áp dụng những thông lệ tốt nhất

216. Thiết kế các thành tố dự án được trực tiếp xây dựng dựa trên các dự án thí điểm thành công hiện tại cho tất cả các kết quả đầu ra như đã nêu ở trên.

217. Thiết kế nhà ở được phê duyệt trong mục kết quả đầu ra 1 là kết quả của việc tăng cường các chương trình nhà ở thí điểm của chính phủ, và được củng cố bởi báo cáo **Nhà ở từ một cơn bão lớn: Chống chịu bão tại Việt Nam, năm 2014** (xem Phụ lục XV). Báo cáo này mô tả chi tiết dự án nhà ở thí điểm tại Đà Nẵng, nơi các thiết kế nhà ở đã được tăng cường thêm một tầng lửng ở trên mức lũ dự báo để bảo vệ khỏi nước lũ, và các bức tường và mái nhà được gia cố để chịu được gió, bão mạnh hơn. Phân tích kinh tế cũng cho kết quả định lượng CBA, hoàn vốn đầu tư vào nhà ở chống chịu bão cao trong một số kịch bản, có nghĩa là đầu tư vào nhà ở chịu bão có thể có hiệu quả kinh tế. Kết quả CBA định tính cũng cho thấy rằng nhà ở chống chịu bão thể hiện BCRs cao trong một số kịch bản, và khuyến khích chính phủ tiếp tục hỗ trợ các hộ gia đình đã đồng ý thực hiện các biện pháp xây nhà ở chống chịu khí hậu thích hợp. Loại hỗ trợ bổ sung này đang được đề xuất trong đề xuất GCF, để trang trải các chi phí gia tăng của các tính năng an toàn bổ sung.

218. Báo cáo nghiên cứu Phục hồi rừng ngập mặn ven biển ở Việt Nam (kèm theo tại Phụ lục VIII) bao gồm một nghiên cứu kỹ lưỡng về độ che phủ rừng ngập mặn hiện nay ở Việt Nam và các sức ép liên quan. Quan trọng hơn, nó cũng bao gồm việc đánh giá các nỗ lực tái sinh rừng ngập

mặn trước kia và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện tỷ lệ tái sinh rừng ngập mặn thành công của những nỗ lực sau này. Báo cáo nhấn mạnh rằng các khu rừng ngập mặn khỏe có một cấu trúc đa dạng theo cả chiều dọc và ngang, cũng như về thành phần loài. Để đảm bảo tái sinh thành công, báo cáo đề xuất cải thiện thông qua nhân giống cây (phương án vườn ươm để đảm bảo cây đạt mức độ phát triển nhất định trước khi đưa ra trồng), lựa chọn địa điểm và phương pháp trồng. Những cải tiến này được tiếp thu trong phương pháp tái tạo rừng ngập mặn của dự án GCF.

219. Hơn nữa, quá trình xây dựng dự án được hỗ trợ trực tiếp bởi những bài học kinh nghiệm và lồng ghép vào các chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai của Chính phủ. Ngoài ra, kết quả của các nghiên cứu quốc tế quan trọng như Đánh giá đầu tư và chi tiêu công khí hậu (CPIER), cũng như các khuyến nghị của nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới 2010 Vượt qua bão tố: Các phương án lựa chọn tài chính rủi ro thiên tai tại Việt Nam. Một bản tóm tắt của các tài liệu được cung cấp dưới đây và có trong Phụ lục XIII.

220. Ngoài ra, xin vui lòng xem Phụ lục II cho các nghiên cứu khả thi thực hiện cho dự án này.

E.6.5. Các chỉ số năng suất và hiệu quả chính

Các chỉ số cốt lõi GCF	Chi phí dự toán cho một tấn CO ₂ tương đương, được xác định như tổng chi phí đầu tư /vòng đời dự tính để giảm phát thải (chỉ giảm phát thải)	
	(a) Tổng tài trợ của dự án	US\$ 12.936.625
	(b) Số tiền yêu cầu từ GCF	US\$ 11.053.000 ____
	(c) Thêm thời gian vòng đời dự tính để giảm phát thải	1.860.720 tCO ₂ eq
	(d) Dự tính chi phí cho một tCO ₂ eq ($d = a / c$)	US\$ <u>6,95</u> / tCO ₂ eq
	(e) Dự tính chi phí GCF để loại bỏ một tCO ₂ eq ($e = b / c$)	US\$ <u>6,20</u> / tCO ₂ eq
	Khối lượng tài trợ dự kiến để được cân đối bởi dự án / chương trình đề xuất và là kết quả tài trợ của Quỹ, phân tách theo nguồn công và tư nhân (chỉ cho lĩnh vực giảm thiểu)	
	221. Rừng ngập mặn phục vụ một đồng mục tiêu chính về thích ứng nhằm giảm nhẹ các tác động của thiên tai do khí hậu, như bão lốc, bão nhiệt đới, triều cường, v.v... Các nguồn quỹ công được cam kết cho việc duy trì các khu vực rừng ngập mặn tái sinh là 1.406.625\$. Đây được xem là một nguồn đồng tài trợ từ phía Bộ NNPTNT, kèm theo một thư cam kết tài trợ (Phụ lục IV)	

Các chỉ số có liên quan khác (vd. chi phí ước tính cho đồng hưởng lợi tạo ra như kết quả của chương trình/dự án)

F.1. Phân tích kinh tế và tài chính

222. Dự án dựa vào viện trợ không hoàn lại vì (a) các biện pháp can thiệp dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho các gia đình dễ bị tổn thương được Chính phủ xác định là nghèo, (b) tăng cường phòng thủ tự nhiên chứng minh giá trị công và (c) không tạo ra doanh thu phù hợp để cung cấp dòng tiền hoàn lại cho GCF. Khi dự án được đề xuất là không tạo thu nhập, phân tích tài chính truyền thống là không phù hợp

223. Phân tích kinh tế của đề xuất, thực hiện trong giai đoạn thiết kế, cho thấy dự án có tỷ lệ hoàn vốn nội bộ kinh tế dự kiến là 14,6%, vượt quá 10% chỉ phí cơ hội kinh tế của vốn. Các hạng mục đầu tư được đề xuất trong dự án là khả thi về mặt kinh tế, trên cơ sở tính giá trị tối thiểu của rừng ngập mặn, không tính đến VSL (giá trị của cuộc sống thống kê), và kịch bản "trường hợp xấu nhất" khi chi phí tăng 20% hoặc lợi ích giảm 20%. Các EIRR (tỷ lệ hoàn vốn nội bộ kinh tế) trong những kịch bản đó tương ứng là 11,2% và 11,8%, cao hơn 10% so với tỷ lệ chiết khấu giả định. Cần lưu ý rằng các ước tính được sử dụng trong phân tích kinh tế là ước tính thận trọng với những giá trị lợi ích tối thiểu được sử dụng trong tất cả các tính toán lợi ích. Giữ tất cả các giả định khác, giống như trên nhưng bao gồm cả giá trị của cuộc sống thống kê (VSL) trong phân tích lợi ích chi phí cho kết quả khoảng 66.944.868 USD với giá trị chiết khấu hiện tại. Tỷ lệ hoàn vốn kinh tế theo giả định này là 36,7%. Các chi tiết của phân tích kinh tế được thể hiện trong Phụ lục XII của đề xuất này.

224. Việc sử dụng 10% tỷ lệ chiết khấu dựa trên cơ sở bản chất các lợi ích từ dự án. Thường với hàng hoá môi trường, chúng tôi thường biện luận cho tỷ lệ chiết khấu dưới 10% tỷ lệ thường dùng. Tuy nhiên, do chi phí hiện nay tại quốc gia, tỷ lệ dưới 10% là không thể giải trình rõ được. Để phù hợp với quan điểm của Bộ Xây dựng và các chuyên gia, vòng đời hữu ích cho nhà ở và rừng ngập mặn được chọn là 20-25 năm. Để thận trọng, chúng tôi dùng vòng đời 20 năm cho nhà ở và rừng ngập mặn.

225. Lợi ích kinh tế được lượng giá trong phân tích kinh tế của dự án và dựa trên việc dự án sẽ giảm các hiểm hoạ bão, lốc tố và lũ lụt. Phân tích kinh tế được chuẩn bị dựa trên trường hợp nền về các thiệt hại tránh được nhờ có dự án.

226. Các lợi ích khác như giá trị dữ liệu đã cải thiện về khí hậu, an ninh mạng sống và tài sản và các lợi ích xã hội khác có được nhờ có nhà ở tốt hơn không dễ định lượng và trong một số trường hợp sự tin tưởng về giá trị có thể thấp hơn. Hàm ý bỏ qua những lợi ích bổ sung là các ước tính kinh tế IRR và NPV sẽ là ràng buộc thấp hơn và cung cấp ước tính thận trọng về giá trị của dự án.

F.2. Đánh giá kỹ thuật

227. Phần này tập trung vào hai giải pháp kỹ thuật chính được lựa chọn liên quan tới kết quả đầu ra về nhà ở và rừng ngập mặn.

228. Thiết kế nhà được hỗ trợ bằng vốn GCF bắt nguồn từ các bài học kinh nghiệm trong chương trình nhà ở thí điểm, thiết kế nhà của dự án cũng được kế thừa từ nghiên cứu thí điểm thành công ở Đà Nẵng. Báo cáo **Nhà ở từ một cơn bão lớn: Chống chịu bão ở Việt Nam 2014** (xem Phụ lục XV) nêu rõ các kết quả phân tích và cuộc thi thiết kế nhà ở tại Đà Nẵng. Xây dựng từ thiết kế được giải, thiết kế được dự án hỗ trợ sẽ đưa vào các tính năng quan trọng trong khi vẫn giữ giá phải chăng cho người hưởng lợi là những người nghèo của Việt Nam, vì giá cả phải chăng là một thành tố quan trọng để mở rộng và là tiềm năng cho nhân rộng.

229. Dự án cũng hỗ trợ xây nhà mới, trái ngược với sửa sang nhà hiện có. Theo báo cáo, vòng đời của một căn nhà mới là 15-20 năm, khác xa với 7-10 năm của nhà sửa lại. Thiết kế nhà được giải bao gồm cả thiết kế nhà có gác lửng trên mức nước lũ dự báo để bảo vệ khỏi nước lũ, và gia cố tường và mái để chống chọi tốt hơn với bão lũ. Phân tích kinh tế trong báo cáo cho thấy kết quả định lượng CBA, trong đó việc hoàn vốn của các nhà chống chịu với bão cao hơn trong một số kịch bản, nghĩa là đầu tư vào nhà chống chịu với bão có thể có hiệu quả kinh tế. Kết quả định lượng CBA cũng chỉ ra rằng nhà chống chịu bão cho thấy BRC cao trong một số kịch bản, và khuyến khích Chính phủ tiếp tục các phương thức hỗ trợ các hộ gia đình đã đồng ý thực hiện các biện pháp thích hợp xây nhà ở chống chịu khí hậu.

230. Báo cáo nghiên cứu Phục hồi rừng ngập mặn ven biển ở Việt Nam 2012, có nghiên cứu kỹ lưỡng tỉ lệ che phủ rừng ngập mặn hiện có ở Việt Nam và các sức ép có liên quan. Quan trọng hơn, báo cáo cũng có đánh giá những nỗ lực tái sinh rừng ngập mặn trước kia và đưa ra các khuyến nghị để nâng cao tỉ lệ thành công của các nỗ lực tái sinh rừng ngập mặn sắp tới. Báo cáo nhấn mạnh rằng rừng ngập mặn khỏe có cấu trúc đa dạng cả về chiều dọc và ngang, cũng như về tổ thành loài. Để đảm bảo tái sinh thành công, báo cáo khuyến nghị cải tạo thông qua nhân giống cây (vườn ươm để đảm bảo mức độ tăng trưởng nhất định trước khi trồng), lựa chọn địa điểm và phương pháp trồng. Những bước cải tiến này được nắm bắt trong phương pháp tái sinh rừng ngập mặn của dự án GCF, và được kỳ vọng sẽ nâng tỷ lệ thành công tái sinh rừng ngập mặn từ 50% đến 80%. Báo cáo đầy đủ trong Phụ lục VIII.

231. Nghiên cứu kỹ thuật khả thi cũng được lập trong quá trình xây dựng đề xuất. Nghiên cứu này để trong Phụ lục II: Nghiên cứu khả thi.

F.3. Đánh giá môi trường xã hội, kể cả xem xét về giới

232. Dự án này đã hoàn thành các thủ tục sàng lọc xã hội và môi trường của UNDP (xem SESP trong Phụ lục VI). Việc sàng lọc này được thực hiện để đảm bảo dự án này phù hợp với tiêu chuẩn xã hội, môi trường của UNDP. Tiêu chuẩn xã hội, môi trường của UNDP được xem xét bởi một Tiểu ban công nhận của GCF và coi là đủ để uỷ nhiệm cho UNDP trình các dự án có rủi ro thấp và trung bình. Các loại rủi ro xã hội và môi trường tổng thể cho dự án này là vừa phải, như nêu rõ dưới đây nếu các biện pháp giảm thiểu đề nghị được thực hiện. Những rủi ro cụ thể của dự án được liệt kê trong Phần G dưới đây. Các biện pháp giảm nhẹ được đề cập trong các phần tiếp theo.

233. Dự án sẽ có một số tác động môi trường, sẽ được quản lý và hạn chế tác động. Trong thời gian trồng rừng ngập mặn, sẽ cần thiết phải tiến hành đào đắp để tái ổn định các khu vực đã dùng để nuôi trồng thủy sản. Công việc đào đắp này sẽ chuyển cát, nếu không để riêng đúng cách, có thể sẽ lấn vào môi trường biển. Để đảm bảo rằng cát sẽ không bị tích tụ, qua gió, hoặc cụ thể hơn do chuyển động của nước, phải chuẩn bị một kế hoạch kiểm soát xói mòn cát. Kế hoạch này bao gồm (nhưng không giới hạn) việc lấp đặt các tấm chắn cát để giảm chuyển động của cát và che chắn cát khi cần.

234. Bất kỳ một hoạt động nào liên quan đến trầm tích sẽ tạo ra nguy cơ phơi nhiễm đất phèn trong phạm vi rừng ngập mặn. Đất nhiễm phèn hoặc có nguy cơ nhiễm phèn thường xảy ra ở các vùng rừng ngập mặn, và thường thấy ở các khu vực duyên hải rộng lớn của Việt Nam²⁹. Đất phèn thường tìm thấy ít hơn 5 m trên mặt nước biển, đặc biệt ở các khu vực ven biển đất thấp nơi có hoạt động của dự án. Rừng ngập mặn, đầm lầy nhiễm mặn, vùng ngập nước lầy, đầm lầy, đất ngập nước, cửa sông và vùng nước lợ hoặc hồ thủy triều là khu vực lý tưởng cho tạo đất phèn và do đó có tiềm năng để thấy có phèn trong vùng dự án. Có khả năng cần yêu cầu kiểm soát quản lý đất phèn và/hay đất có khả năng nhiễm phèn do vị trí của dự án trong các vùng rừng ngập mặn. Sự có mặt của đất phèn có thể không rõ ràng trên bề mặt đất vì thường nó bị chôn lấp dưới nhiều lớp đất lắng đọng và trầm tích có nguồn gốc sông ngòi hay Aeolian. Những đất này chứa khoáng chất sulphua sắt (chiếm đa phần là khoáng chất pyrite) hay các sản phẩm oxy hoá của chúng. Dưới dạng không bị khuấy động dưới mặt nước thì đất phèn lành tính. Tuy nhiên, nếu đất bị rút nước, lật lên hay lộ ra không khí khi hạ mực nước, sulphides phản ứng với oxy tạo ra phèn. Nếu tách phèn khỏi đất lại làm tách sắt, nhôm và các kim loại nặng khác (đặc biệt là arsenic) trong đất. Khi tích tụ, a xít và kim loại có thể tạo ra một loạt các tác động tiêu cực khác kể cả việc giết chết thảm thực vật, thấm thấm và axit hóa nước ngầm và nguồn nước, giết chết cá và các sinh vật thủy sinh khác và làm thoái hóa các cấu trúc thép và bê tông cho đến khi bị phá hủy hẳn. Trước khi đào bới, trầm tích/cát cần phải được xem có đất phèn hay đất có tiềm năng nhiễm phèn trong đó hay không. Nếu phân tích cho kết quả dương tính, trầm tích cần phải được xử lý qua một loạt các kỹ thuật, kể cả và không hạn chế việc trung hoà (cho vôi vào) trầm tích. Sẽ giới thiệu các hướng dẫn và tiêu chuẩn phù hợp³⁰. Mọi cố gắng sẽ được làm để đảm bảo không có tác động trực tiếp hay tác động còn lại sau khi xử lý.

235. Chương trình cũng có thể tạo ra các chất thải liên quan đến xây dựng nhà mới, mặc dù có thể khối lượng không nhiều đến mức gây ra tác động môi trường lớn. Tất cả các chất thải như thủy tinh, bê tông vụn, sắt thép sẽ được cất giữ theo đúng quy cách nhằm giảm tác động đến môi trường. Các chất thải bổ sung cũng có thể phát sinh trong quá trình xây dựng nhà. Trong các trường hợp có thể, các vật liệu này sẽ được xử lý bằng cách đóng khối hoặc cất theo kích cỡ phù hợp trước khi chuyển đến các cộng đồng.

236. Nhìn chung, chương trình có thể sẽ có một vài tác động môi trường, mặc dù các tác động này có thể được giảm nhẹ một cách hiệu quả thông qua việc áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp. Chương trình sẽ tạo ra các ích lợi quan trọng về môi trường trong ngắn hạn và dài hạn, thông qua việc cải thiện chất lượng nước, bảo vệ bờ biển, hấp thụ khí nhà kính, và quan trọng nhất, là cung cấp nhà ở chống chịu khí hậu cho các cộng đồng ven biển.

237. Tác động xã hội của dự án không nhiều.

³⁰ Ví dụ, xem Ahern, C.R., Ahern, M.R. và Powell, B. (1998) *Hướng dẫn lấy mẫu và phân tích and đất phèn ở vùng đất thấp (ASS) ở Queensland* QASSIT, Department of Natural Resources, Resource Sciences Centre, Indooroopilly; Ahern, C.R., McElnea, A.E. and Sullivan, L.A. (2004) *Acid Sulfate Soils Laboratory Methods Guidelines*. In Queensland Acid Sulfate Soils Manual. Department of Natural Resources, Mines and Energy, Indooroopilly, Queensland, Australia; and Dear, S.E., Moore, N.G., Dobos, S.K., Watling, K.M. and Ahern, C.R. (2002). *Soil Management Guidelines*. In Queensland Acid Sulfate Soil Technical Manual. Department of Natural Resources and Mines, Indooroopilly, Queensland, Australia.

238. Địa điểm xây nhà khi nhận được hỗ trợ của GCF sẽ được thông báo dựa trên đánh giá rủi ro thực hiện trước khi chọn địa điểm. Trong trường hợp đánh giá rủi ro chỉ ra rằng địa điểm đề xuất không an toàn, chương trình hiện có của Chính phủ sẽ hỗ trợ di dời. Dự án GCF sẽ không hỗ trợ xây nhà trên địa điểm không an toàn.

239. Liên quan tới tái sinh rừng ngập mặn, ít có khả năng là dự án sẽ tạo ra việc thay thế sinh kế của người dân nếu lập kế hoạch cẩn thận. Có khả năng sẽ giảm diện tích đất có sẵn và môi trường nuôi trồng thủy sản qua việc phục hồi và trồng rừng ngập mặn. Lập kế hoạch cẩn thận và tham vấn các bên có liên quan sẽ được tiến hành trước khi chọn địa điểm trồng rừng để đảm bảo sẽ giải quyết mọi gián đoạn tạm thời sinh kế của dân (ví dụ di dời nuôi trồng thủy sản) qua chương trình hiện có của chính phủ mang lại lợi ích cho người nghèo hay bằng các hình thức khác. Trong trường hợp này, một kế hoạch phục hồi sinh kế sẽ được lập để đảm bảo các hộ gia đình được cấp phương tiện tài chính ngang với mức thu nhập sinh kế hiện có trong thời gian gián đoạn. Tới mức có thể, cơ chế CBDRM sẽ được sử dụng để lôi cuốn sự tham gia của cộng đồng và đền bù cho cộng đồng để tiến hành nhân giống, trồng và chăm sóc rừng ngập mặn, do đó sẽ cung cấp lợi ích xã hội cho cộng đồng. Trong khi dự án có thể tác động về mặt xã hội trong ngắn hạn, nhìn tổng thể dự án sẽ cải thiện đời sống của dân lao động trong và xung quanh rừng ngập mặn và tăng tiềm năng thu nhập của họ. Ngoài ra, rừng ngập mặn sẽ là vùng đệm giảm tổn thất sinh mạng và tài sản do các sự cố sinh ra bởi BĐKH.

240. Năm 2012, UNDP, UN Women, Oxfam và UNISDR xây dựng một tóm tắt chính sách để xem xét vấn đề bình đẳng giới trong thích ứng biến đổi khí hậu và thiên tai. (Xem http://www.un.org.vn/en/publications/doc_details/268-policy-brief-gender-equality-in-climate-change-adaptation-and-disaster.html). Những khuyến nghị chính từ phân tích này đã được đưa vào khi thiết kế các hoạt động của dự án ở tất cả các cấp, đặc biệt là:

- Các cơ quan của Liên Hợp Quốc cần được tham gia tích cực để tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ và các bên liên quan để thúc đẩy lồng ghép giới trong các chính sách và các chương trình CCA/DRR liên quan
- Các hoạt động CCA/DRR ở tất cả các cấp cần được xây dựng với sự tham gia của cả nam giới và phụ nữ ở mọi lứa tuổi và trình độ khác nhau bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận CBDRM.
- Đảm bảo rằng việc thu thập và đối chiếu các dữ liệu phân chia theo giới và thông tin về giới có liên quan từ cấp địa phương, đặc biệt những đánh giá nhu cầu và thiệt hại sau thảm họa liên quan đến khí hậu, thời tiết gửi đến cấp quốc gia, được phổ biến rộng rãi và công chúng có thể truy cập, và được sử dụng để thông báo, giám sát và đánh giá các chính sách và chương trình mới.

241. Trong 3 kết quả đầu ra của dự án, chính sách và thông lệ về bình đẳng giới cụ thể được khuyến nghị trong phân tích/tài liệu tóm tắt chính sách giới sẽ được áp dụng. Để hiện thực hoá điều này, dự án sẽ áp dụng 2 phương pháp tiếp cận trong việc thúc đẩy bình đẳng giới:

- Đảm bảo xem xét về giới được đưa vào khi cải thiện chính sách
- Động viên phụ nữ tham gia các hoạt động của chương trình dựa vào cộng đồng (đánh giá rủi ro, tái sinh rừng ngập mặn/giám sát, xây nhà, v.v....)

F.4. Quản lý tài chính và mua sắm

242. Quản lý tài chính và mua sắm của dự án này sẽ tuân theo các qui định tài chính của UNDP có thể tham khảo tại đây: https://info.undp.org/global/documents/frm/Financial-Rules-and-Regulations_E.pdf.

243. Những hướng dẫn khác ghi trong phần quản lý nguồn tài chính của UNDP về Các quy trình và chính sách vận hành chương trình (POPP) có tại <https://info.undp.org/global/popp/frm/Pages/introduction.aspx>.

244. UNDP có chính sách mua sắm toàn diện được ghi trong phần "Hợp đồng và mua sắm" của Các quy trình và chính sách vận hành chương trình của UNDP (POPP). Các chính sách nêu rõ các tiêu chuẩn và hướng dẫn mua sắm chính thức qua từng giai đoạn của quá trình mua sắm và được áp dụng cho tất cả mua sắm tại UNDP. Xem: <https://info.undp.org/global/popp/cap/Pages/Introduction.aspx>

245. Dự án sẽ thực hiện theo phương thức Quốc gia thực hiện (NIM) theo hướng dẫn NIM có tại đây: https://info.undp.org/global/documents/_layouts/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/global/documents/frm/National%20Implementation%20by%20the%20Government%20of%20UNDP%20Projects.docx&action=default&DefaultItemOpen=1.

246. UNDP sẽ xác định năng lực quốc gia của các đối tác thực hiện/cơ quan điều hành bằng cách đánh giá về năng lực theo Khung Chuyển tiền mặt cho đối tác thực hiện/cơ quan điều hành (một phần của cách tiếp cận hài hòa để Chuyển tiền - HACT).

247. Mọi dự án sẽ phải kiểm toán theo qui định tài chính của UNDP nói trên và các hướng dẫn và chính sách kiểm toán hiện hành.

248. Hướng dẫn NIM là một phần chính thức của các chính sách và thủ tục của UNDP, như quy định trong Các quy trình và chính sách vận hành chương trình của UNDP (POPP) có thể tham khảo ở đây: <https://info.undp.org/global/popp/Pages/default.aspx>. Hướng dẫn NIM đã được UNDP xây dựng chung và thông qua, và hoàn toàn phù hợp với các quy định về mua sắm và quản lý tài chính của UNDP.

249. Hướng dẫn NIM đã được UNDP xây dựng chung và thông qua, và hoàn toàn phù hợp với các quy định về mua sắm và quản lý tài chính của UNDP.

250. Cơ quan điều hành quốc gia là Bộ NN & PTNT - cũng được gọi là “Đối tác thực hiện” quốc gia trong thuật ngữ của UNDP - là cần thiết để thực hiện dự án phù hợp với quy định của UNDP và các quy định, chính sách và thủ tục (bao gồm các hướng dẫn NIM). Về mặt pháp lý, điều này được đảm bảo thông qua chữ ký của Chính phủ quốc gia trong Hiệp định Hỗ trợ cơ bản tiêu chuẩn của UNDP (SBAA), cùng với văn kiện dự án của UNDP sẽ được ký kết bởi đối tác thực hiện để quản lý việc sử dụng tiền hỗ trợ. Cả hai văn kiện yêu cầu phải tuân thủ. Trước khi ký văn kiện dự án, tất cả các Đối tác thực hiện quốc gia cần phải trải qua đánh giá của UNDP về cách tiếp cận hài hòa để chuyển tiền (HACT) nhằm đánh giá năng lực thực hiện dự án. Trong thời gian thực hiện, UNDP sẽ giám sát và đảm bảo chất lượng phù hợp với các chính sách và thủ tục của mình, và các yêu cầu cụ thể trong Hiệp định Công nhận Kỹ năng (AMA) và xác nhận của dự án sẽ được thoả thuận với GCF. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các đoàn giám sát, kiểm tra tại chỗ, hỗ trợ và tham gia vào các cuộc họp Ban quản lý dự án, tiến độ quý và xem xét việc thực hiện hàng năm, và kiểm toán ở dự án hoặc ở đối tác thực hiện về các nguồn lực đã nhận của UNDP.

251. Khung Cách tiếp cận hài hòa để chuyển tiền mặt (HACT) gồm bốn quá trình: (1) đánh giá vĩ mô; (2) đánh giá vi mô; (3) chuyển tiền mặt và giải ngân; và (4) hoạt động đảm bảo. Các hoạt động đảm bảo bao gồm lập kế hoạch, kiểm tra thường kỳ tại chỗ (kiểm tra tại chỗ), giám sát chương trình, kiểm toán theo lịch trình và kiểm toán đặc biệt. Trong đánh giá vi mô, có thể xác định được điểm yếu và yêu cầu có hành động để giải quyết các thiếu sót đó. Khi kiểm tra tại chỗ cho thấy những thiếu sót không được giải quyết, có nghĩa là mức độ hoạt động đảm bảo sẽ phải cao hơn và phương thức tham gia của đối tác thực hiện sẽ phải được xem xét lại nếu cần thiết. Tất cả các chi tiết có thể tham khảo ở đây: <https://undg.org/wp-content/uploads/2015/02/2014-UNDG-HACT-Framework-English-FINAL.pdf>.

252. Dự án sẽ được kiểm toán theo các chính sách và thủ tục kiểm toán của UNDP, các yêu cầu cụ thể đã được thông báo và thoả thuận trong AMA hiện đang được đàm phán với GCF. Theo chính sách kiểm toán hiện nay, UNDP sẽ được chỉ định công ty kiểm toán. Các chương trình kiểm toán của UNDP được thực hiện trong chu kỳ chương trình theo kế hoạch đảm bảo/kiểm toán của UNDP, dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro của đối tác thực hiện và hướng dẫn của UNDP. Một kiểm toán dự kiến được sử dụng để xác định xem các khoản tiền chuyển đến đối tác thực hiện có được sử dụng cho mục đích thích hợp và phù hợp với kế hoạch làm việc hay không. Một kiểm toán theo lịch trình có thể bao gồm một kiểm toán tài chính hoặc kiểm toán kiểm soát nội bộ. 253. Nguồn lực của GCF sẽ được cung cấp cho đối tác thực hiện, trừ đi số tiền thu hồi chi phí đã thoả thuận. Theo phương thức quốc gia thực hiện của UNDP, UNDP ứng tiền mặt trên cơ sở hàng quý cho đối tác thực hiện (cơ quan điều hành) để thực hiện các hoạt động chương trình đã thoả thuận và phê duyệt, phù hợp với chính sách tiêu chuẩn của UNDP và Hướng dẫn NIM. Đối tác thực hiện báo cáo lại UNDP những khoản chi tiêu thông qua một báo cáo tài chính trên cơ sở hàng quý. Bất kỳ yêu cầu bổ sung nào cũng phải phù hợp với AMA và khi được đồng ý.

• **G.1. Tóm tắt đánh giá rủi ro**

254. Vì đề xuất này xây dựng trên thành công của chương trình hiện đang thực hiện, và hưởng lợi từ các bài học kinh nghiệm từ những nỗ lực trước đây, thiết kế của đề xuất có thể đã giảm khả năng đối mặt với rủi ro. Ngoài ra, quan hệ của UNDP và các cơ quan đối tác của Chính phủ đã được thiết lập tốt, với hệ thống giám sát chương trình và tài chính đã có để theo dõi kỹ thuật hiện đang thực hiện và các giám sát khác. Như vậy, rủi ro của dự án chủ yếu được coi là thấp hay vừa phải. Ngoài ra, dự án đã được chuẩn bị trên cơ sở tham vấn ở cấp quốc gia và các tỉnh, và thiết kế của dự án đã được các bên có liên quan ở các cấp xem xét, kể cả xem mẫu đại diện cộng đồng, sau đó sẽ mua về. Mặc dù vậy, một số rủi ro tiềm năng đã được trình bày chi tiết dưới đây cùng với các biện pháp giảm thiểu.

G.2. Các yếu tố rủi ro và các biện pháp giảm thiểu

Yếu tố rủi ro được lựa chọn 1

Mô tả	Hạng rủi ro	Mức độ ảnh hưởng	Xác suất xuất hiện rủi ro
<i>Năng lực của Bộ NN&PTNT để hấp thụ và thực hiện như đã lên kế hoạch, có tính đến các sức ép khác, bao gồm quản lý và thực hiện các chương trình và dự án khác, cán bộ thiếu kinh nghiệm và thiếu trang thiết bị.</i>	Kỹ thuật và hoạt động	Thấp (<5% giá trị dự án)	Thấp

(Các) Biện pháp giảm thiểu

Xác suất rủi ro thấp do có các biện pháp giảm thiểu:

- Lồng ghép chặt chẽ với các ưu tiên hiện nay
- Giao các hoạt động của dự án cho đối tác đồng thực hiện/cơ quan điều hành, đơn vị làm việc trực tiếp với đối tác ở tỉnh.
- Hỗ trợ năng lực cho đối tác của UNDP (xem NIM mô tả trong phần F.4.)

Yếu tố rủi ro được lựa chọn 2

Mô tả	Hạng rủi ro	Mức độ ảnh hưởng	Xác suất xuất hiện rủi ro
Sự phức tạp trong điều phối và liên lạc: rất nhiều hoạt động sẽ cần sự tham gia của nhiều hơn một đối tác, cần có sự phối hợp đều đặn và liên lạc thường xuyên.	Kỹ thuật và hoạt động	Thấp (<5% giá trị dự án)	Thấp

(Các) Biện pháp giảm thiểu

Xác suất rủi ro thấp do có các biện pháp giảm thiểu:

- Vai trò và trách nhiệm giữa các đối tác cần được xác định cụ thể trong ma trận, có đối tác chủ trì chịu trách nhiệm về ngân sách và điều phối / liên lạc với các đối tác khác. Các cuộc họp tiến độ định kỳ được tổ chức với các quan chức cấp cao cấp để đảm bảo mọi khó khăn được giải quyết một cách kịp thời.
- Cán bộ dự án trong Ban quản lý dự án (QLDA) chịu trách nhiệm cụ thể về thực hiện dự án, phối hợp và giám sát & đánh giá (M&E), Giám đốc dự án và UNDP sẽ giám sát việc thực hiện dự án và nếu cần thiết sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật với chi phí để cải thiện sự phối hợp / liên lạc.
- Các cuộc họp phối hợp hàng tháng với tất cả các điều phối viên dự án quốc gia do Ban QLDA tổ chức.

Yếu tố rủi ro được lựa chọn 3

Mô tả	Hạng rủi ro	Mức độ ảnh hưởng	Xác suất xuất hiện rủi ro
Thực hiện không hiệu quả giám sát & đánh giá, kể cả báo cáo.	Kỹ thuật và hoạt động	Thấp (<5% giá trị dự án)	Thấp

(Các) Biện pháp giảm thiểu

Xác suất rủi ro thấp do có các biện pháp giảm thiểu: - Khi bắt đầu triển khai dự án, các buổi định hướng và tập huấn được thiết kế phù hợp cho tất cả nhân viên trong nước và địa phương liên quan đến M & E sẽ được tổ chức - Cán bộ dự án trong Ban QLDA chịu trách nhiệm cụ thể về M&E dự án được hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật hàng ngày - Ngân sách đầy đủ và nguồn ngân sách cho M & E sẽ được thoả thuận ngay từ đầu dự án			
Yếu tố rủi ro được lựa chọn 4			
Mô tả	Hạng rủi ro	Mức độ ảnh hưởng	Xác suất xuất hiện rủi ro
Tỉ lệ sống của rừng ngập mặn thấp do nhiều yếu tố kể cả phá rừng cộng đồng, ô nhiễm hoặc các yếu tố khác	Xã hội và môi trường	Trung bình (5,1-20% giá trị dự án)	Thấp
(Các) Biện pháp giảm thiểu			
Xác suất rủi ro thấp do có các biện pháp giảm thiểu: Phương pháp tiếp cận sẽ nhân rộng thành công phương pháp tiếp cận đa dạng và sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp dựa vào cộng đồng đảm bảo tham vấn rõ ràng. Điều này bao gồm thành lập các uỷ ban CBDRM ở tất cả các giai đoạn của dự án. Xác minh địa điểm kỹ thuật sẽ đánh giá trước tiềm năng rủi ro ô nhiễm, và các nhóm cộng đồng trong một số trường hợp có thể muốn thực hiện vận động hoặc hành động để giảm thiểu rủi ro, hoặc đề nghị các địa điểm thay thế để giảm tiếp xúc với ô nhiễm.			
Yếu tố rủi ro được lựa chọn 5			
Mô tả	Hạng rủi ro	Mức độ ảnh hưởng	Xác suất xuất hiện rủi ro
Thiếu sự tham gia của phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương khác trong thiết kế và thực hiện dự án.	Xã hội và môi trường	Trung bình (5,1-20% giá trị dự án)	Thấp
(Các) Biện pháp giảm thiểu			
Xác suất rủi ro thấp do có các biện pháp giảm thiểu: Nhân rộng các phương pháp CBDRM trong đó yêu cầu ít nhất 30% phụ nữ ở mọi cấp tham gia, và chủ động đòi hỏi sự tham gia của các nhóm dễ bị tổn thương và mọi người ở mọi lứa tuổi. Giám sát chính thức và công bố dữ liệu phân tách giới và độ tuổi.			
Yếu tố rủi ro được lựa chọn 6			
Mô tả	Hạng rủi ro	Mức độ ảnh hưởng	Xác suất xuất hiện rủi ro
Tài trợ không hoàn lại để xây nhà ở không cho kết quả là việc xây dựng chống chịu bão được hoàn thành hay nhà bị hỏng	Kỹ thuật và hoạt động	Trung bình (5,1-20% giá trị dự án)	Thấp
(Các) Biện pháp giảm thiểu			
Xác suất rủi ro thấp do có các biện pháp giảm thiểu: - Trong khi tỷ lệ này là rất thấp, có một số lượng nhỏ các trường hợp xây dựng nhà ở đã được bắt đầu nhưng không bao giờ hoàn thành. Phương pháp tiếp cận dự án GCF sẽ thực hiện theo các biện pháp giảm thiểu rủi ro của chương trình nhà ở của chính phủ - 70% của khoản tài trợ được cung cấp khi hoàn thành móng, và 30% còn lại sau khi hoàn thành khung nhà đáp ứng các yêu cầu của thiết kế. - Các mẫu thiết kế nhà ở được áp dụng trong dự án đã được xây dựng để có chi phí bảo trì thấp. Các tính năng thiết kế còn nhằm đảm bảo rằng các thành phần kết cấu dễ bị tổn thương hơn, chẳng hạn như mái nhà và khớp nối góc được gia cố trong quá trình xây dựng, giảm chi phí sửa chữa tiềm năng. (Do được xây bằng bê tông,			

chi phí bảo trì hàng năm thường thấp hơn lợp tranh và xây bằng tre nứa, các vật liệu đòi hỏi phải sửa chữa và đầu tư đáng kể hàng năm). Ngoài ra, dự án cũng sẽ phổ biến thông tin về làm thế nào để chuẩn bị đón bão để giảm thiệt hại tiềm năng dựa trên các vật liệu hiện tại Bộ Xây dựng cung cấp (ví dụ: các mặt hàng đảm bảo, sử dụng các bao cát, v.v). Trong trường hợp nhà bị hư hỏng trong một cơn bão bất chấp những nỗ lực này, các hộ gia đình sẽ có đủ điều kiện để được bồi thường với mức hạn chế để sửa chữa thông qua các chương trình hỗ trợ ứng phó thiên tai hiện đang hoạt động ở cấp tỉnh.

Yếu tố rủi ro được lựa chọn 7			
Mô tả	Hạng rủi ro	Mức độ ảnh hưởng	Xác suất xuất hiện rủi ro
Công việc làm đất liên quan đến phục hồi rừng ngập mặn có tác động xấu đến đa dạng sinh học (hệ thực vật và động vật) của khu vực.	Kỹ thuật và hoạt động	Trung bình (5,1-20% giá trị dự án)	Thấp
(Các) Biện pháp giảm thiểu			
Có khả năng di chuyển trầm tích trong khi trồng rừng ngập mặn. Để đảm bảo rằng trầm tích không bị gió hay cụ thể hơn chuyển động của nước dồn đọng lại, cần chuẩn bị một kế hoạch kiểm soát xói mòn trầm tích và lắp đặt màn chắn phù sa để hạn chế di chuyển trầm tích. Kế hoạch này sẽ có các khía cạnh bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lắp đặt màn chắn phù sa để giảm chuyển động trầm tích và che phủ trầm tích ở những nơi thực hiện được.			
Rủi ro tiềm tàng khác			
Vui lòng mô tả các vấn đề tiềm năng khác sẽ được giám sát như "rủi ro mới nổi" trong vòng đời của dự án (tức là, vấn đề mà chưa nâng lên mức độ "yếu tố nguy cơ", nhưng sẽ cần giám sát). Điều này có thể bao gồm các vấn đề liên quan đến các bên liên quan bên ngoài như người thụ hưởng dự án hoặc một loạt các nhà thầu tiềm năng.			

H.1. Khung logic.

H.1.1. Mục tiêu chuyển đổi mô hình và các tác động ở cấp Quỹ³¹

Mục tiêu chuyển đổi mô hình						
Tăng phát triển bền vững chống chịu với khí hậu	Thông qua cách tiếp cận tổng hợp dự án sẽ đảm bảo có nhiều nhà chống chịu với khí hậu, tăng cường phòng thủ tự nhiên thông qua sự tái sinh của rừng ngập mặn, và cải thiện quy hoạch/lập kế hoạch thông qua việc tích hợp các thông tin rủi ro khí hậu					
Kết quả dự kiến	Chỉ số	Phương thức xác minh (MoV)	Nền	Mục tiêu		Giả định
				Trung hạn (nếu có)	Cuối cùng	
Tác động ở cấp Quỹ						
A3.0 Tăng khả năng chống chịu BĐKH của cơ sở hạ tầng và môi trường xây dựng	3.1 Số lượng và giá trị tài sản vật chất được làm có tính chống chịu tốt hơn với sự biến thiên và biến đổi khí hậu, xét tới lợi ích của con người	Thăm thực địa, báo cáo tiến độ của cơ quan điều hành, lập bản đồ ven biển bởi cộng đồng	4.000 nhà không đáp ứng các tiêu chí an toàn / chống chịu do chính phủ đề ra	2.000 nhà có giá trị 4 triệu USD	4.000 nhà có giá trị 8 triệu USD	Chương trình nhà của Chính phủ, đặt mục tiêu có tổng số 26.500 nhà, vẫn tiếp tục theo kế hoạch đề ra.
M4.0. Giảm phát thải từ sử dụng đất, trồng rừng, quản lý bảo tồn rừng bền vững và tăng cường trữ lượng các bon rừng	4.1 Tán carbon dioxide tương đương (tCO2eq) giảm hoặc tránh được (bao gồm cả loại bỏ tăng) như là một kết quả của dự án / chương trình Quỹ tài trợ	Thăm thực địa, báo cáo	0	Ước tính 282,590 tCO2eq	Ước 565,180 tCO2eq	Sự kiện thời tiết cực đoan không phá hủy cây con, cây giống. (Các biện pháp sẽ được thực hiện để bảo vệ rừng ngập mặn ở giai đoạn đầu phát triển, ví dụ như hàng rào tre để tránh bão)

³¹ Thông tin về cá kết quả mong đợi của Quỹ và các chỉ số có thể tìm thấy trong Khung đo lường công việc có sẵn ở đường nối sau (Vui lòng lưu ý một số chỉ số đang được chỉnh sửa):

http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/Operations/5.3_Initial_PMF.pdf

H.1.2. Kết quả, kết quả đầu ra, hoạt động và đầu vào ở cấp dự án/chương trình

Kết quả dự kiến	Chỉ số	Phương thức xác minh (MoV)	Nền	Mục tiêu		Assumptions
				Trung hạn (nếu có)	Cuối cùng	
Kết quả của dự án / chương trình	Kết quả góp phần vào tác động cấp Quỹ					
9.0 Tăng cường quản lý đất hoặc các vùng rừng có góp phần vào việc giảm phát thải	9.1 Số hec-ta đất hoặc rừng được tăng cường quản lý và hiệu quả, góp phần giảm phát thải CO2	Thăm thực địa, báo cáo tiến độ của cơ quan thực hiện	0	2.000ha	4.000ha	Sự kiện thời tiết cực đoan không phá hủy cây con, cây giống. (Các biện pháp sẽ được thực hiện để bảo vệ rừng ngập mặn ở giai đoạn đầu phát triển, ví dụ như hàng rào tre để tránh bão)
A6.0 Tăng tạo ra và sử dụng thông tin khí hậu trong việc ra quyết định	6.2. Sử dụng sản phẩm / dịch vụ thông tin khí hậu trong việc ra quyết định trong các lĩnh vực nhạy cảm với khí hậu	Báo cáo	Sản phẩm khí hậu lồng ghép thông tin rủi ro không có định kỳ	2 (bản đồ rủi ro có chất lượng)	5 (Nâng cao chất lượng các chính sách, đưa ra các thông tin rủi ro khí hậu phù hợp cho các bên liên quan khác nhau)	Những nỗ lực thu thập dữ liệu trong năm đầu của dự án thành công
Kết quả đầu ra của dự án / chương trình	Kết quả đầu ra góp phần vào kết quả					
1. Những tính năng thiết kế chống chịu với bão lụt bổ sung vào 4.000 nhà mới ở địa điểm an toàn, làm lợi cho 20.000 người nghèo và có nhiều khả năng đối mặt với thiên tai ở 100 xã	3.1 Số hộ gia đình được cung cấp những ngôi nhà chống chịu (chỉ rõ chủ hộ là nam hay nữ)	Kết quả quá trình lựa chọn xã, chuyển thăm thực địa, báo cáo tiến độ của cơ quan điều hành, giám sát của cộng đồng	Đến 4.000 nhà không đáp ứng các tiêu chí an toàn / chống chịu do chính phủ đề ra	2.000 nhà	4.000 nhà	Chương trình nhà của Chính phủ, đặt mục tiêu có tổng số 25.000 nhà, vẫn tiếp tục theo kế hoạch đề ra.
2. Tái sinh 4.000 ha rừng ngập mặn ven biển làm khu đệm trước triều cường sử	Ha đất rừng được quản lý tiên tiến và	Thăm thực địa, báo cáo	0	2.000	4.000	Các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ không phá hủy

dụng cách tiếp cận dựa vào bằng chứng thành công	<i>hiệu quả, góp phần giảm phát thải CO₂</i>	tiến độ của cơ quan điều hành.				cây giống yếu ớt. (Sẽ có các biện pháp bảo vệ rừng ngập mặn trong giai đoạn mới trồng, như rào tre để chống triều cường)
3. Tăng tiếp cận tới các dữ liệu tốt hơn về khí hậu, thiệt hại và tổn thất để khu vực công và tư nhân ứng dụng	<i>Số cơ sở dữ liệu tham gia được thiết lập/hỗ trợ và số khung chính sách/pháp lý về khí hậu được hỗ trợ</i>	Báo cáo	Sản phẩm khí hậu lồng ghép thông tin rủi ro không có định kỳ	2 (bản đồ rủi ro có chất lượng)	5 (Nâng cao chất lượng các chính sách, đưa ra các thông tin rủi ro khí hậu phù hợp cho các bên liên quan khác nhau)	Những nỗ lực thu thập dữ liệu trong năm đầu của dự án thành công
Hoạt động	Mô tả	Đầu vào			Mô tả	

1.1 Tài trợ không hoàn lại hỗ trợ chi phí bổ sung các tính năng chống chịu bão/lụt cho 4.000 ngôi nhà	Hoạt động 1.1 tập trung vào các chi phí bổ sung của các tính năng an toàn chống chịu khí hậu để xây nhà theo chương trình nhà ở của chính phủ. Quan trọng hơn, lựa chọn địa điểm sẽ được liên kết với đánh giá rủi ro được thực hiện thông qua các chương trình CBDRM và bản đồ triều cường của DMC để đảm bảo xác định địa điểm an toàn cho ngôi nhà. Đào tạo về nhà ở an toàn sẽ được cung cấp thông qua các chương trình CBDRM để mở rộng kiến thức cho các cộng đồng khác.	1.1.1. Xác định các địa điểm dự án theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, theo tiêu chí dễ bị tổn thương để có can dự của dự án, để Ban quản lý dự án phê duyệt khi cần thiết 1.1.2. (Xã chọn từng nhà trong xã để hỗ trợ khoản tài trợ không hoàn lại dựa trên các chỉ số nghèo do chính phủ thiết lập và khả năng chống chịu bão của nhà hiện ở). Thông báo lựa chọn của xã về những người được nhận hỗ trợ bằng kiểm tra chéo với đánh giá rủi ro CBDRM để đảm bảo tài trợ cho xây dựng không hỗ trợ xây dựng tại các khu vực có rủi ro cao. (Đánh giá rủi ro được tiến hành khi họ thiếu, xem Hoạt động 1.2). 1.1.3. Thu thập dữ liệu có sẵn, bao gồm đánh giá rủi ro CBDRM và bản đồ triều cường, đưa vào gói thông tin để thông báo xác minh địa điểm an toàn (bổ sung cho kết quả đầu ra 2). 1.1.4. Tài trợ giao cho xây nhà ở, cho chi phí gia tăng bổ sung gia cố các tường và mái dốc để chịu được bão mạnh hơn, nâng gác lửng lên trên mức lũ dự kiến). Tiền giao một lần dựa trên thiết kế nhà an toàn hơn đã thỏa thuận cho tối đa là \$ 2,000 mỗi ngôi nhà sẽ được chuyển giao cho Bộ Tài chính. Phân phối đến người nhận sẽ theo cơ chế tài trợ trong chương trình nhà ở của Bộ Xây dựng - tài trợ được cung cấp cho nhà chủ, nhà chủ sau đó sử dụng tiền để mua nguyên vật liệu và thuê nhân công 1.1.5. Đối với người nhận tài trợ đặc biệt dễ bị tổn thương, như nữ chủ hộ, người tàn tật hoặc người già, hỗ trợ để xác định phương tiện bổ sung / tiềm năng hỗ trợ cho xây dựng, chẳng hạn như tổ chức thanh niên 1.1.6. Hỗ trợ khung chính sách/quy định pháp luật chi phối những ngôi nhà được hỗ trợ - cả về bảo trì, bảo hiểm (liên quan đến kết quả đầu ra 3) 1.1.5. Khuôn khổ/ quy định pháp lý chi phối những ngôi nhà được hỗ trợ - cả về bảo trì, bảo hiểm (liên quan đến kết quả 3), và quan trọng hơn đảm	Tham vấn ở cấp tỉnh, xã và cộng đồng Đầu tư vào các chi phí bổ sung cho các tính năng an toàn chống chịu khí hậu, cho 4.000 ngôi nhà Hoạt động tập huấn cho cộng đồng về thiết kế ngôi nhà an toàn Các hoạt động đào tạo để hỗ trợ tăng cường năng lực cho cán bộ tỉnh Chuyên môn kỹ thuật để tăng cường khung pháp lý và chính sách
--	---	---	---

		bảo rằng những ngôi nhà sẽ không được bán tự do trên thị trường - cần phải đặt ra vai trò của chính quyền địa phương	
Hoạt động 1.2. - Lập bản đồ và lập kế hoạch rủi ro thiên tai và khí hậu dựa vào cộng đồng	Hoạt động 1.2 tập trung vào tiến hành đánh giá rủi ro mà họ đang thiếu. Các phương pháp của chương trình CBDRM sẽ được sử dụng và mở rộng quy mô đến các khu vực được các chương trình nhà ở của chính phủ ưu tiên và liên quan đến các dự án GCF.	1.2.1. Thành lập ủy ban cộng đồng kết hợp cả chính quyền địa phương và nhiều thành phần dân, đảm bảo sự tham gia của phụ nữ, để hoàn thành một đánh giá rủi ro CBDRM 1.2.2. Chương trình đào tạo cho các xã / thôn được lựa chọn để tiến hành lập bản đồ ven biển, sử dụng bản đồ địa hình chất lượng cao hiện có cho việc xác định nền và mục đích giám sát, xây dựng trên chương trình CBDRM	Tham vấn cộng đồng Hoạt động đào tạo cho cộng đồng về CBDRA Chuyên môn kỹ thuật để tăng cường chương trình nhà ở của chính phủ

		1.2.3. Tiến hành đánh giá rủi ro theo hướng dẫn CBDRA 1.2.4. Tăng cường đào tạo hiện có cung cấp bởi Sở Xây dựng về thiết kế nhà, với các thông tin rủi ro và tiềm năng tránh được thiệt hại / tổn thất 1.2.5. Đào tạo cũng được hỗ trợ cho các cộng đồng và các tỉnh lân cận	
Hoạt động 1.3 - Sản phẩm kiến thức, phát triển dựa trên những bài học kinh nghiệm, cho các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng	Hoạt động 1.3 đảm bảo rằng các thông lệ tốt nhất từ các biện pháp tăng cường, và bất kỳ bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện, được chia sẻ để thông báo cho lập các chương trình xây nhà ở, cũng như sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng trong tương lai. Dữ liệu được tạo ra trong kết quả này cũng sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu trung tâm để thông tin khi lập kế hoạch rộng lớn hơn.	1.3.1. Tài liệu hoá tiến độ dự án, làm nổi bật khi có thể/có thể áp dụng, khả năng chống chịu của nhà so với các sự kiện thời tiết / thiên tai tương tự trước 1.3.2. Xây dựng các tóm tắt chính sách dựa trên đánh giá rủi ro và thành công của dự án, thông báo quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch xây dựng và phát triển 1.3.3. Hỗ trợ thiết kế của các giai đoạn tiếp theo trong chương trình nhà ở của chính phủ (ví dụ như các tỉnh phía Bắc, đồng bằng sông Cửu Long) lồng ghép bằng chứng và thực hành tốt nhất từ thực hiện GCF 1.3.4. Ghi chép có hệ thống và tổng hợp dữ liệu từ các gói thông tin để đưa vào kho lưu trữ rủi ro ở trung ương để thông báo khi lập kế hoạch rộng lớn hơn (bổ sung cho kết quả đầu ra 2) 1.3.5. Những hội thảo/lớp học về thông lệ tốt nhất ở 3 vùng. Đào tạo giảng viên ở 3 vùng, đào tạo cấp tỉnh 1.3.6. Chiến dịch nâng cao nhận thức của công chúng về công nghệ nhà ở an toàn gắn với nhà chống chịu bão/lũ để tránh thiệt hại / tổn thất	Báo cáo và tài liệu truyền thông Chuyên môn kỹ thuật để hỗ trợ chính sách/lập chương trình Các hoạt động nhận thức của công chúng
Hoạt động 2.1–Tái sinh hoặc trồng lại 4.000 ha rừng ngập mặn ở vùng ven biển dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu	Activity 2.1 tập trung vào việc tái sinh và trồng lại rừng ngập mặn tại các khu vực bị suy thoái. Các hoạt động nâng cao nhận thức sẽ đảm bảo cộng đồng hiểu được tầm quan trọng của việc chăm sóc các khu rừng ngập mặn được phục hồi để bảo vệ cộng đồng trước các sự kiện biến đổi khí hậu.	2.1.1. Được hướng dẫn bởi Bộ NN & PTNT, xác minh các địa điểm theo các tiêu chí dễ bị tổn thương và có tính khả thi để dự án can dự (bao gồm cả các dự án phát triển cơ sở hạ tầng đã có kế hoạch và nỗ lực phục hồi rừng ngập mặn của chính phủ và các đối tác), để Ban QLDA phê duyệt khi theo yêu cầu 2.1.2 Trường hợp các hoạt động đã lên kế hoạch của chính phủ	Tham vấn tại cấp tỉnh, xã và cộng đồng Nghiên cứu tiếp cận để đánh giá cách tốt nhất phục hồi rừng ngập mặn Các hoạt động đào tạo cộng đồng về vườn ươm ngập mặn an toàn, tái sinh / trồng rừng

		đặt ra mối đe dọa cho khu vực rừng ngập mặn, hỗ trợ của chính phủ trong việc lồng ghép bảo vệ rừng ngập mặn vào việc lập hoạch 2.1.3. Cung cấp đào tạo và tham gia bổ sung cho đại diện các nhóm cộng đồng về lợi ích và phương tiện để tái sinh rừng ngập mặn phù hợp với bối cảnh địa phương 2.1.4. Đánh giá kỹ thuật (ví dụ như phân tích đất) của các địa điểm để đánh giá sự phức tạp, xác định biện pháp tốt nhất phục hồi và các chi phí liên quan 2.1.5. Đối với vùng nuôi trồng thủy sản đặt ra mối đe dọa cho rừng ngập mặn, hỗ trợ trong việc thiết kế và di dời các ao, cung cấp hỗ trợ sinh kế tạm thời hỗ trợ khi cần thiết 2.1.7. Căn cứ vào kế hoạch CBDPM, tham vấn với các cộng đồng đảm bảo sự tham gia của phụ nữ, để xác định vai trò trong việc phục hồi, chăm sóc và giám sát các khu vực rừng ngập mặn 2.1.8. Bắt đầu với 2-3 địa điểm, phục hồi rừng ngập mặn sử dụng cây giống sản xuất tại địa phương và lắp đặt cơ sở hạ tầng cần thiết để bảo vệ cây (ví dụ như hỗ trợ tre có nguồn từ địa phương hoặc hàng rào), lôi cuốn sự tham gia các cộng đồng trong nhân giống cây (vườn ươm) và trồng đến mức có thể Using existing guidelines and best practices for improved mangrove rehabilitation, led by MARD and in consultation with academia and partners specializing in this field as necessary, ensure species selection and replantation techniques are appropriate for the site 2.1.9. Đánh giá chi phí phục hồi tại các địa điểm tiềm năng cho giai đoạn thực hiện tiếp theo (tức là chi phí phục hồi sẽ thay đổi theo địa điểm tùy thuộc vào mức độ khó khăn và chất lượng đất của địa điểm)	Các hoạt động đào tạo để hỗ trợ tăng cường năng lực cho cán bộ tỉnh Chuyên môn kỹ thuật để tăng cường khung pháp lý và chính sách Chuyên môn kỹ thuật để hỗ trợ chính sách/lập chương trình
--	--	---	--

		2.1.10. Lưu giữ tài liệu các thông lệ tốt nhất và bài học kinh nghiệm để thông báo cho giai đoạn thực hiện tiếp theo của dự án, cũng như chương trình CBDRM.	
Hoạt động 2.2 – Chương trình phục hồi, chăm sóc và giám sát rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng đối với các cộng đồng mục tiêu	Hoạt động 2.2. tập trung vào việc thu hút cộng đồng tham gia thông qua chương trình CBDRM để theo dõi và báo cáo tiến độ của các nỗ lực phục hồi rừng ngập mặn, để đảm bảo rằng các vấn đề không lường trước hoặc sức ép được giải quyết ngay lập tức	2.2.1. Chương trình đào tạo cho 25 xã / thôn được lựa chọn để tiến hành lập bản đồ ven biển, sử dụng bản đồ địa hình hiện tại có chất lượng cao cho tình hình nền và cho mục đích giám sát 2.2.2. Thu thập dữ liệu có sẵn kể cả đánh giá rủi ro CBDRM và bản đồ triều cường đưa vào các gói thông tin để thông báo địa điểm an toàn (bổ sung cho Kết quả đầu ra 1) 2.2.3. Hoàn chỉnh đánh giá tổn thương và rủi ro dựa vào cộng đồng đối với các xã sử dụng các phương pháp hiện hành đã được Bộ NN & PTNT phê duyệt, tài liệu đã xây dựng cho chương trình 1002, và đưa vào phân tích các gói dữ liệu rủi ro (bổ sung cho Kết quả đầu ra 1) 2.2.4. Chương trình đào tạo (25) cho phục hồi và chăm sóc thường xuyên các khu rừng ngập mặn để quản lý dựa vào cộng đồng của rừng ngập mặn (quản lý rừng ngập mặn sẽ được lồng ghép và tính toán chi phí vào các kế hoạch CBDRM) 2.2.5. Giám sát dựa vào cộng đồng để đánh giá sự thành công của những nỗ lực phục hồi rừng ngập mặn, cũng như cho mục đích lập kế hoạch rộng lớn hơn 2.2.6. Cấp xã và huyện tài liệu hoá và biên soạn tài liệu truyền thông về tiến độ dự án, tiếp tục thông báo việc thực hiện dự án	Đào tạo cộng đồng về lập bản đồ ven biển Chuyên môn kỹ thuật để xây dựng các gói thông tin về rủi ro thiết kế phù hợp với các cộng đồng Tập huấn cho cộng đồng về giám sát và báo cáo tiến độ của các khu vực phục hồi
Hoạt động 2.3.- Sản phẩm kiến thức, xây dựng dựa trên những bài học kinh nghiệm, cho các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng	Hoạt động 2.3 đảm bảo rằng các thông lệ tốt nhất từ các biện pháp tăng cường, và bất kỳ bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện, được chia sẻ để thông báo chính sách về lĩnh vực bảo vệ và lập chương trình bảo quản có liên quan	2.3.1 Tài liệu hoá thành tựu của dự án, thông lệ tốt nhất và bài học kinh nghiệm, nêu bật những lợi ích xã hội và môi trường của phục hồi rừng ngập mặn 2.3.2. 5 hội nghị bàn tròn cho chuyên gia tư vấn của chính phủ và các nhà thầu, chuyên gia của	Các báo cáo và tài liệu truyền thông Chuyên môn kỹ thuật hỗ trợ chính sách/lập chương trình

		tỉnh/quốc gia để đánh giá xác nhận các thông tin tốt nhất 2.3.3. Ghi chép có hệ thống và tổng hợp dữ liệu từ các gói thông tin để đưa vào kho lưu trữ rủi ro ở trung ương để thông báo khi lập kế hoạch rộng lớn hơn (bổ sung cho kết quả đầu ra 2) Phát triển các tóm tắt chính sách để thông báo kế hoạch khả năng phục hồi bờ biển Soạn thảo các tóm tắt chính sách để thông báo cho lập kế hoạch 2.3.3. Chiến dịch nâng cao nhận thức công chúng gắn với bảo vệ rừng ngập mặn để ghi nhận những lợi ích xã hội và môi trường của các can dự của dự án	Các hoạt động nâng cao nhận thức
Hoạt động 3.1 – Cơ sở dữ liệu thiên tai được cập nhật và kho dữ liệu rủi ro được thành lập, với cơ chế được xây dựng nhằm chia sẻ / phổ biến thông tin	Hoạt động 3.1 tập trung vào việc nâng cao số lượng và chất lượng của thông tin thiên tai / tổn thất của Việt Nam, qua đó nâng cao độ tin cậy của thông tin. Các hoạt động này cũng giúp cải thiện cơ chế chia sẻ dữ liệu với các bên liên quan để sử dụng trong việc lập kế hoạch.	3.1.1. Thành lập nhóm tư vấn kỹ thuật gồm các chuyên gia đại diện cho lợi ích khác nhau (ví dụ như môi trường, cơ sở hạ tầng, các viện khoa học, khu vực tư nhân, lĩnh vực bảo hiểm) để tư vấn về việc nâng cấp hệ thống để hỗ trợ phát triển sản phẩm chia sẻ rủi ro được cải thiện cho việc lập kế hoạch trung và dài hạn, 10 tham vấn khi được thành lập. 3.1.2. 3 hội thảo xây dựng phương pháp để theo dõi dữ liệu, bao gồm kho lưu trữ và các thiết bị để lưu trữ dữ liệu dài hạn 3.1.3.. Làm việc với các viện nghiên cứu và các tổ chức nghiên cứu chủ chốt để biên soạn thông tin rủi ro cho các tỉnh mục tiêu, có thể được cung cấp cho các xã để thông báo làm kế hoạch dựa vào cộng đồng 3.1.4. Tập huấn (520) để hoàn chỉnh và biên soạn các đánh giá rủi ro tổn thương và thiên tai dựa vào cộng đồng, tăng cường các phương pháp CBDRM đã lập ở các xã mục tiêu khi cần thiết và đưa kết quả vào hệ thống M & E của chương trình 1002 hiện hành như dữ liệu nền 3.1.5. Nhân rộng phương pháp thu thập dữ liệu thiên tai và thiệt hại cho xã ngoài chương trình CBDRM 3.1.6. Xác minh dữ liệu quá khứ cấp xã về các sự kiện khí hậu	Tham vấn các bên liên quan Chuyên môn kỹ thuật

		khắc nghiệt, thiệt hại và tổn thất đang được thu thập theo chương trình 1002 nhưng hiện tại không có sẵn để làm mô hình rủi ro 3.1.7. Nâng cấp cơ sở dữ liệu thiệt hại và tổn thất ở Việt Nam hiện có, xây dựng trên bộ dữ liệu theo dõi thiên tai quốc gia hiện hành để cho phép liên kết các dữ liệu rủi ro cấp xã với hệ thống quốc gia 3.1.8. Khánh thành kho dữ liệu rủi ro của chính phủ được cải thiện có khả năng tiếp cận các nhà lập kế hoạch và định chế tài chính để hỗ trợ phân tích và mô hình hóa bởi khu vực tư nhân và các bên liên quan khác	
Hoạt động 3.2 – Hỗ trợ chính sách cho cán bộ Bộ Kế hoạch / chuyên ngành ở cấp quốc gia và địa phương để áp dụng thông tin thiên tai / tổn thất để thông báo lập kế hoạch chống chịu khí hậu	Hoạt động 3.2 liên kết các thông tin rủi ro được thu thập được và tài liệu hoá thông qua dự án GCF với lập kế hoạch rộng lớn hơn. Để đảm bảo thông tin được hiểu và sẵn sàng để được áp dụng lập kế hoạch, hoạt động này sẽ phát triển các sản phẩm thông tin khí hậu phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan khác nhau (sau khi đã tham vấn), bao gồm khu vực tư nhân và lĩnh vực bảo hiểm. Thông tin này sẽ không chỉ bảo vệ đầu tư của họ, mà còn khuyến khích đầu tư vào các biện pháp phòng ngừa biến đổi khí hậu hoặc thiên tai, có tiềm năng mang lại lợi ích rộng.	3.2.1. Đối thoại liên bộ để đánh giá nhu cầu thông tin về thiệt hại và mất mát, thảm họa và khí hậu để xây dựng những sản phẩm phù hợp cho lập kế hoạch chống chịu với khí hậu có thông tin rủi ro. 3.2.2. 10 bàn tròn về tiêu chuẩn hóa các hướng dẫn đánh giá rủi ro hiện có; xây dựng các đánh giá rủi ro toàn diện cho Việt Nam; kho dữ liệu rủi ro của Chính phủ để các nhà lập kế hoạch và tổ chức tài chính dễ tiếp cận nhằm hỗ trợ phân tích và mô hình hóa của khu vực tư nhân và các bên liên quan khác 3.2.3. Thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan, đặc biệt là các nhà cung cấp bảo hiểm, lồng ghép dữ liệu khí hậu và thiên tai cho việc lập kế hoạch 1.1.1. 3.2.4. Thiết kế và cung cấp đào tạo về lập kế hoạch chống chịu khí hậu và đã được thông báo rủi ro trong các lĩnh vực khác nhau, tích hợp thông tin khí hậu, dữ liệu thiên tai / tổn thất, phân tích chi phí-lợi ích, và lập mô hình tài chính của các tác động khí hậu và thiên tai và biện pháp ứng phó	Tham vấn các bên liên quan Hội thảo Chuyên môn kỹ thuật để xây dựng sản phẩm phù hợp 12 hoạt động đào tạo để lồng ghép thông tin rủi ro khí hậu vào các kế hoạch, các ngành khác
Hoạt động 3.3 – Phân tích các cơ chế chuyển giao rủi ro cho bảo hiểm, kể cả đối với trường hợp thiên tai liên quan đến khí hậu quy mô	Hoạt động 3.3 xem xét các rủi ro dự báo của một sự kiện biến đổi khí hậu lớn và đặt ra một kế hoạch để giảm nhẹ gánh nặng tài chính của các tổn thất tiềm năng.	3.3.1. Tạo thuận lợi cho đối thoại giữa chính phủ và ngành bảo hiểm để nghiên cứu các cơ hội tăng khả năng tiếp cận với các sản phẩm bảo hiểm liên	Chuyên môn kỹ thuật

lớn ở ven biển (mất hơn 3% GDP)		quan ở các khu vực ven biển có rủi ro cao 3.3.2. Nghiên cứu cải tiến phương án tài chính và cơ chế tránh rủi ro phi tài trợ để tăng khả năng tiếp cận tài chính của người nghèo cho phòng ngừa và ứng phó thiên tai (ví dụ như trái phiếu thảm họa) 3.3.3. Xây dựng mô hình cải thiện tổn thất tài chính cho Việt Nam để ước tính kinh tế chịu ảnh hưởng bởi các sự cố khí hậu 3.3.4. Cung cấp đầu vào kỹ thuật và phối hợp để giúp chính phủ xây dựng kế hoạch quản lý thiên tai lớn liên quan đến khí hậu ảnh hưởng đến một khu vực ven biển (như siêu bão hoặc sự kiện tương tự)	
---------------------------------	--	---	--

H.2. Phương thức giám sát, báo cáo và đánh giá

255. Giám sát và đánh giá cấp dự án sẽ được tiến hành theo [UNDP POPP](#), chính sách đánh giá của [UNDP](#).

Trách nhiệm theo dõi và giám sát: 256. Trách nhiệm theo dõi và giám sát hàng ngày về việc thực hiện dự án thuộc về Quản đốc dự án. Quản đốc dự án có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hàng năm để đảm bảo thực hiện dự án có hiệu quả. Quản đốc dự án sẽ thông báo cho Ban QLDA và Văn phòng UNDP Hà Nội về mọi chậm trễ hay khó khăn trong quá trình thực hiện, kể cả thực hiện kế hoạch M&E, như vậy hỗ trợ và các biện pháp khắc phục phù hợp có thể được thông qua. Quản đốc dự án cũng đảm bảo rằng tất cả cán bộ dự án duy trì một mức độ cao về tính minh bạch, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình trong giám sát và báo cáo kết quả dự án.

257. Văn phòng UNDP sẽ hỗ trợ Quản đốc dự án khi cần thiết, bao gồm thông qua các đoàn giám sát hàng năm. Văn phòng UNDP chịu trách nhiệm tuân thủ với các yêu cầu M&E cấp dự án của UNDP như đề ra [UNDP POPP](#). M&E bổ sung, bảo đảm chất lượng thực hiện và hỗ trợ xử lý sự cố sẽ được Cố vấn kỹ thuật của UNDP cung cấp khi cần. Các nhóm mục tiêu của dự án và các bên liên quan, bao gồm đầu mối quốc gia NDA sẽ tham gia trong M&E cấp dự án đến mức có thể.

258. Một hội thảo khởi động dự án sẽ được tổ chức sau khi Văn kiện dự án được các cơ quan có thẩm quyền ký duyệt. Mục đích của hội thảo khởi động: (a) cùng các bên liên quan rà soát định hướng chiến lược của dự án và thảo luận về bất kỳ thay đổi trong bối cảnh tổng thể ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án; b) thảo luận về vai trò và trách nhiệm của nhóm dự án, bao gồm cả cách thức báo cáo và liên lạc và các cơ chế giải quyết xung đột; c) rà soát lại khung kết quả và thảo luận về vai trò và trách nhiệm báo cáo, giám sát và đánh giá và hoàn thiện kế hoạch M & E; d) rà soát thủ tục báo cáo tài chính và các yêu cầu bắt buộc, và đồng ý về các cách bố trí kiểm toán hàng năm; e) lập kế hoạch và lên lịch trình các cuộc họp Ban QLDA và hoàn thiện kế hoạch công tác năm cho năm đầu tiên. Quản đốc dự án sẽ chuẩn bị báo cáo khởi đầu không muộn hơn một tháng sau hội thảo khởi động. Bản Báo cáo khởi động hoàn chỉnh sẽ được UNDP Việt Nam, và Cố vấn kỹ thuật UNDP khu vực thông qua, sau đó được Ban chỉ đạo dự án phê duyệt.

259. Quản đốc dự án, UNDP Việt nam, và Cố vấn kỹ thuật UNDP khu vực sẽ cung cấp đầu vào mục tiêu cho Báo cáo thực hiện hàng năm. Quản đốc dự án cần đảm bảo các chỉ số trong Khung kết quả của dự án phải được giám sát chặt chẽ hàng năm trước khi đến hạn nộp Báo cáo thực hiện dự án năm (PIR). Quản đốc dự án cũng sẽ báo cáo tiến độ trong phần Mục tiêu phát triển của PIR. Báo cáo PIR hàng năm sẽ được chia sẻ với Ban QLDA và các bên liên quan khác. Văn phòng Quốc gia UNDP sẽ điều phối các đóng góp vào PIR của đầu mỗi NDA và các bên liên quan khác. Xếp hạng chất lượng của PIR năm trước sẽ được sử dụng để chuẩn bị PIR năm tiếp theo. Báo cáo PIR cuối cùng sẽ đi cùng với báo cáo kết thúc dự án và phần đáp ứng của lãnh đạo/ ban quản lý dự án để tạo thành một bộ báo cáo kết thúc dự án hoàn chỉnh

260. Một báo cáo đánh giá giữa kỳ được tiến hành độc lập, các phát hiện và phản hồi nêu trong phản hồi về quản lý sẽ được đưa vào như các khuyến nghị để tăng cường thực hiện trong nửa cuối thời gian của dự án. Các điều khoản tham chiếu, quá trình đánh giá và báo cáo đánh giá giữa kỳ chính thức (MTR) sẽ thực hiện theo các mẫu và hướng dẫn có sẵn tại trung tâm hỗ trợ đánh giá của UNDP (UNDP Evaluation Resource Center) Báo cáo MTR hoàn thiện sẽ được UNDP Việt Nam và Cố vấn kỹ thuật UNDP khu vực thông qua, và được Ban quản lý dự án phê duyệt. Báo cáo MTR có sẵn bằng tiếng Anh

Yêu cầu đánh giá bổ sung của GCF: xem kế hoạch đánh giá

261. Một đánh giá độc lập cuối kỳ (TE) sẽ được tiến hành không chậm hơn ba tháng trước khi kết thúc hoạt động của dự án. Các điều khoản tham chiếu, quá trình đánh giá và báo cáo TE chính thức sẽ thực hiện theo các mẫu chuẩn và hướng dẫn có sẵn trên Trung tâm Hỗ trợ Đánh giá của UNDP. Báo cáo TE chính thức sẽ được Văn phòng UNDP và Cố vấn kỹ thuật khu vực của UNDP thông qua, và sẽ được Ban QLDA phê duyệt. Báo cáo cuối cùng có sẵn bằng tiếng Anh.

262. Văn phòng UNDP sẽ đưa báo cáo đánh giá cuối kỳ dự án theo kế hoạch vào kế hoạch đánh giá của Văn phòng UNDP, và sẽ tải báo cáo đánh giá cuối cùng (TE) bằng tiếng Anh và gửi phản hồi về quản lý minh bạch tới Trung tâm đánh giá của UNDP (ERC) (<http://erc.undp.org>). Sau khi tải lên ERC, Văn phòng đánh giá độc lập của UNDP sẽ tiến hành đánh giá chất lượng và xác nhận các kết quả và xếp hạng trong báo cáo TE, và đánh giá chất lượng của các báo cáo TE.

263. Văn phòng UNDP sẽ giữ lại tất cả hồ sơ giám sát và đánh giá cho dự án này đến bảy năm sau khi đóng cửa tài chính dự án nhằm hỗ trợ công tác hậu đánh giá.

264. Một chi tiết ngân sách giám sát và đánh giá, kế hoạch giám sát và kế hoạch đánh giá sẽ được đưa vào văn kiện dự án của UNDP.

265. UNDP sẽ thực hiện giám sát và báo cáo trong suốt thời gian báo cáo theo quy định của AMA và Hiệp định Hoạt động tài trợ (FAA). UNDP có sự hiện diện trong nước sở tại và năng lực để thực hiện các chức năng như vậy. Trong trường hợp có thêm bất kỳ nghĩa vụ nào hơn và ngoài AMA, UNDP sẽ thảo luận và đồng ý những việc này với Ban Thư ký GCF trong năm cuối cùng của dự án và sẽ chuẩn bị một kế hoạch giám sát sau thực hiện và ngân sách được Hội đồng GCF duyệt khi cần thiết.

255.

☒	Thư không phản đối của cơ quan có thẩm quyền quốc gia Phụ lục I
☒	Nghiên cứu khả thi Phụ lục II
☒	Mô hình tài chính tổng hợp cung cấp phân tích độ nhạy các thành tố quan trọng Phụ lục III
Không có. Vì dự án đề xuất không có nguồn thu, phân tích tài chính theo truyền thống không phù hợp.	
☒	Thư xác nhận hay thư cam kết đồng tài trợ Phụ lục IV
☒	Khẳng định chương trình/dự án/Trang về các điều khoản, điều kiện (kể cả bảng chi tiết chi phí/tiền tài trợ, kế hoạch giải ngân, v.v...) Phụ lục Va
☒	Khẳng định chương trình/dự án/Trang về các điều khoản, điều kiện (kể cả bảng chi tiết chi phí/tiền tài trợ, kế hoạch giải ngân, v.v...) - Xem Phụ lục 1, AMA, Phụ lục Vb
☒	Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) và Kế hoạch quản lý xã hội và môi trường(ESMP) Phụ lục Via và Phụ lục Vlb
☒	Báo cáo thẩm định hay báo cáo điều tra cùng các khuyến nghị Phụ lục VII
☒	Báo cáo đánh giá dự án nền Phụ lục VIII
☒	Bản đồ chỉ rõ vị trí chương trình/dự án Phụ lục IX
☒	Bảng phân bổ thời gian thực hiện dự án/chương trình Phụ lục X
☒	Khẳng định chương trình/dự án Phụ lục XI
Thông tin bổ sung	
☒	Phân tích kinh tế (Tóm tắt) Phụ lục XIIa
☒	Phân tích kinh tế (dạng excel) Phụ lục XII
☒	Trả lời góp ý của GCF về đề xuất Phụ lục XIVb
☒	Các tài liệu hỗ trợ bổ sung Phụ lục XV

* Lưu ý rằng một đề xuất xin tài trợ sẽ chỉ được xem là đầy đủ khi nhận được tất cả các tài liệu hỗ trợ

